



Garantire la corretta programmazione  
e la rigorosa gestione  
delle risorse pubbliche

# PNC

## Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

*Report n. 5: adempimenti e attività al 30 settembre 2022*

2020  
2021  
**2022**  
2023





***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***  
***DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO***

# **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR**

**Report n. 5: adempimenti e attività al 30 settembre 2022**



# INDICE

<b>CAPITOLO 1 - III trimestre 2022 - Il dettaglio .....</b>	<b>1</b>
<b>Allegato 1 .....</b>	<b>5</b>
Programmi e interventi del PNC.....	5
<b>A.4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati.....</b>	<b>5</b>
<b>B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 .....</b>	<b>5</b>
B.1.1 - Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi .....	5
B.1.2 - Rilancio economico e sociale .....	5
<b>C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus .....</b>	<b>6</b>
<b>C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi.....</b>	<b>6</b>
C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito:.....	6
<i>C.2.1.1 - Upgrading nuove navi.....</i>	<i>6</i>
<i>C.2.1.2 - Retrofit Navi .....</i>	<i>6</i>
C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni:.....	6
<i>C.2.2.1 - Acquisto navi.....</i>	<i>7</i>
<i>C.2.2.2 - Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave) .....</i>	<i>7</i>
C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia: .....	8
<i>C.2.3.1 - Microliquefattori (130 mln) .....</i>	<i>8</i>
<i>C.2.3.2 - Navi bunkerine (90 mln).....</i>	<i>8</i>
<b>C.3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali .....</b>	<b>8</b>
<b>C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci:.....</b>	<b>8</b>
C.4.1 - Locomotori, carri e Raccordi ferroviari: .....	8
<i>C.4.1.1 - Locomotori e carri.....</i>	<i>8</i>
<i>C.4.1.2 - Raccordi ferroviari.....</i>	<i>9</i>
C.4.2 - Mezzi intermodali:.....	9
<i>C.4.2.1 - Locotrattori, transtainer, gru .....</i>	<i>9</i>
<b>C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25): .....</b>	<b>10</b>
C.5.1 - Ponti e viadotti.....	10
C.5.2 - Smart Road .....	10
C.5.3 - Traforo del Gran Sasso .....	11
<b>C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale.....</b>	<b>11</b>
<b>C.7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici .....</b>	<b>11</b>
<b>C.8 - Aumento selettivo della capacità portuale .....</b>	<b>11</b>
<b>C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale .....</b>	<b>12</b>
<b>C.10 - Efficientamento energetico .....</b>	<b>12</b>
<b>C.11 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) .....</b>	<b>12</b>

<b>C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne .....</b>	<b>12</b>
<b>C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica .....</b>	<b>13</b>
<b>D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali .....</b>	<b>13</b>
<b>E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima: .....</b>	<b>13</b>
E.1.1 – Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata .....	13
E.1.2 - Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale .....	14
E.1.3 - Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima.....	14
E.1.4 - Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima.....	14
E.1.5 - Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS.....	14
<b>E.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile .....</b>	<b>15</b>
<b>E.3 - Ecosistema innovativo della salute.....</b>	<b>15</b>
<b>F.1 - “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale .....</b>	<b>15</b>
<b>F.3 - Accordi per l'Innovazione .....</b>	<b>16</b>
<b>G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori</b>	<b>17</b>
G.1.1 - Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni “modello” per detenuti adulti .....	17
G.1.2 - Adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni .....	17
<b>H.1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.....</b>	<b>17</b>
<b>I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale..</b>	<b>18</b>

## CAPITOLO 1 - III trimestre 2022 - Il dettaglio

Il presente report riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi e degli adempimenti relativi al terzo trimestre dell'anno 2022 per l'attuazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC) di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, come individuati nell'Allegato 1 al decreto MEF del 15 luglio 2021.

Con l'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° agosto 2022, relativo agli interventi c.d. cofinanziati, il quadro normativo di disciplina degli interventi del Piano può ritenersi completato.


Con tale provvedimento, alla luce del sopravvenuto quadro macroeconomico nazionale e internazionale, è stata peraltro prevista la possibilità **di raggiungere gli obiettivi e gli adempimenti indicati nell'allegato 1 al DM MEF del 15 luglio 2021 per ciascuno dei primi tre trimestri del 2022 entro il rispettivo trimestre successivo**, fermo restando il rispetto di tutti gli adempimenti dell'anno 2022 da realizzare entro e non oltre il 31 dicembre 2022.

Il presente report, pertanto, nell'illustrazione dello stato di avanzamento degli obiettivi tiene conto di tale previsione.

Come per i precedenti report, l'aggiornamento è stato predisposto sulla base dei dati ricavabili dai sistemi di monitoraggio RGS (BDAP-MOP) e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni titolari degli investimenti.

Alla scadenza del 30 settembre 2022 (T3 2022), il DM MEF 15 luglio 2021 prevede 19 obiettivi ripartiti tra le diverse Amministrazioni come rappresentato nella figura 1.


Figura 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021.

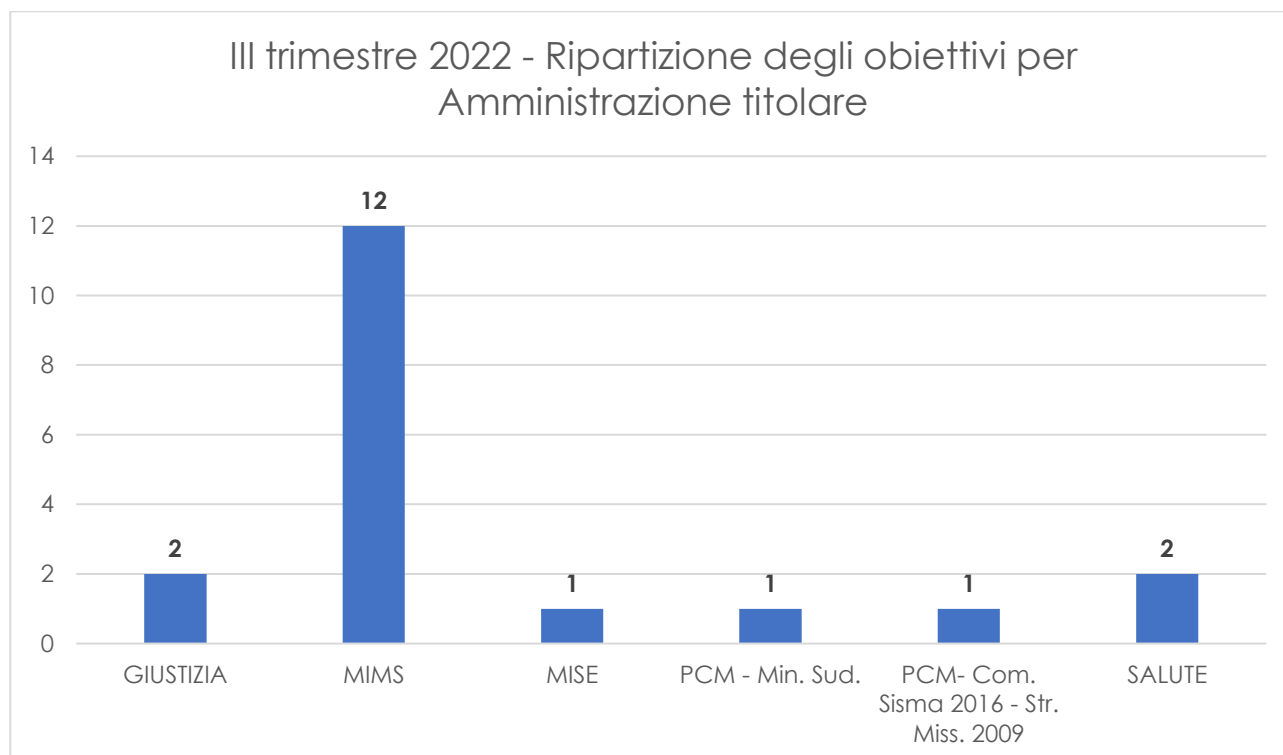

Gli obiettivi relativi al presente trimestre risultano sostanzialmente tutti posticipati ad eccezione di 3 comunque conseguiti.

Di seguito una rappresentazione grafica dello stato di realizzazione degli obiettivi del trimestre.

Figura 2. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021 e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

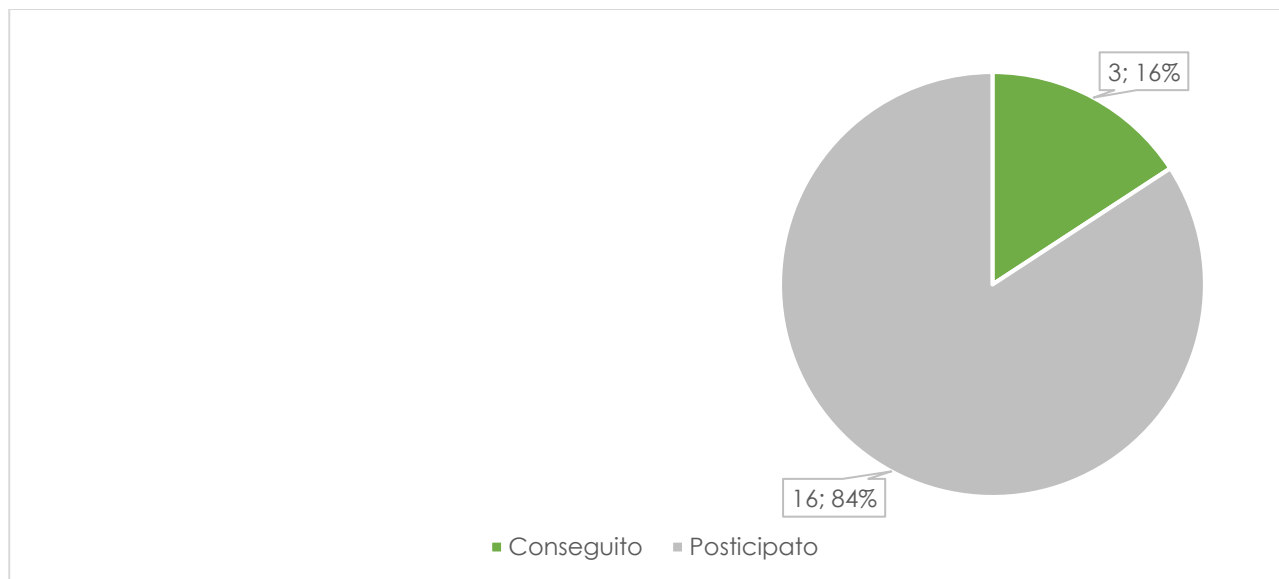


La tabella seguente illustra l'avanzamento complessivo dei programmi del Piano dando evidenza dei ritardi sugli obiettivi dei trimestri precedenti che non risultano ancora recuperati nonostante lo slittamento di un trimestre riconosciuto.

Per le motivazioni si rinvia all'allegato 1 che contiene, con separata evidenza dello stato di tutti gli adempimenti previsti, il quadro di dettaglio per il III trimestre 2022.



Tabella 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021 e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni, come riportate nei report precedenti.

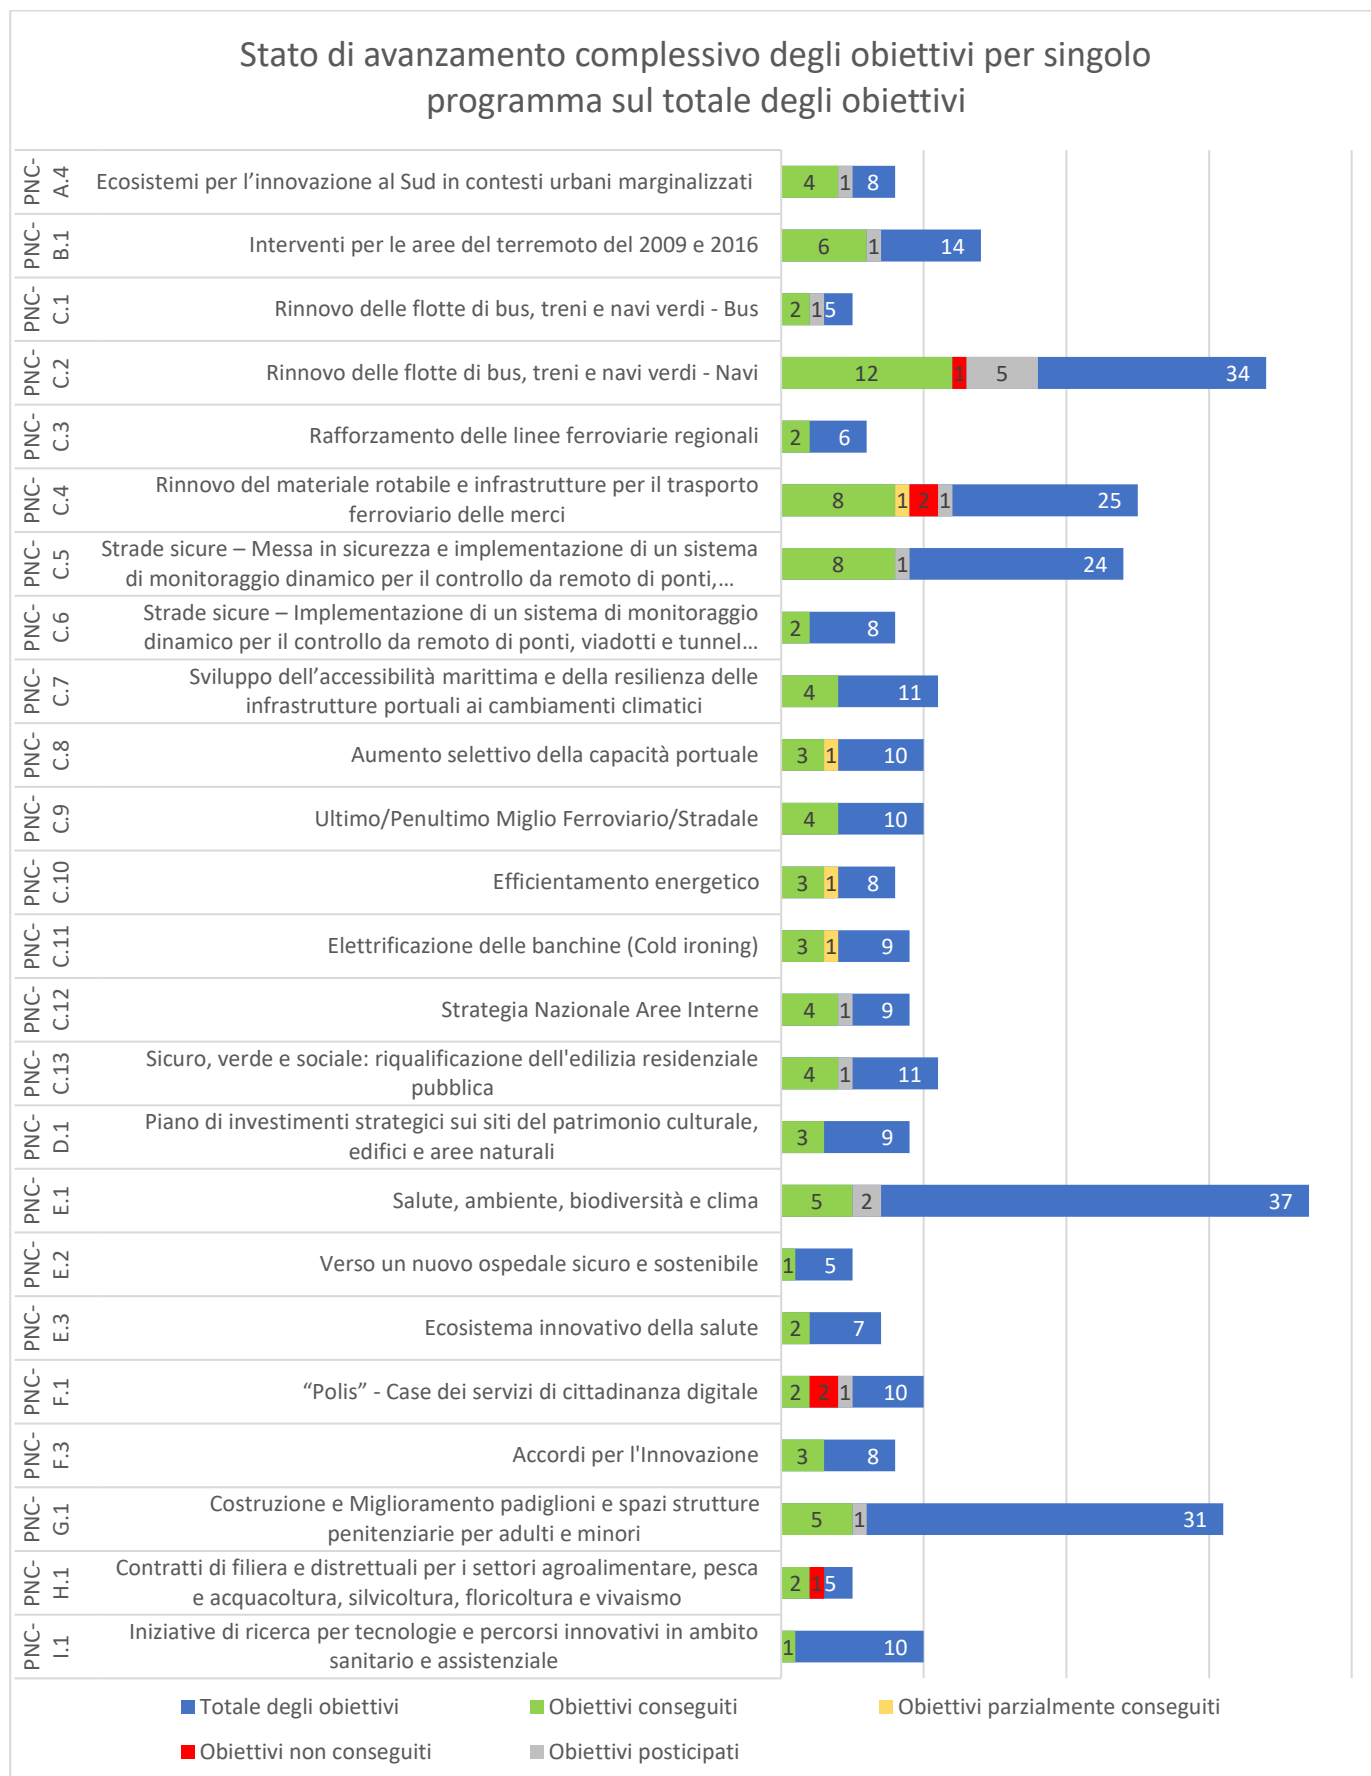



## Allegato 1

### Programmi e interventi del PNC

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al III trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 settembre 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
A.4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati	PCM: Min. Sud	350,00	Pubblicazione di tutti i bandi di gara e aggiudicazione per almeno 2 HUB	<b>Posticipato.</b> 27 interventi sono individuati da CUP, di cui 10 con bandi di gara pubblicati e 4 con gare già aggiudicate.	IV/2022 Avvio dei lavori in almeno 2 HUB – aggiudicazione per tutti gli HUB
B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016					
B.1.1 - Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi	PCM: Commissario sisma 2016 Dip. "Casa Italia" Struttura di missione sisma 2009.	1.080,00	Pubblicazione, da parte delle stazioni appaltanti, dei bandi di gara	<b>Posticipato.</b> Su 830 interventi, risultano pubblicati bandi di gara per 738 interventi.	IV/2022 aggiudicazione e avvio dei lavori
B.1.2 - Rilancio economico e sociale		700,00	Nessun adempimento		IV/2022 Approvazione da parte dei soggetti attuatori delle istanze presentate e concessione dei

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al III trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 settembre 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
					finanziamenti
<b>C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus</b>	MIMS	600,00	Sottoscrizione dei contratti	<b>Posticipato.</b>	IV/2024 50% di autobus acquistati
<b>C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi</b>					
C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito:					
<i>C.2.1.1 - Upgrading nuove navi</i>  <i>C.2.1.2 - Retrofit Navi</i>	MIMS	500,00	Individuazione beneficiari e accordi procedurali con beneficiari.	<b>Posticipato.</b> Il 21 settembre 2022 è stato pubblicato il DM n. 290 che indica le modalità di presentazione delle domande per il riconoscimento del contributo e le condizioni di erogazione dello stesso la cui scadenza è fissata il 21 novembre 2022. Si prevede di concludere la procedura entro il 31.12.2022 in modo da rispettare gli obiettivi previsti per il 2022	II/2023 Sottoscrizione contratti
C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni:					

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al III trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 settembre 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
<i>C.2.2.1 - Acquisto navi</i>	MIMS	60,00	<p>Avvio dei lavori di progettazione</p> <p>Obiettivo del II/2022 in ritardo:</p> <p>Aggiudicazione gara per acquisto delle 3 nuove unità navali veloci</p>	<p><b>Posticipato.</b></p> <p>Il ritardo nel conseguimento non dipende dall'Amministrazione né dal soggetto attuatore in quanto la precedente gara, pubblicata nel rispetto dei tempi previsti, è andata deserta.</p> <p>A seguito della pubblicazione da parte di RFI del nuovo bando sulla GUUE il 21.06.2022 per l'acquisto di due navi con opzione sulla terza, l'originaria scadenza di quest'ultimo, prevista per il 30 settembre 2022, è stata prorogata al 31 ottobre 2022 per garantire una maggiore partecipazione e la presentazione di proposte tecnicamente fattibili. Si prevede l'allineamento all'obiettivo nel quarto trimestre 2022.</p>	<p>II/2023</p> <p>Consegna progettazione per le 3 nuove unità navali veloci</p>
<i>C.2.2.2 - Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave)</i>	MIMS	20,00	Nessun adempimento		<p>IV/2024</p> <p>Ibridizzazione nave traghetto Messina in esercizio</p>

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al III trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 settembre 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia:					
<i>C.2.3.1 - Microliquefattori (130 mln)</i> <i>C.2.3.2 - Navi bunkerine (90 mln)</i>	MIMS	220,00	Individuazione beneficiari e accordi procedurali con beneficiari.	<b>Posticipato.</b> Il bando per le richieste di finanziamento è stato adottato con DM 27.06.22, n. 121. È in corso la valutazione delle domande pervenute entro il 10 settembre. Si prevede l'allineamento all'obiettivo nel quarto trimestre 2022.	I/2023 Avvio dei lavori
<b>C.3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali</b>	MIMS	1.550,00	Nessun adempimento		IV/2022 Stipula contratti per il 38% dei lavori. Avvio del 38% dei lavori. Pubblicazione bando del 100% dei lavori
<b>C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci:</b>					
C.4.1 - Locomotori, carri e Raccordi ferroviari:					
<i>C.4.1.1 - Locomotori e carri</i>	MIMS	115,00	DM Assegnazione delle risorse per l'acquisto dei mezzi ai beneficiari	<b>Posticipato.</b> L'amministrazione è in attesa dell'autorizzazione	IV/2022 Avvio procedure di acquisto mezzi da parte

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al III trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 settembre 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			<p>Obiettivo del I/2022 in ritardo: Avvio della procedura di concessione dei contributi</p> <p>Obiettivo del II/2022 in ritardo: Individuazione beneficiari locomotori e carri</p>	<p>UE in materia di aiuti di Stato (n. SA.64726 - DI MIMS MEF n. 395 del 13.10.2021).</p> <p>La Commissione europea ha richiesto l'adozione di un nuovo decreto che accorpi la misura in esame con altra misura analoga riguardante la rottamazione carri. Si prevede l'allineamento all'obiettivo nel quarto trimestre 2022.</p>	dei beneficiari
<i>C.4.1.2 - Raccordi ferroviari</i>	MIMS	30,00	<p>Nessun adempimento</p> <p>Obiettivo del II/2022 in ritardo: Trasferimento risorse a RFI per elettrificare i raccordi intermodali</p>	L'amministrazione, ancora in attesa dell'autorizzazione UE in materia di aiuti di Stato, prevede l'allineamento al cronoprogramma entro il 31.12.2022	<p>III/2023</p> <p>Conclusione primo step di lavori di elettrificazione raccordi alla rete RFI come individuato nel relativo contratto di programma</p>
C.4.2 - Mezzi intermodali:					
<i>C.4.2.1 - Locotrattori, transtainer, gru</i>	MIMS	55,00	DM Assegnazione delle risorse per l'acquisto dei mezzi ai beneficiari	<p><b>Conseguito.</b></p> <p>È stato emanato il decreto ministeriale 30 settembre 2022, n. 312 con cui sono stati individuati i beneficiari e assegnate le risorse.</p>	<p>IV/2022</p> <p>Avvio procedure di acquisto locotrattori, transtainer e gru da parte dei beneficiari</p>

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al III trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 settembre 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25):					
C.5.1 - Ponti e viadotti	MIMS	770,00 di cui: - 130,00 per monitoraggio dinamico; - 640,00 per interventi di adeguamento di ponti e viadotti	Redazione del progetto Interventi adeguamento 16 ponti e viadotti  Avvio lavori di installazione dispositivi di monitoraggio	<b>Posticipato.</b>  Sono in fase di installazione i dispositivi di monitoraggio sui ponti e viadotti.  Relativamente agli interventi strutturali il Commissario ha confermato l'allineamento delle attività in corso con il raggiungimento degli obiettivi previsti entro il 31.12.2022 e in particolare ha confermato la predisposizione del progetto per gli interventi di adeguamento strutturale di 16 viadotti.	IV/2022  20 ponti e viadotti monitorati
C.5.2 - Smart Road	MIMS	130,00	Avvio dei lavori di installazione dispositivi per smart road	<b>Conseguito.</b>  Sono in fase di installazione i dispositivi di monitoraggio del sistema di smart road.	IV/2024  Attivazione dispositivi Smart road sulle prime tratte



Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al III trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 settembre 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.5.3 - Traforo del Gran Sasso	MIMS	100,00	Nessun adempimento		IV/2022  Pubblicazione del bando di gara per l'esecuzione dei lavori di adeguamento ed efficientamento
C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale	MIMS	450,00	Nessun adempimento		IV/2022  Avvio procedura di affidamento dei lavori
C.7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	MIMS	1.470,00	Nessun adempimento		IV/2022  Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e  Avvio del 30% dei lavori
C.8 - Aumento selettivo della capacità portuale	MIMS	390,00	Nessun adempimento  Obiettivo del II/2022 in ritardo: Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori	Con riferimento all'obiettivo del II trimestre 2022 risultano pubblicati bandi per importo pari al 16% del totale. Si rinvia al focus contenuto nel box al capitolo 1 del report n. 4.	IV/2022  Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e  Avvio del 30% dei lavori

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al III trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 settembre 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
<b>C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale</b>	MIMS	250,00	Nessun adempimento Obiettivo del II/2022 in ritardo: Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori	Il ritardo sul trimestre precedente è stato recuperato in quanto risultano pubblicati bandi per importo pari al 50% del totale.	IV/2022 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori
<b>C.10 - Efficientamento energetico</b>	MIMS	50,00	Nessun adempimento Obiettivo del II/2022 in ritardo: Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori	Con riferimento all'obiettivo del II trimestre 2022 risultano pubblicati bandi per importo pari allo 0,2% del totale. Si rinvia al focus contenuto nel box al capitolo 1 del report n. 4.	I/2023 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori
<b>C.11 - Elettificazione delle banchine (Cold ironing)</b>	MIMS	700,00	Nessun adempimento Obiettivo del II/2022 in ritardo: Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 30% delle opere /esecuzione dei lavori	Con riferimento all'obiettivo del II trimestre 2022 risultano pubblicati bandi per importo pari al 4% del totale. Si rinvia al focus contenuto nel box al capitolo 1 del report n. 4.	IV/2022 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori
<b>C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne</b>	MIMS	300,00	Predisposizione dei progetti da parte dei S.A.	<b>Posticipato.</b> Dei 72 interventi, per 63 risultano approvati i progetti da porre a base di	IV/2022 Pubblicazione dei bandi di gara per la realizzazione

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al III trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 settembre 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				gara. Per i restanti 9, si prevede l'allineamento del cronoprogramma entro il 31.12.2022.	degli interventi
<b>C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica</b>	MIMS	2.000,00	Approvazione della progettazione finale ed esecutiva da parte delle stazioni appaltanti	<b>Posticipato.</b> Le stazioni appaltanti stanno procedendo all'approvazione della progettazione finale ed esecutiva.	IV/2022 Pubblicazione da parte delle stazioni appaltanti dei bandi di gara per la realizzazione dell'opera/esecuzione dei lavori
<b>D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali</b>	MIC	1.455,24	Nessun adempimento		IV/2022 Aggiudicazione delle gare per interventi corrispondenti al 30% delle risorse
<b>E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima:</b>					
<b>E.1.1 – Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata</b>	SALUTE	415,38	Avvio interventi per il 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPA)	<b>Posticipato.</b>	I/2023 Pubblicazione bando, aggiudicazione (entro 3 mesi successivi) e avvio interventi (entro 3 mesi successivi): per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali.

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al III trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 settembre 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
E.1.2 - Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale	SALUTE	49,50	Nessun adempimento		IV/2022 Provvedimenti per l'identificazione dei siti contaminati e definizione del piano di interventi integrati di promozione della salute, sorveglianza attiva e assistenza sanitaria e sistemi di comunicazione partecipativa delle comunità.
E.1.3 - Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima	SALUTE	6,12	Nessun adempimento		IV/2023 Fase esecutiva - Acquisizione e rinnovamento infrastrutturale, di strumentazioni gestionali, piattaforme informatiche e sistemi qualità presso il centro di formazione Salute, Ambiente e Clima presso l'ISS
E.1.4 - Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima	SALUTE	21,00	Aggiudicazione	Posticipato.	IV/2022 Avvio interventi
E.1.5 - Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS	SALUTE	8,00	Nessun adempimento		II/2023 Provvedimento di adozione Piano di

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al III trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 settembre 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
					Digitalizzazione della rete SNPS e SNPA
E.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile	SALUTE	1.450,00	Nessun adempimento		I/2023 Pubblicazione di gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn
E.3 - Ecosistema innovativo della salute	SALUTE	437,40	Nessun adempimento		IV/2022 Aggiudicazione e stipula atti formali con i soggetti attuatori ed impegno/erogazione 1° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 20% dei fondi totali disponibili
F.1 - "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	MISE	800,00	Realizzazione interventi pilota  Obiettivo del IV/2021 in ritardo: autorizzazione UE. Obiettivo del I/2022 in ritardo: Pubblicazione dei bandi di gara Obiettivo del II/2022 in ritardo: Aggiudicazione gare d'appalto	<b>Posticipato.</b> Su 18 gare per le quali sono stati già pubblicati i bandi (per un ammontare di risorse pari a 459,22 milioni di euro), 13 sono ancora in corso, 2 con contratto perfezionato sono relative all'affidamento del design degli interventi e le altre 3 che hanno raggiunto la fase di aggiudicazione	IV/2022 Avvio sviluppo piattaforma multicanale per erogazione servizi PA; Avvio lavori di trasformazione Uffici Postali (UP) per implementazione HUB PA; Avvio lavori per realizzazione spazi di coworking ed attività educative

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al III trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 settembre 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				<p>sono relative ai servizi di PMO tecnico e di ingegneria. Pertanto, allo stato, nessun intervento risulta realizzato.</p> <p>In merito ai ritardi precedenti risulta:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- recuperato il ritardo sul trimestre IV/2021 in quanto la Commissione europea ha autorizzato nel mese di ottobre 2022 tutti gli interventi previsti;</li> <li>- non recuperato il ritardo sul trimestre I/2022 essendo stati pubblicati bandi di gara per circa 460 milioni di euro a fronte di uno stanziamento complessivo di 800 milioni;</li> <li>- non recuperato il ritardo sul trimestre II/2022 in quanto risultano aggiudicate solo 5 gare.</li> </ul>	
F.3 - Accordi per l'Innovazione	MISE	1.000,00	Nessun adempimento		IV/2022 Emanazione decreti di concessione delle

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al III trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 settembre 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
					agevolazioni per ammontare pari ad almeno il 30% delle risorse stanziato per la misura.
<b>G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori</b>					
G.1.1 - Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni "modello" per detenuti adulti	GIUSTIZIA	84,00	100% aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura	<b>Conseguito.</b> Aggiudicati tutti i servizi di ingegneria/architettura.	IV/2022 50% approvazione del livello di progettazione da porre a base di gara
G.1.2 - Adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni	GIUSTIZIA	48,90	100% aggiudicazione definitiva dei servizi di ingegneria/architettura	<b>Posticipato.</b> Aggiudicati i servizi di ingegneria/architettura per tre interventi su quattro. Per l'intervento di Roma-Casal del Marmo è stata pubblicata la gara per appalto integrato.	IV/2022 75% approvazione del livello di progettazione da porre a base di gara
<b>H.1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo</b>	MIPAAF	1.203,30	Nessun adempimento  Obiettivo del I/2022 in ritardo: Pubblicazione bandi altri settori	In merito ai ritardi sui trimestri precedenti non risulta ancora recuperato il ritardo sul I/2022 per i contratti di distretto settore per il settore	I/2023 Approvazione delle graduatorie finali per la concessione degli aiuti finanziari settore

Codice univoco e Programma/investimento/ intervento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti al III trimestre 2022	Stato obiettivo al 30 settembre 2022	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				forestale (10 mln) non essendo stato ancora pubblicato il relativo bando.	agroalimentare
I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	MUR	500,00	Nessun adempimento		IV/2022  Decreto di ammissione al finanziamento dei progetti selezionati e avvio dei progetti per la prima finestra del primo bando





