



Garantire la corretta programmazione
e la rigorosa gestione
delle risorse pubbliche

PNC

Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Report n. 9: adempimenti e attività al 30 settembre 2023

2021
2022
2023
2024



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Report n. 9: adempimenti e attività al 30 settembre 2023

INDICE

CAPITOLO 1 - QUADRO INTRODUTTIVO	1
CAPITOLO 2 - I DATI DI MONITORAGGIO	3
CAPITOLO 3 - DETTAGLIO SULLO STATO DEGLI OBIETTIVI DEL III TRIMESTRE 2023	5
CAPITOLO 4 - RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE RISORSE AGGIORNATA AL 30 GIUGNO 2023	7
CAPITOLO 5 - IL FONDO OPERE INDIFFERIBILI PER IL PNC	9
CAPITOLO 6 - I PROGRAMMI COFINANZIATI PNRR-PNC	11
ALLEGATO 1	13
PROGRAMMI E INTERVENTI DEL PNC	13
A.4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati	13
B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016	13
B.1.1 - Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi	14
B.1.2 - Rilancio economico e sociale	15
C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus.....	15
C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi.....	15
C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito:.....	15
C.2.1.1 - Upgrading nuove navi	16
C.2.1.2 - Retrofit Navi	16
C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni:.....	16
C.2.2.1 - Acquisto navi.....	16
C.2.2.2 - Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave). 16	
C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia:.....	16
C.2.3.1 - Microliquefattori (130 mln)	17
C.2.3.2 - Navi bunkerine (90 mln)	17
C.3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali.....	17
C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci	17
C.4.1 - Locomotori, carri e raccordi ferroviari	17
C.4.1.1 - Locomotori e carri	18
C.4.1.2 - Raccordi ferroviari	18
C.4.2 - Mezzi intermodali.....	18
C.4.2.1 - Locotrattori, transtainer, gru	19
C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)	19
C.5.1 - Ponti e viadotti	19
C.5.2 - Smart Road	20
C.5.3 - Traforo del Gran Sasso	20
C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale.....	21
C.7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	22
C.8 - Aumento selettivo della capacità portuale.....	22
C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale.....	23
C.10 - Efficientamento energetico	23
C.11 - Elettificazione delle banchine (Cold ironing).....	24
C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne	25
C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica	26
D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	26
E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima.....	26

E.1.1 – Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata	27
E.1.2 - Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale	28
E.1.3 - Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima	29
E.1.4 - Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima	29
E.1.5 - Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS	30
E.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile.....	30
E.3 - Ecosistema innovativo della salute.....	31
F.1 - “Polis” - Case dei servizi di cittadinanza digitale.....	32
F.3 - Accordi per l’Innovazione	32
G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori	32
G.1.1 - Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni “modello” per detenuti adulti.....	33
G.1.2 - Adeguamento strutturale, aumento dell’efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni	34
H.1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	35
I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	35
ALLEGATO 2	37
PROGRAMMI E INTERVENTI COFINANZIATI	37
A.1 - Servizi digitali e cittadinanza digitale.....	37
A.2 - Servizi digitali e competenze digitali	38
A.3 - Tecnologie spaziali ed economia satellitare	38
A.3.1 - Satcom.....	38
A.3.2 - Osservazione della Terra	39
A.3.3 - Space Factory	39
A.3.4 - In-Orbit Economy	39
F.2 – Transizione 4.0	39
L.1 – Piani urbani integrati.....	39
M.1 - Ecobonus e sismabonus fino al 110% per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.....	40

CAPITOLO 1 - Quadro introduttivo

I 30 programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, sono destinatari di risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, e sono ripartiti in 24 programmi "del Piano" (c.d. esclusivi), per un importo di 19.368,85 milioni di euro e 6 programmi PNRR-PNC (c.d. cofinanziati), per un importo di 11.253,61 milioni di euro.

Gli obiettivi e la disciplina attuativa dei programmi del PNC sono contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 (Programmi del Piano) e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° agosto 2022 (Programmi cofinanziati).

Nel primo report dell'anno corrente era stato evidenziato un incremento dei ritardi nel conseguimento degli obiettivi, le cui ragioni, come più volte rappresentato, erano da ascrivere ad alcuni fattori, tra cui la crisi economica e l'incremento dei prezzi, oltre a procedure amministrative in alcuni casi poco coerenti con le tempistiche.

Sul punto, come noto, l'articolo 7, comma 1, del D.L. 13 del 2023 aveva previsto un aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del DM MEF 15 luglio 2021, da attuare con decreto MEF di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR "ferma restando la necessità che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.[...]".

La rimodulazione dei cronoprogrammi era volta a consentire alle Amministrazioni titolari dei programmi del PNC, alla luce del contesto di crisi internazionale che ha determinato criticità nello svolgimento delle procedure di affidamento anche a causa degli incrementi dei prezzi dei materiali, di portare a compiuta realizzazione quanto programmato, mediante l'adeguamento delle scadenze esclusivamente intermedie (senza incidere sui target finali) degli obiettivi, mantenendo fermo il rispetto degli impegni assunti con la Commissione europea nell'ambito del PNRR collegati all'attuazione del PNC, così come previsto dall'articolo 7 del d.l. 13 del 2023.

La realizzazione del PNC, infatti, con il completamento degli interventi in esso inclusi, costituisce un obiettivo del PNRR in quanto si dovrà dimostrare, tra l'altro, entro il secondo trimestre 2025, la migliorata capacità di spesa delle risorse in conto capitale e un significativo assorbimento delle risorse del PNC (milestone M1C1-62).

Sullo schema di decreto predisposto a seguito del confronto con le Amministrazioni titolari, alla data di aggiornamento del presente report non è intervenuto il prescritto concerto Autorità politica delegata in materia di PNRR e, pertanto, non è stato possibile adottare un cronoprogramma aggiornato.

In conclusione, gli obiettivi di riferimento per il monitoraggio sull'avanzamento dei Programmi "del Piano" rimangono quelli individuati nell'Allegato 1 al decreto MEF del 15 luglio 2021.

Il presente report riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi e degli adempimenti al terzo trimestre 2023 per i programmi “del Piano”; per i programmi che non presentano obiettivi per tale trimestre, il report fornisce lo stato di avanzamento del programma in relazione all’obiettivo immediatamente precedente.

I dati confermano la tendenza registrata nei trimestri precedenti con un aumento dei ritardi nel rispetto delle scadenze.

Con riferimento invece ai programmi c.d. “cofinanziati”, si riporta al capitolo 6 il quadro complessivo e nell’allegato 2 lo stato di avanzamento redatto sulla base dei dati presenti in REGIS e delle rendicontazioni fornite dalle Amministrazioni.

CAPITOLO 2 - I dati di monitoraggio

I 24 programmi “del Piano”, di cui al DM MEF 15 luglio 2021, ammontano complessivamente a 19.368,85 milioni di euro.


Al 30 giugno 2023, risultavano censiti nel sistema di monitoraggio 4.008 interventi (con un incremento rispetto al trimestre precedente di circa l'8%) con associato un finanziamento complessivo a carico del PNC di circa 16,25 miliardi (aumento pari al 5% rispetto al trimestre precedente).

A settembre 2023 risultano censiti a sistema 4450 interventi identificati da codice unico di progetto (CUP) con associato un finanziamento di circa 16,27 miliardi di euro, raggiungendo dunque una copertura di monitoraggio del finanziamento dei programmi del PNC di circa l'89%.

L'amministrazione cui è riconducibile il maggior numero di interventi risulta il MIT, con oltre duemila CUP dislocati sull'intero territorio nazionale, seguita dal Commissario straordinario per il sisma 2016 e dal Ministero della Salute.

Figura 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021.

Progetti individuati da CUP per Amministrazione titolare

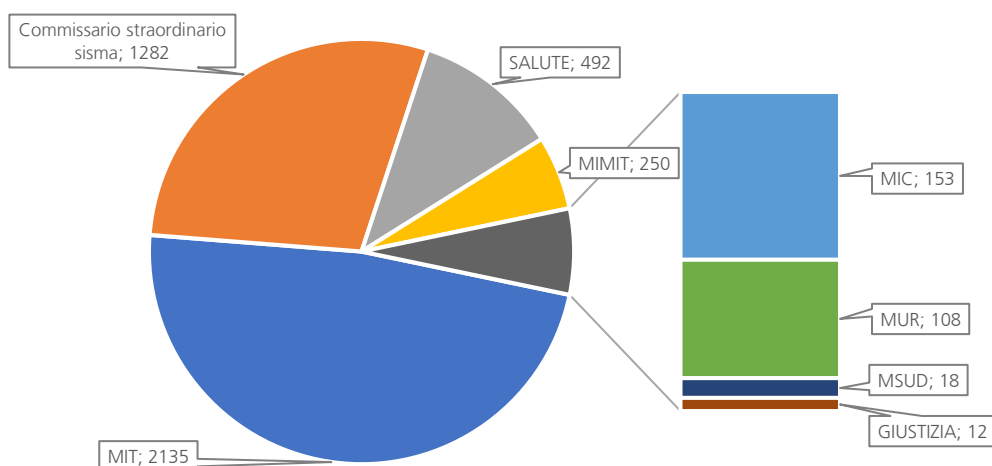

Come già rappresentato in precedenza, continua a persistere, tuttavia, un basso livello di alimentazione dei dati presenti nel sistema di monitoraggio, dovuto al non corretto adempimento da parte dei soggetti attuatori titolari dei CUP dell'obbligo di alimentazione dei sistemi, nonostante i solleciti inviati da alcune Amministrazioni titolari per i programmi di rispettiva competenza.


Al fine di migliorare la qualità dei dati disponibili si sta proseguendo nel confronto con le singole Amministrazioni sulle risultanze del sistema informativo, anche attraverso un'analisi incrociata dei dati e la richiesta di supporti documentali.

L'aggiornamento del presente report, conseguentemente e come per il precedente, è stato predisposto sulla base dei dati comunicati dalle Amministrazioni, seppur deve segnalarsi che per tre programmi (C.3- Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali, C.5- Strade sicure A24-A25, C.6 Strade sicure rete viaria principale) il MIT non ha fornito riscontro alle richieste di elementi informativi, per cui i dati rappresentati sono stati elaborati esclusivamente sulla base di quanto ricavabile dai sistemi di monitoraggio RGS (BDAP-MOP).

CAPITOLO 3 - Dettaglio sullo stato degli obiettivi del III trimestre 2023

Alla scadenza del 30 settembre 2023 (T3 2023), il DM MEF 15 luglio 2021 prevede 10 obiettivi ripartiti tra le diverse Amministrazioni come rappresentato nella figura 2.

Figura 2. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021.




In via generale si conferma, rispetto alla situazione registrata nei trimestri precedenti, la tendenza all'incremento dei ritardi nel rispetto delle scadenze. Al netto di un obiettivo i cui termini sono stati sospesi ex art. 1, comma 8, del D.L. 59 del 2021, il 45% degli obiettivi del III trimestre 2023, infatti, risulta non conseguito.

Figura 3. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

Stato di attuazione degli obiettivi relativi al III trimestre 2023 (in valore e in percentuale)

- Conseguito
- Non conseguito
- Parzialmente conseguito

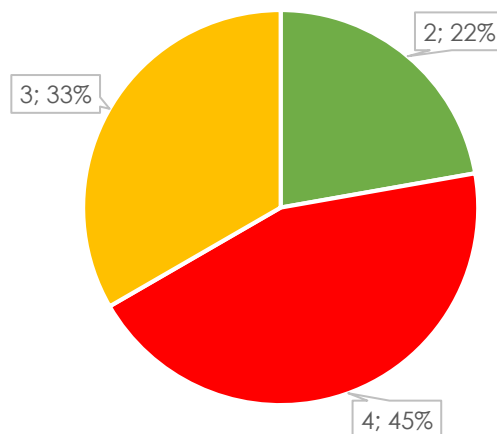


Come indicato in premessa, l'allegato 1 indica lo stato **complessivo** di avanzamento al III trimestre 2023 del Piano in relazione agli obiettivi monitorati (39 complessivi). Si riporta di seguito la relativa rappresentazione grafica

Figura 4. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni

Stato di attuazione dei 39 obiettivi monitorati al III trimestre 2023 (in valore e in percentuale)

- Conseguito
- Non conseguito
- Parzialmente conseguito
- Posticipato

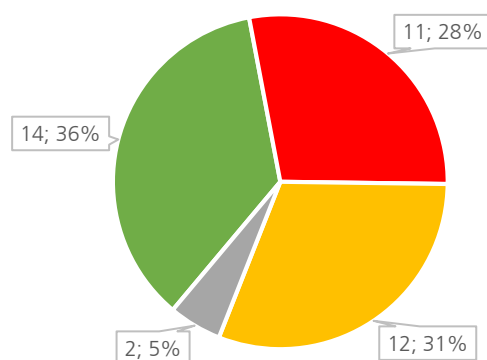

CAPITOLO 4 - Ripartizione territoriale delle risorse aggiornata al 30 giugno 2023

Si riporta di seguito un aggiornamento della distribuzione regionale delle risorse relative ai programmi del PNC (DM MEF del 15.07. 2021, circa 19,37 miliardi di euro) sulla base dei dati presenti nel sistema di monitoraggio.

Figura 5. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni



Con tecnologia Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Risultano assegnate a specifici progetti identificati da CUP risorse per circa 16,36 miliardi di euro (inclusi gli interventi localizzati su più Regioni), al netto di circa 3,01 miliardi di euro il cui iter di ripartizione non è ancora concluso o che per loro destinazione non sono ex ante territorialmente ripartibili.


Tabella 1. Ripartizione regionale delle risorse

Regioni	Importo (in mln di euro)
ABRUZZO	1.347,82
BASILICATA	135,77
CALABRIA	586,39
CAMPANIA	1.790,79
EMILIA-ROMAGNA	607,25
FRIULI-VENEZIA GIULIA	577,81
LAZIO	1.489,09
LIGURIA	851,93
LOMBARDIA	882,52
MARCHE	572,38
MOLISE	94,36
PIEMONTE	441,51
PUGLIA	905,42
SARDEGNA	538,54
SICILIA	1.147,07
TOSCANA	802,59
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	81,87
UMBRIA	194,46
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE	22,09
VENETO	682,92
Totale risorse ripartite tra le Regioni	13.752,59
% risorse ripartite localizzate al SUD	47,6%
Interventi localizzati su più Regioni	2.603,41
Altri interventi allo stato non localizzabili	3.012,84
Totale DM MEF 15 luglio 2021	19.368,85

Figura 6. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

**Risorse per territorio
(dati percentuali)**

Le percentuali sono calcolate al netto degli interventi localizzati su più regioni e degli interventi da ripartire/non ripartibili. Il totale complessivo è pari a 13.752,59 milioni di euro.

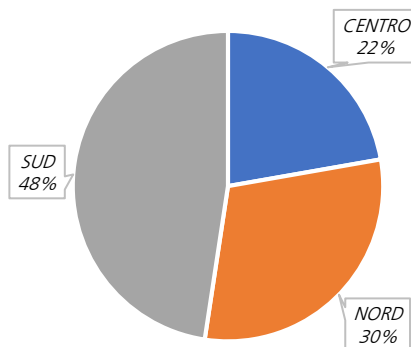

CAPITOLO 5 - Il Fondo opere indifferibili per il PNC

Come segnalato nei precedenti report, per fronteggiare gli incrementi dei costi dei materiali da costruzione l'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 50 del 2022 ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, successivamente rifinanziato anche dalla legge di bilancio per il 2023.

Le risorse sono state assegnate, nel corso del 2022 e del 2023, con specifici provvedimenti del Ragioniere Generale dello Stato, che si riportano di seguito:

- Decreto n. 52 del 2.3.2023 - Assegnazione definitiva interventi PNC FOI 2022;
- Decreto del 28.3.2023 (ID 25491) - Procedura di Recupero 2022;
- Decreto n. 124 del 13.3.2023 - Procedura Semplificata I sem. 2023;
- Decreto n. 183 del 13.3.2023 - Assegnazione definitiva Procedura Semplificata I sem. 2023;
- Decreto n. 154 del 19.5.2023 - Procedura Ordinaria I sem. 2023;
- Decreto n. 185 del 8.8.2023 - Assegnazione definitiva Procedura Ordinaria I sem. 2023;
- Decreto n. 175 del 11.7.2023 - Procedura Semplificata II sem. 2023.
- Decreto n. 187 del 11.08.2023 come modificato dal Decreto R.G.S. 195 del 6.10.2023 - Procedura Ordinaria II sem. 2023 e Assegnazione definitiva per procedura di riallineamento.¹

Tabella 2. Dati in milioni di euro. Elaborazione RGS-IGAE dei dati di cui ai decreti RGS adottati.

Legenda: ORD= Procedura ordinaria; REC= Procedura di recupero; SEMPL= Procedura semplificata; PROC RIALLINEAM= Procedura di riallineamento

Programma PNC	FOI 2022			FOI I sem. 2023		FOI II sem. 2023		PROC. RIALLINEAM.	TOTALE COMPLESSIVO
	ORD.	REC.	SEMP.	ORD.	SEMP.	ORD.	SEMP.		
PNC-B.1	93,53	11,40	48,32	151,30	-	236,46	-	-	541,00
PNC-C.3	7,93	-	-	-	-	-	-	-	7,93
PNC-C.7	59,35	-	-	25,30	-	-	-	13,71	98,35
PNC-C.8	-	-	-	-	-	97,67	-	9,63	107,29
PNC-C.9	4,14	-	-	11,79	-	-	-	-	15,92
PNC-C.11	2,42	-	-	1,55	-	1,10	-	-	5,07
PNC-C.12	-	-	4,75	-	-	1,88	1,71	-	8,34
PNC-C.13	108,94	16,68	41,53	1,10	1,89	0,57	1,12	2,97	174,80
PNC-D.1	-	-	86,74	-	-	-	-	-	86,74
PNC-E.1	0,44	-	-	-	-	-	-	-	0,44
PNC-E.2	75,23	-	-	-	-	25,41	-	41,48	142,11
PNC-G.1	11,84	-	-	7,62	-	2,03	-	-	21,49
Totale	363,81	28,08	181,34	198,65	1,89	365,11	2,83	67,78	1.209,49


In relazione ai programmi "cofinanziati", si aggiunge che a valere sul FOI per il programma "Piani urbani integrati" sono state assegnate complessivamente risorse per circa 211,55 milioni di euro.

¹ Le risorse del I semestre 2023 e quelle della procedura di riallineamento sono state definitivamente assegnate. Le risorse del II semestre 2023 sono invece da confermare in esito alla verifica dell'avvenuto avvio delle procedure di riferimento. Sono in corso di predisposizione ulteriori decreti, sia ai sensi dell'art. 7 comma 3 del d.l. 131/2023, sia al fine di assegnare le risorse richieste e non ancora confermate degli allegati 2 e 4 del D.R.G.S. 183/2023 e degli allegati 3 e 4 del D.R.G.S. 185/2023.

CAPITOLO 6 - I Programmi cofinanziati PNRR-PNC

Come evidenziato nel capitolo 1, il finanziamento PNC per i 6 programmi c.d. "cofinanziati" ammonta a complessivi 11.253,61 milioni di euro.


Figura 7. Dati in milioni di euro. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 01.08.2022.

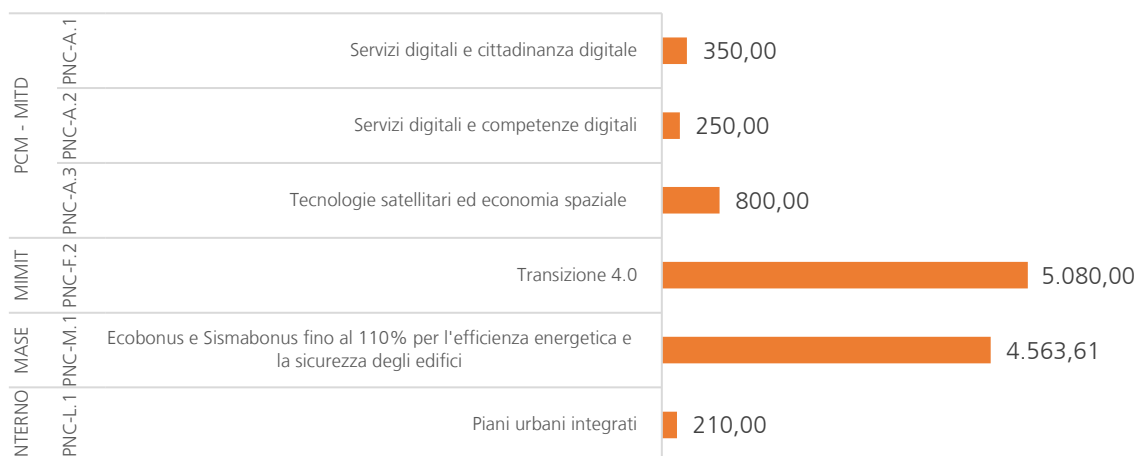

Il comma 7 dell'art. 1 del d.l. 59 del 2021 ha previsto che per il relativo monitoraggio l'utilizzo del sistema ReGis di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Il DM MEF 1° agosto 2022, che fissa gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi cofinanziati, prevede conseguentemente all'art. 4 comma 3 l'utilizzo di ReGis e l'applicazione della disciplina di cui al DPCM del 15 settembre 2021, che definisce modalità, tempistiche e strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale per i progetti del PNRR.

Figura 8. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 01.08.2022.

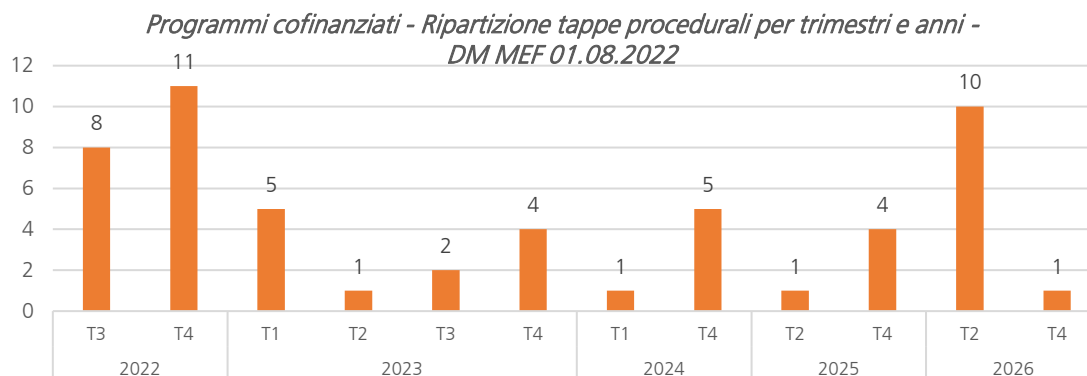

In particolare, l'art. 2 del citato DPCM prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare è responsabile delle attività di gestione, monitoraggio e conseguimento degli obiettivi e trasmette all'Ispettorato generale per il PNRR (già Servizio Centrale per il PNRR) tramite il sistema ReGis i dati finanziari, fisici e procedurali dei programmi di cui è titolare.

A settembre 2023 risultano 622 CUP (11 associati al programma PNC-A.3 per 744,5 milioni di euro e 611 associati al programma PNC-L.1 per 154,94 milioni di euro) per un totale complessivo di 899,44 milioni di euro, con una copertura di monitoraggio delle risorse finanziarie pari all'8%.

L'amministrazione cui è riconducibile il maggior numero di interventi risulta il Ministero dell'interno, con 611 CUP dislocati sull'intero territorio nazionale.

Alla scadenza del 30 settembre 2023 (**T3 2023**), il DM MEF 1° agosto 2022 prevede 2 obiettivi. Si rinvia all'allegato n. 2 per il dettaglio.

Allegato 1

Programmi e interventi del PNC

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
A.4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati urbani	PCM: Min. affari europei, coesione e PNRR	350,00	Il trimestre 2023 Avvio dei lavori in tutti gli HUB.	Parzialmente conseguito. Sottoscritte 18 convenzioni (con CUP) per complessivi 244,24 milioni di euro. Per circa il 60% dei 18 interventi è stato comunicato l'avvio dei lavori, mentre non risultano CIG per interventi che ammontano a 90,18 milioni di euro. Non risultano invece stipulate convenzioni per un importo pari a 105,76 milioni di euro .	II/2026 Fine dei lavori
B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
B.1.1 - Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi	PCM: Commissario sisma 2016 Dip. "Casa Italia" Struttura di missione sisma 2009.	1.080,00	IV trimestre 2022 Aggiudicazione e avvio dei lavori.	Parzialmente conseguito. L'Amministrazione ha comunicato che 746 CUP, per 666,30 milioni, hanno avviato lavori. 77 CUP, per un importo di 413,70 milioni, non risultano avviati. Dei suddetti 77 interventi risulta che: 1 CUP (0,14 mln di euro) è in corso di verifica; 37 CUP (71,5 mln di euro), gli enti titolari hanno comunicato l'esistenza di obbligazioni giuridicamente vincolanti; 22 CUP (23,2 mln di euro), riguardano appalti integrati con contrattualizzazione in corso; 4 CUP di RFI (31,7 mln di euro), sono stati aggiudicati i lavori o è in corso la gara; 1 CUP (68 mln di euro), bando GSE, sono stati ricevute candidature per raggiungere il 100% dell'obiettivo e il ritardo è dovuto alle interlocuzioni con la UE in materia di aiuti di stato; 4 CUP (167,38 mln di euro) per la c.d. "Innovazione digitale" sono in fase di sottoscrizione convenzioni al fine di avviare o sottoscrivere obbligazioni giuridicamente vincolanti entro dicembre 2023; 5 CUP (1,25 mln di euro), presentano criticità che potrebbero portare a un definanziamento; 3 CUP (50 mln di euro), sono interventi che non saranno realizzati. In conclusione, i CUP con criticità rilevanti sono 8, cui risulta associato un finanziamento PNC pari a 51,25 milioni di euro ; per i restanti 69 (finanziamento PNC di circa 235,5 milioni di euro) i ritardi appaiono in corso di recupero. Si riscontra ancora un disallineamento in BDAP, poiché risultano 686 CUP con lavori avviati per un importo di 471,90 milioni.	IV/2023 25% dei SAL

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
B.1.2 - Rilancio economico e sociale		700,00	IV trimestre 2022 Approvazione da parte dei soggetti attuatori delle istanze presentate e concessione dei finanziamenti.	Parzialmente conseguito. Sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione le risorse assegnate ammontano a complessivi 338,63 milioni di euro, pari al 48,37% del totale della Misura. Risultano non assegnati 361,37 milioni di euro , non ancora oggetto di decreti di concessione di contributi e quindi non associati a specifici CUP.	IV/2023 Relazione da parte dei soggetti attuatori che attesti l'utilizzo di almeno il 25% del valore finanziario dei progetti/iniziative
C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	MIT	600,00	III trimestre 2022 Sottoscrizione dei contratti.	Conseguito. Dai dati BDAP, su 67 interventi associati ad altrettanti CUP risultano contratti firmati o affidamenti diretti per 65 interventi, con finanziamento PNC pari a 535,17 milioni di euro, corrispondenti a circa il 90% delle risorse. Non risultano contratti firmati o affidamenti diretti per 2 interventi cui risulta associato un finanziamento PNC pari a 64,83 milioni di euro .	IV/2024 50% di autobus acquistati
C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi					
C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito:					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
<i>C.2.1.1 - Upgrading nuove navi</i>	MIT	500,00	Il trimestre 2023 Sottoscrizione dei contratti	Non conseguito. Pur se l'amministrazione ha rappresentato il conseguimento dell'obiettivo, rispetto agli 85 CUP originariamente individuati risultano sottoscritti 59 contratti, di cui 44 oggetto di provvedimenti di concessione emessi. I rimanenti 26 CUP sono stati revocati. Ad oggi risultano assegnati 78,85 milioni, mentre risultano non assegnati 421,15 milioni di euro.	I/2025 Consegna del 50% delle unità
<i>C.2.1.2 - Retrofit Navi</i>					IV/2024 Consegna unità
C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni:					
<i>C.2.2.1 - Acquisto navi</i>	MIT	60,00	III trimestre 2023 Avvio lavori realizzazione prima Unità Navale Veloce	Non conseguito. L'amministrazione ha comunicato che risulta impossibile procedere all'intervento e che pertanto possono essere revocati i 60 milioni previsti.	III/2024 Conclusione lavori di realizzazione della prima unità veloce
<i>C.2.2.2 - Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave)</i>	MIT	20,00	Il trimestre 2022 Completamento Ibridizzazione Nave Iginia prima nave traghettamento treni	Conseguito. L'Amministrazione ha rappresentato che risulta impossibile il cofinanziamento della terza nave a propulsione a GNL e che pertanto possono essere revocati i 9 milioni previsti.	IV/2024 Ibridizzazione nave traghetto Messina in esercizio
C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia:					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
<i>C.2.3.1 - Microliquefattori (130 mln)</i>	MIT	220,00	I trimestre 2023 Avvio dei lavori	Non conseguito.	I/2026 Messa in esercizio microliquefattori
<i>C.2.3.2 - Navi bunkerine (90 mln)</i>				Per quanto riguarda i “microliquefattori”, risultano assegnate risorse per 85 milioni di euro su 130; per le “navi bunkerine” risultano assegnate risorse per 29 milioni di euro su 90. Non risultano assegnazioni per un importo di 106 milioni di euro (di cui 45 relativi all’intervento microliquefattori e 61 all’intervento bunkerine).	I/2025 Consegna navi
C.3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali	MIT	1.550,00	Il trimestre 2023 Stipula contratti per il 100% dei lavori. Avvio del 100% dei lavori.	Parzialmente conseguito. Su 28 interventi identificati da CUP, per 25 risulta una obbligazione giuridicamente vincolante. Ai rimanenti 3 CUP privi di ogv è associato un finanziamento PNC di 90,71 milioni di euro .	II/2025 Completamento del 50% degli interventi
C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci					
C.4.1 - Locomotori, carri e raccordi ferroviari					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
<i>C.4.1.1 - Locomotori e carri</i>	MIT	115,00	IV trimestre 2022 Avvio procedure di acquisto mezzi da parte dei beneficiari	Gli obiettivi sono traslati ai sensi dell'articolo 1 c.8 d.l. 59/2021. L'Amministrazione ha comunicato che è stata pubblicata a settembre 2023 la decisione della Commissione Europea C(2023) 2973 dell'08/05/2023 e che non è ancora stato emanato il provvedimento (DM) di definizione delle modalità e condizioni di erogazioni del contributo ai benefici che è in corso di esame; pertanto in BDAP non risultano CUP.	IV/2023 Consegna 50% carri dal costruttore al beneficiario
<i>C.4.1.2 - Raccordi ferroviari</i>	MIT	30,00	III trimestre 2023 Conclusione primo step di lavori di elettrificazione raccordi alla rete RFI come individuato nel relativo contratto di programma.	Gli obiettivi sono traslati ai sensi dell'articolo 1 c.8 d.l. 59/2021. L'amministrazione ha comunicato che RFI "non ha effettivamente ancora richiesto pagamenti in suo favore" nelle more di una gap analysis, richiesta dalla Commissione, che accerti la misura dell'aiuto compatibile e che è necessario riprogrammare i termini temporali per il perseguimento degli obiettivi iniziali.	IV/2023 Conclusione secondo step di lavori di elettrificazione raccordi alla rete RFI come individuato nel relativo contratto di programma
C.4.2 - Mezzi intermodali					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
<i>C.4.2.1 - Locotrattori, transtainer, gru</i>	MIT	55,00	III trimestre 2023 Consegna locotrattori dal costruttore al beneficiario.	Non conseguito. Sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione emerge che: i CUP sono 36; i contratti trasmessi sono 20; i CIG sono 16; l'importo contrattualizzato per i 20 contratti è circa 40,65 milioni di euro; l'importo relativo alle rinunce è circa 7,77 milioni di euro . Circa 6,58 milioni di euro non sono quindi contrattualizzati o sono oggetto di rinuncia.	IV/2023 Consegna 50% transtainer e gru dal costruttore al beneficiario.
C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)					
C.5.1 - Ponti e viadotti	MIT	770,00 di cui: - 130,00 per monitoraggio dinamico; - 640,00 per interventi di adeguamento di ponti e viadotti	III trimestre 2023 80 ponti e viadotti monitorati	Non conseguito. L'obiettivo riferito al monitoraggio dinamico risulta non conseguito. In BDAP l'intervento è associato ad altro CUP riferito all'investimento C.5.2 Smart Road. Con riferimento agli interventi di adeguamento di ponti e viadotti, che non presentano un obiettivo nel trimestre, dal sistema di monitoraggio risultano 5 CUP cui corrisponde un finanziamento PNC di 610 milioni di euro a fronte di 640 milioni di euro previsti.	IV/2023 100 ponti e viadotti monitorati Avvio della procedura di affidamento (interventi strutturali)

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.5.2 - Smart Road	MIT	130,00	III trimestre 2022 Avvio dei lavori di installazione dispositivi per smart road	Conseguito. Per l'intervento di Smart road è stato creato 1 solo CUP in condivisione con Monitoraggio dinamico Ponti e Viadotti. In BDAP il CUP ha una fase di esecuzione lavori comunicata. Si rinvia alle informazioni sopra riportate.	IV/2024 Attivazione dispositivi Smart road sulle prime tratte
C.5.3 - Traforo del Gran Sasso	MIT	100,00	II trimestre 2023 Avvio dei lavori	Non conseguito. In BDAP non risultano gare pubblicate.	IV/2025 Collaudo / messa in esercizio

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale	MIT	450,00	Il trimestre 2023 Avvio dei lavori	<p>Non conseguito.</p> <p>I dati del sistema di monitoraggio evidenziano una procedura di affidamento avviata per 56 CUP su 60, cui corrisponde un finanziamento PNC di 172,96 milioni di euro; per 37 CUP (152 milioni) risulta anche almeno una aggiudicazione.</p> <p>Da un’analisi sul tipo di CIG (fornitura, lavori, servizi) emerge il seguente quadro:</p> <p>-su 19 CUP per lavori (31,45 milioni di euro), per 12 CUP (15,75 milioni di euro PNC associati) risulta una procedura non per lavori;</p> <p>- su 41 CUP per servizi (per un finanziamento PNC pari a 418,55 milioni di euro) 4 CUP (277,04 milioni di euro PNC associati) non risultano aver avviato alcuna procedura.</p>	<p>IV/2023</p> <p>Installazione dei sistemi di monitoraggio tecnologico e pianificazione delle priorità</p>

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	MIT	1.470,00	Il trimestre 2023 Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori.	Non si registrano variazioni rispetto al trimestre precedente. L'amministrazione ha confermato che non sono state pubblicate gare per un CUP, cui è associato un finanziamento PNC di 20 milioni di euro . Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di monitoraggio.	IV/2023 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere / esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema
C.8 - Aumento selettivo della capacità portuale	MIT	390,00	Il trimestre 2023 Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori	L'obiettivo risulta ancora parzialmente conseguito. L'amministrazione ha comunicato che non sono state pubblicate gare per la realizzazione di opere/esecuzione dei lavori per un solo CUP, cui è associato un finanziamento PNC di 35,15 milioni di euro . Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di monitoraggio.	IV/2023 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere / esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	MIT	250,00	Il trimestre 2023 Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori	L'obiettivo risulta ancora parzialmente conseguito. L'amministrazione ha comunicato che non sono state pubblicate gare per la realizzazione di opere/esecuzione dei lavori per 2 CUP, cui corrisponde un finanziamento PNC di 190 milioni di euro (di cui 180 milioni per il porto di Trieste). Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di monitoraggio.	IV/2023 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere / esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema
C.10 - Efficientamento energetico	MIT	50,00	Il trimestre 2023 Avvio lavori	L'obiettivo risulta ancora parzialmente conseguito. Per uno dei due progetti sono stati avviati i lavori, mentre per l'altro l'Amministrazione ha confermato la mancata pubblicazione del bando di gara, dovuto al ritiro dell'unica candidatura pervenuta (procedura ex art. 183, c. 15, d. lgs. n. 50/2016) e ha comunicato che l'Autorità portuale competente ha deciso di chiudere il procedimento, rinunciando a realizzare l'intervento, cui è associato un finanziamento PNC pari a 30 milioni di euro .	II/2025 Realizzazione di un deposito costiero di GNL Realizzazione di banchine elettrificate nei quattro porti dell'AdSP dello Stretto

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.11 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)	MIT	700,00	<p>III trimestre 2023</p> <p>Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori.</p>	<p>Conseguito.</p> <p>Si segnala tuttavia che l'Amministrazione ha comunicato che 2 CUP su 46 non presentano gare d'appalto per lavori, per un totale di 33,5 milioni di euro.</p> <p>Sui 46 CUP oggetto del Programma risultano poi aggiudicati bandi di gara per lavori solo per 9 CUP (pari al 19,6%), cui è associato un finanziamento PNC di 79 milioni di euro.</p> <p>Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di monitoraggio.</p>	<p>I/2024</p> <p>Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema.</p>

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne	MIT	300,00	Il trimestre 2023 Avvio dei lavori.	<p>Non conseguito.</p> <p>L'amministrazione ha riscontrato le condizioni per procedere al definanziamento per gli interventi che non hanno rispettato le tempistiche.</p> <p>Nel sistema di monitoraggio per 531 CUP non si hanno informazioni sull'ultima fase procedurale effettiva, mentre per 216 CUP tali informazioni sono presenti ed emerge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 12 interventi risultano chiusi, - 57 interventi sono in fase di esecuzione lavori, - 27 interventi sono in fase di collaudo, - 114 interventi sono in fase di progettazione (vari livelli) e 6 in fase di Funzionalità. <p>Inoltre, sui 747 CUP complessivi (di cui 9 chiusi) risultano bandi di gara per 271 CUP (36,2% del totale), cui corrisponde un finanziamento PNC di circa 68,04 milioni di euro. Sui rimanenti 231,96 milioni non sono disponibili informazioni sulla banca dati.</p>	I/2026 Conclusione dei lavori/collaudo interventi su 2.000 km di strade

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica	MIT	2.000,00	Il trimestre 2023 Consegna/Avvio dei lavori.	Conseguito. Sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, su 988 interventi per un valore di 2.000 milioni di euro, l'obiettivo è raggiunto per interventi cui è associato un finanziamento PNC di circa 1.887 milioni di euro mentre non sono stati avviati 75 interventi, per un finanziamento PNC di circa 113 milioni di euro . Tali dati forniti dall'amministrazione risultano non allineati con i dati presenti in BDAP, dove risultano 585 interventi avviati per 1.085 milioni di euro.	IV/2024 Realizzazione del 50% dei lavori
D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	MIC	1.455,24	Il trimestre 2023 Pubblicazione di tutti i Bandi di gara per appalto lavori e servizi.	Il precedente obiettivo è stato conseguito. Sono stati pubblicati i bandi di gara per tutti gli interventi.	IV/2023 Aggiudicazione di tutte le gare.
E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
E.1.1 – Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata	SALUTE	415,38	III trimestre 2023 Avvio interventi per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali.	Parzialmente conseguito. Livello regionale: L'Amministrazione ha comunicato che sono stati stipulati 17 accordi con le Regioni e le Province autonome, mentre i restanti 4 sono in fase di sottoscrizione. Nel complesso, alle strutture regionali sono assegnati complessivamente circa 378,2 milioni di euro e rendicontati interventi per 92,34 milioni. Livello nazionale: la quota ammonta a circa 37,2 milioni di euro complessivi e hanno avuto accesso ad una prima tranche di finanziamento sia ISPRA sia il Ministero della Salute (assegnazione complessiva circa 2,5 milioni), con iniziative avviate e nel rispetto della pianificazione finanziaria. Non sono stati tuttavia forniti specifici elementi indicanti il numero di interventi con avvio lavori. Non si hanno invece elementi sulle altre iniziative in corso, a fronte di una quota di finanziamento di circa 34,7 milioni di euro. Complessivamente tra livello regionale e livello nazionale, in BDAP è presente un unico CUP cui risultano associate 1559 gare per un finanziamento PNC di 114,67 milioni di euro. Sono attualmente in corso le attività per riallineare i dati. In totale le risorse oggetto di procedure avviate rappresentano il 27,60% delle risorse dell'investimento e gli affidamenti rappresentano circa il 9,92%.	IV/2023 Pubblicazione bando per 10% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali.

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
E.1.2 - Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale	SALUTE	49,50	IV trimestre 2022 Provvedimenti per l'identificazione dei siti contaminati e definizione del piano di interventi integrati di promozione della salute, sorveglianza attiva e assistenza sanitaria e sistemi di comunicazione partecipativa delle comunità.	Conseguito. Pubblicato in data 21 giugno 2023 apposito "Avviso rivolto alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano a manifestare l'interesse per l'attuazione del progetto. Le Regioni Puglia e Veneto si sono candidate quali capofila di due aggregazioni per lo sviluppo, rispettivamente dei seguenti programmi operativi pilota, in siti contaminati di interesse nazionale: <ol style="list-style-type: none"> 1. Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le diseguaglianze sociali; 2. Valutazione dell'esposizione di popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più suscettibili. Per la realizzazione dei due progetti sono in fase di stipula gli accordi con le Regioni capofila.	IV/2023 Pubblicazione bando e aggiudicazione.

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
E.1.3 - Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima	SALUTE	6,12	II trimestre 2022 Adozione provvedimento per definizione Piano di azione MdS-ISS; provvedimento di istituzione del SNPS	L'obiettivo risulta conseguito	IV/2023 Fase esecutiva - Acquisizione e rinnovamento infrastrutturale, di strumentazioni gestionali, piattaforme informatiche e sistemi qualità presso il centro di formazione Salute, Ambiente e Clima presso l'ISS
E.1.4 - Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima	SALUTE	21,00	IV trimestre 2022 Avvio interventi	L'obiettivo risulta conseguito.	IV/2026 Almeno 14 programmi attivati di promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima.

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
E.1.5 - Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS	SALUTE	8,00	III trimestre 2023 Procedure pubbliche di procurement riferite alla Piattaforma digitale nazionale: pubblicazione bando.	Conseguito. L'ISS ha inoltre comunicato di considerare conseguito l'obiettivo di pubblicazione del bando per le procedure di procurement della PDN mediante stipula del contratto con Università La Sapienza di Roma per adesione al SSN. È stato trasmesso il Piano di digitalizzazione, ma non il relativo provvedimento di adozione.	IV/2023 Procedure pubbliche di procurement riferite alla Piattaforma digitale nazionale: aggiudicazione.
E.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile	SALUTE	1.450,00	III trimestre 2023 Sottoscrizione dei contratti da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn.	Parzialmente conseguito. Dalla BDAP su un totale di 220 CUP risultano 68 interventi corredati da CIG, con data di stipula del contratto, cui sono associate risorse PNC per 549,71 milioni di euro. Per i restanti 152 CUP, a settembre 2023 non risultano sottoscrizioni di contratti, è associato un finanziamento PNC di 900,29 milioni di euro , pari al 62% del valore dell'intero programma. L'Amministrazione ha segnalato che la quasi totalità dei residui interventi rappresentano procedure di appalto integrato, procedure aziendali, centralizzate regionali e procedure di lavori indette da INVITALIA, alcuni dei quali devono terminare ancora la fase di progettazione.	IV/2023 Avvio dei lavori da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
E.3 - Ecosistema innovativo della salute	SALUTE	437,40	IV trimestre 2022 Aggiudicazione e stipula atti formali con i soggetti attuatori ed impegno/erogazione 1° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 20% dei fondi totali disponibili.	Conseguito. Si riscontrano in ogni caso disallineamenti tra le informazioni pervenute dall'Amministrazione e le risultanze del sistema di monitoraggio con riferimento ai CUP relativi al Programma.	IV/2023 Monitoraggio stato di attuazione previsto negli atti formali (convenzioni e/o accordi), rendicontazione, verifica dello stato di avanzamento del progetto - pagamento 2° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 20% dei fondi totali disponibili per l'intero programma salvo residui anno precedente

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
F.1 - "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	MIMIT	800,00	Il trimestre 2023 Completamento ed attivazione piattaforma multicanale	Conseguito. Sono in corso le verifiche per l'allineamento dei dati trasmessi dall'Amministrazione con le risultanze del sistema di monitoraggio, funzionali alla verifica del raggiungimento dell'obiettivo al 31/12/2023 (realizzazione interventi su almeno 1.550 UP, collaudo 150 interventi coworking). Sul punto l'Amministrazione ha comunicato che alla data del 30 settembre risultano ultimati n. 565 uffici postali.	IV/2024 Collaudo interventi di realizzazione dei 250 spazi per il coworking e le attività educative Realizzazione di interventi su almeno 2.800 UP.
F.3 - Accordi per l'Innovazione	MIMIT	1.000,00	Il trimestre 2023 Emanazione decreti di concessione delle agevolazioni per ammontare pari al 100% delle risorse stanziare per la misura.	Parzialmente conseguito. L'amministrazione ha comunicato che sono stati emanati decreti di concessione per 498,93 milioni euro a fronte della sottoscrizione di Accordi per un valore di 977 milioni di euro. Per 23 milioni di euro non risultano Accordi stipulati. Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di monitoraggio.	IV/2023 Erogazione di almeno il 5% delle risorse complessive stanziare.
G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
G.1.1 - Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni "modello" per detenuti adulti	GIUSTIZIA	84,00	III trimestre 2023 - 50% stipula contratto d'appalto; - 100% aggiudicazione definitiva affidamento dei lavori.	Parzialmente conseguito. Sulla base di quanto comunicato dall'amministrazione risulta: - per 4 interventi su 8 intervenuta stipula contratto appalto (50%); - per 6 interventi su 8 intervenuta aggiudicazione definitiva (75%). Non raggiunta l'aggiudicazione definitiva per 2 CUP per un finanziamento PNC di 10,5 milioni ciascuno per un totale di 21 milioni di euro . Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di monitoraggio.	IV/2023 75% stipula contratto d'appalto

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
G.1.2 - Adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni	GIUSTIZIA	48,90	<p>III trimestre 2023</p> <ul style="list-style-type: none"> - 75% stipula contratto d'appalto; - 100% aggiudicazione definitiva affidamento dei lavori. 	<p>Non conseguito.</p> <p>Dai dati forniti dall'amministrazione 2 interventi su 4 hanno raggiunto la fase di aggiudicazione definitiva (50%), di cui per 1 intervento risulta un contratto di lavori stipulato (25%).</p> <p>I CUP per cui non risulta pubblicato il bando per lavori hanno rispettivamente un finanziamento PNC di 25 milioni di euro e 9,8 milioni di euro, per un totale di 34,8 milioni di euro.</p> <p>Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di monitoraggio.</p>	<p>IV/2023</p> <p>100% stipula contratto d'appalto</p>

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
H.1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	MASAF	1.203,30	Il trimestre 2023 Approvazione delle graduatorie finali per la concessione degli aiuti finanziari altri settori; Numero di nuovi contratti per la filiera e di distretto firmati [obiettivo unico per tutti i settori]: 46	L'obiettivo risulta ancora parzialmente conseguito. Con decreto n. 526172 del 28 settembre 2023, è stata approvata la graduatoria per il settore forestale, contenente n. 62 programmi ammessi di cui i primi 12 finanziabili con le risorse PNC pari a 10 milioni di euro. A fronte dell'obiettivo di 46 contratti, allo stato risultano sottoscritti: - 11 contratti di distretto; - 14 contratti di filiera a valere sullo scorrimento del IV bando per un importo complessivo di 135,41 milioni euro.	Nessun ulteriore adempimento.
I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	MUR	500,00	Il trimestre 2023 Apertura della seconda finestra del primo bando e ricezione delle proposte progettuali per la seconda finestra del primo bando.	Il Programma è in linea con le scadenze, tenuto conto che sono stati già adottati i decreti di ammissione al finanziamento per le quattro iniziative selezionate.	IV/2023 Decreto di ammissione al finanziamento dei progetti selezionati e avvio dei progetti per la seconda finestra del primo bando.

Allegato 2

Programmi e interventi cofinanziati

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Importo (mln euro)	Trimestre di riferimento	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
A.1 - Servizi digitali e cittadinanza digitale	350,00	III trimestre 2023 Estensione eventuale convenzione con gli Enti sperimentatori degli interventi per la dematerializzazione delle banche dati	Conseguito È stato sottoscritto l'Accordo con l'Associazione Nazionale Comuni Italiani per potenziare la capacità dei Comuni di gestire l'intero ciclo della digitalizzazione locale. Il relativo decreto di approvazione è stato ammesso al visto della Corte dei conti.	IV/2023 Relazione conclusiva della digitalizzazione dei pagamenti della PA Registrazione di eventuali contratti di supporto specialistico per le attività di dematerializzazione archivi cartacei Relazione conclusiva del rafforzamento ANPR per la gestione degli atti di stato civile e la digitalizzazione della tessera elettorale

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Importo (mln euro)	Trimestre di riferimento	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
A.2 - Servizi digitali e competenze digitali	250,00	IV trimestre 2022 Pubblicazione di uno o più bandi sul sito del Soggetto attuatore.	Dalla rendicontazione prodotta dall'amministrazione titolare, i precedenti obiettivi risultano conseguiti. Il programma è attuato tramite l'iniziativa Fondo per la Repubblica Digitale (FRD), previsto da un protocollo d'intesa siglato fra il DTD, il MEF e l'Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio S.p.A. (ACRI) in data 22 gennaio 2022 finalizzato a finanziare progetti di formazione per l'innalzamento delle competenze digitali. I bandi attivi sono disponibili al link https://www.fondorepubblicadigitale.it/bandi/ Per il 2022 e il 2023 sono state assegnate al FDR, con provvedimenti dell'autorità politica delegata per l'innovazione tecnologica, complessivi 65 milioni di euro. L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che per il 2022 sono stati riconosciuti crediti d'imposta per un valore complessivo di circa 9,9 milioni di euro.	IV/2023 Primo obiettivo quantitativo fissato con delibera del CSI raggiunto
A.3 - Tecnologie spaziali ed economia satellitare				
A.3.1 - Satcom	110,00	I trimestre 2023 M1C2-22	Alla luce della rendicontazione del corrispondente obiettivo PNRR sulla base dei dati presenti sul sistema di monitoraggio	II/2026 M1C2-24

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Importo (mln euro)	Trimestre di riferimento	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
A.3.2 - Osservazione della Terra	430,00	I trimestre 2023 M1C2-22	Regis, il precedente obiettivo risulta conseguito.	II/2026 M1C2-24
A.3.3 - Space Factory	100,00	I trimestre 2023 M1C2-22		II/2026 M1C2-00-ITA-32 M1C2-23
A.3.4 - In-Orbit Economy	160,00	I trimestre 2023 M1C2-22		II/2026 M1C2-23
F.2 – Transizione 4.0	5.080,00	I trimestre 2023 estrazione dati da Agenzia delle Entrate dalle dichiarazioni dei redditi 2021 ed invio al MIMIT.	Dai dati presenti sul sistema di monitoraggio Regis i precedenti obiettivi risultano conseguiti.	I/2024 Estrazione dati da Agenzia delle Entrate dalle dichiarazioni dei redditi 2022 ed invio al MISE
L.1 – Piani urbani integrati	210,00	III trimestre 2023 Aggiudicazione di lavori pubblici da parte dei soggetti attuatori	Parzialmente conseguito. Dai dati presenti sul sistema di monitoraggio Regis e dalla rendicontazione fornita, l'obiettivo risulta parzialmente conseguito. A seguito dell'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori, con decreto direttoriale MINT del 26 giugno 2023 le risorse PNRR e PNC sono state ripartite a livello di CUP, e in	IV/2024 30% di somme erogate rispetto al totale delle risorse assegnate (2.703.790.000 €)

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Importo (mln euro)	Trimestre di riferimento	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			<p>totale sono stati individuati 608 CUP.</p> <p>Per 260 CUP si è fatto ricorso alla Centrale di Committenza di Invitalia S.p.A., che ha già aggiudicato le procedure di gara con appositi accordi quadro multilaterali per esecuzione di lavori ed appalti integrati.</p> <p>Per altri 230 progetti-CUP risultano invece aggiudicazioni o stipule.</p> <p>I restanti 118 CUP non presentano le informazioni necessarie sullo stato di attuazione oppure hanno comunicato la sola fase di pubblicazione del bando di gara.</p>	
M.1 - Ecobonus e sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici	4.563,61	Il trimestre 2023 M2C3-2	<p>Alla luce della rendicontazione del corrispondente obiettivo PNRR sulla base dei dati presenti sul sistema di monitoraggio Regis, il precedente obiettivo risulta conseguito.</p> <p>Sono stati individuati progetti di ristrutturazione di edifici privati che hanno fruito del c.d. Superbonus 110% per almeno 17.000.000 metri quadri, con risparmi di energia primaria di almeno il 40% e il miglioramento di almeno due classi energetiche nell'attestato di prestazione energetica.</p>	IV/2025 M2C3-3

