



PNRR

Missione Welfare

I ritardi nello stato di attuazione

Area Stato Sociale e Diritti

Aprile 2025

LAVORO | SICUREZZA | DIGNITÀ | CITTADINANZA | DEMOCRAZIA

REFERENDUM

8-9 GIUGNO



PNRR - Missione Welfare

I ritardi nello stato di attuazione – in sintesi

Dalla piattaforma di monitoraggio della CGIL, Sirio PNRR (che attinge i dati dal sistema ReGiS del MEF), a 14 mesi dalla scadenza del PNRR, **lo scenario dello stato di attuazione è allarmante con troppi progetti che procedono a rilento, con ritardi nell'esecuzione dei lavori o ancora fermi alla fase di progettazione**. Le poche opere completate e collaudate rendono concreto il rischio di non conseguire gli obiettivi strategici entro le scadenze previste.

In questo report, sono stati presi in esame solo alcuni dei tanti investimenti che riguardano le politiche sociali, sanitarie e abitative, previsti nelle **Missioni 4, 5 e 6**. In particolare, si tratta di quei progetti che prevedono la realizzazione di **opere di edilizia pubblica**, dagli asili nido all'edilizia sanitaria.

Missione 4 – Istruzione e ricerca

M4-C1.01 **“Piano asili nido e scuole dell'infanzia”**

2.265 progetti per **3,6 mld €** di finanziamenti. Progetti completati **4%** e pagamenti effettuati pari al **21%** dei fondi.

Ritardi nella fase dell'esecuzione dei lavori in oltre 1/3 dei progetti.

Missione 5 – Inclusione e coesione

M5-C2.2.01 **“Investimenti per progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di degrado ed emarginazione sociale”**

2.269 progetti per **5,0 mld €** di finanziamenti. Progetti completati **9%** e pagamenti effettuati pari al **23%** dei fondi.

Ritardi nella fase dell'esecuzione dei lavori per metà dei progetti.

M5-C2.2.02 **“Piani urbani integrati”**

610 progetti per **3,1 mld €** di finanziamenti. Progetti completati **1%** e pagamenti effettuati pari al **12%** dei fondi.

Ritardi nella fase dell'esecuzione dei lavori per metà dei progetti.

M5-C2.2.03 **“Programmi innovativi della qualità dell'abitare”**

966 progetti per **3,6 mld €** di finanziamenti. Progetti completati **5%** e pagamenti effettuati pari al **11%** dei fondi.

Ritardi nella fase dell'esecuzione dei lavori per oltre metà dei progetti.

Missione 6 - Salute

M6-C1.01 **“Case della Comunità e presa in carico della persona”**

1.416 progetti per **2,8 mld €** di finanziamenti. Progetti completati **2%** e pagamenti effettuati pari al **9%** dei fondi.

Ritardi nella fase dell'esecuzione dei lavori per oltre metà dei progetti mentre 1/3 dei progetti non hanno completato la progettazione esecutiva.

M6-C1.02 **“Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle suo strutture (Ospedali di Comunità)”**

427 progetti per **1,3 mld €** di finanziamenti. Progetti completati **2%** e pagamenti effettuati pari all'**8%** dei fondi.

Ritardi nella fase dell'esecuzione dei lavori per oltre metà dei progetti mentre 1/3 dei progetti non hanno completato la progettazione esecutiva.

M6-C2.02 **“Verso un ospedale sicuro e sostenibile”**

244 progetti per **1,7 mld €** di finanziamenti. Progetti completati **14%** e pagamenti effettuati pari al **16%** dei fondi.

Ritardi nella fase dell'esecuzione dei lavori per metà dei progetti.



PNRR - Missione 4 – Istruzione e ricerca

I ritardi nello stato di attuazione

Il PNRR - Missione 4 - Istruzione e ricerca, nelle due componenti C1 “Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione” e C2 “Dalla ricerca all’impresa”, prevede 75 mila progetti per un finanziamento di **31,2 miliardi** di €.

Alla data del 13.12.2024, risultano effettuati pagamenti per **7,3 miliardi** di € pari al **23,4% dei fondi** disponibili. Dei progetti monitorati, ne risultano completati il 24,4% del totale, mentre il 25,4% presenta almeno una fase in ritardo.

Per l’investimento M4-C1.01 **“Piano asili nido e scuole dell’infanzia”** (considerando solo i progetti validi), sono previsti 2.265 progetti per **3,6 miliardi di €**. Sono stati effettuati pagamenti solo per **767 milioni di €** pari al **21,2% dei fondi disponibili**.

Dei progetti monitorati, ne risultano **completati solo 83** (pari al **3,7%** del totale), mentre 926 presentano almeno una fase in ritardo (40,9%). Lo stato di avanzamento può essere analizzato osservando le diverse fasi di realizzazione: programmazione, progettazione, affidamento, esecuzione lavori e conclusione.

Per quanto riguarda la fase dell’**esecuzione delle opere**, **oltre un terzo dei progetti presenta ritardi preoccupanti**. In particolare, ci sono ritardi nell’avvio dei lavori di esecuzione di 386 strutture (13,8% del totale) a cui si aggiungono i ritardi nella fine dei lavori di altre 690 opere (24,6%).

Completati i lavori dei cantieri solo per 175 asili nido e/o scuole infanzia (6,3%).


Allarmante la distanza dal traguardo del collaudo per **76 progetti** (3,6% del totale), ancora fermi alla fase della **progettazione esecutiva**, step che di fatto impedisce l’avvio dei cantieri.

MISSIONE 4 - Istruzione e ricerca


		Progetti finanziati	Finanziamento totale (€)	Pagamenti effettuati	% Pagamenti/finanziam.	Progetti monitorati				
						Progetti	Tutti gli step nei tempi	Almeno uno step in ritardo	Progetti completati	% progetti completati / totale
M4C1 - Potenziamento offerta servizi istruzione*		56.264	17.485.276.665	4.810.176.369	27,5%	53.350	29.106	24.244	18.218	34,1%
1.01	Asili nido e scuole infanzia*	2.265	3.626.180.541	767.215.396	21,2%	2.265	1.339	926	83	3,7%
1.02	Estensione tempo pieno	961	528.382.179	146.303.083	27,7%	957	446	511	70	7,3%
1.03	Potenziamento infrastrutture sport a scuola	412	354.730.401	55.683.400	15,7%	412	187	225	26	6,3%
1.04	Divati territoriali scuola secondaria e abbandono	3.188	499.916.882	144.053.969	28,8%	3.147	398	2.749	398	12,6%
1.05	Sviluppo ITS	243	1.145.770.129	60.514.455	5,3%	237	128	109	3	1,3%
1.06	Orientamento scuola-università	402	238.799.858	101.777.295	42,6%	401	264	137	126	31,4%
1.07	Borse di studio per accesso all'università	148	519.997.247	516.956.329	99,4%	148	25	123	25	16,9%
2.01	Didattica digitale e formazione personale scolasti	16.368	509.616.571	45.470.966	8,9%	15.399	7.875	7.524	5.499	35,7%
3.01	Nuove competenze e nuovi linguaggi	8.621	881.539.771	71.116.515	8,1%	7.677	2.457	5.220	287	3,7%
3.02	Scuola 4.0	17.301	1.829.782.450	1.154.277.333	63,1%	16.402	11.226	5.176	11.194	68,2%
3.03	Messa in sicurezza edilizia scolastica	3.146	6.078.433.440	1.593.945.832	26,2%	3.096	1.579	1.517	507	16,4%
3.04	Didattica e competenze avanzate universitarie	401	267.503.462	8.613.753	3,2%	401	388	13		0,0%
4.01	Estensioni dottorati di ricerca	2.678	451.630.007	144.123.723	31,9%	2.678	2.678			0,0%
R1.07	Riforma legislazione alloggi universitari	130	552.993.727	124.320	0,0%	130	116	14		0,0%
M4C2 - Dalla ricerca all'impresa		18.479	13.754.436.192	2.511.395.368	18,3%	18.476	18.316	160	16	0,1%
Missione 4*		74.743	31.239.712.857	7.321.571.737	23,4%	71.826	47.422	24.404	18.234	25,4%

Elab. CGIL dati Regis 13.12.2024. (*) Per l'investimento C1.01 Asili nido e scuole infanzia si considerano solo i progetti validi


MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA
Progetti conclusi o nelle fasi in corso o in ritardo

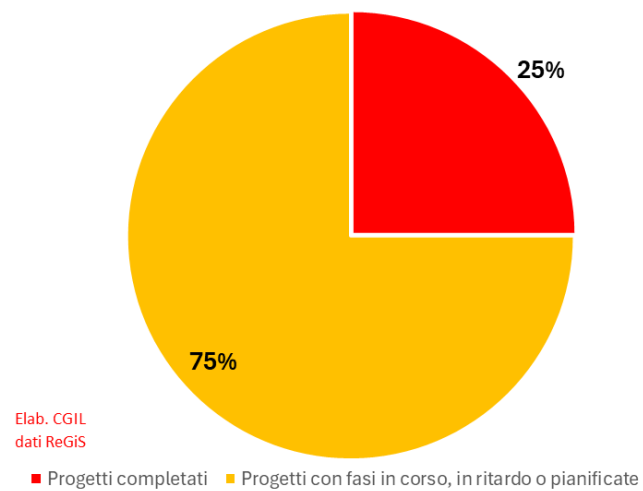


M4 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA
Progetti conclusi o nelle fasi in corso o in ritardo

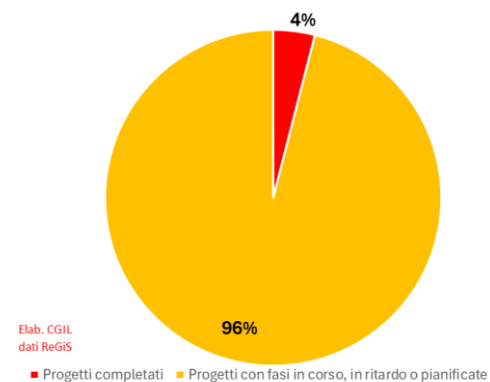

MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA
Pagamenti effettuati e fondi ancora da impiegare

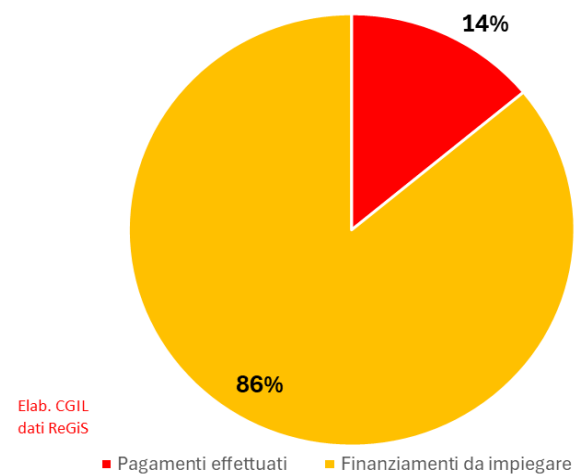

M4 - ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA
Progetti conclusi o nelle fasi in corso o in ritardo

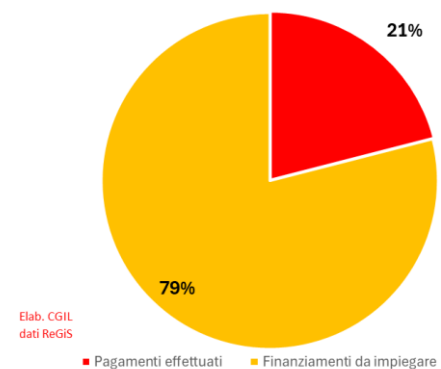



PNRR - Missione 5 – Inclusione sociale

I ritardi nello stato di attuazione

Il PNRR - Missione 5 – Inclusione, nelle tre componenti C1 “Politiche per il lavoro”, C2 “Infrastrutture sociali, famiglie e terzo settore” e C3 “Coesione territoriale”, prevede 27 mila progetti per un finanziamento di **32,0 miliardi** di €. Alla data del 13.12.2024, risultano effettuati pagamenti per **5,8 miliardi** di € pari al **18,3% dei fondi** disponibili. Dei progetti monitorati, ne risultano completati il 18,0% del totale, mentre il 44,7% presenta almeno una fase in ritardo.

Per l'investimento M5-C2.2.01 **“Investimenti per progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di degrado ed emarginazione sociale”** sono previsti 2.269 progetti per **5,0 miliardi di €**. Sono stati effettuati pagamenti solo per **1,1 miliardi di €** pari al **22,5% dei fondi** disponibili.

Dei progetti monitorati, ne risultano completati **solo 207** (pari al **9,1%** del totale), mentre oltre la metà dei progetti presenta almeno una fase in ritardo. Per quanto riguarda la fase dell'**esecuzione delle opere, quasi la metà dei progetti presenta ritardi**.

In particolare, ci sono ritardi nell'avvio dei lavori di esecuzione di 276 progetti (12,2% del totale) a cui si aggiungono i ritardi nella fine dei lavori di altri 751 (33,3%). Completati i lavori dei cantieri solo per 333 progetti (14,8%). Per **192 progetti** deve essere ancora completata la fase della **progettazione esecutiva**.

Per l'investimento M5-C2.2.02 **“Piani urbani integrati”** sono previsti 610 progetti per **3,1 miliardi di €**. Sono stati effettuati pagamenti solo per **370 milioni di €** pari al **11,8% dei fondi** disponibili. Dei progetti monitorati, ne risultano completati **solo 7** (pari al **1,1%** del totale), mentre due terzi dei progetti presenta almeno una fase in ritardo.

Per quanto riguarda la fase dell'**esecuzione delle opere, metà dei progetti presenta ritardi**, nella fase di avvio dei lavori (32,7% dei progetti) o nella fine dei lavori (19,3%). I lavori dei cantieri risultano completati solo per 23 progetti (3,9%). Per **143 progetti** deve essere ancora completata la fase della **progettazione esecutiva**.

Per l'investimento M5-C2.2.03 **“Programmi innovativi della qualità dell’abitare”** sono previsti 966 progetti per **3,6 miliardi di €**. Sono stati effettuati pagamenti solo per **410 milioni di €** pari al **11,4% dei fondi** disponibili. Dei progetti monitorati, ne risultano completati **solo 49** (pari al **5,1%** del totale), mentre due terzi dei progetti presenta almeno una fase in ritardo.

Per quanto riguarda la fase dell’**esecuzione delle opere**, anche per i “Pinqua” **oltre metà dei progetti presenta ritardi**, nella fase di avvio dei lavori (32,7% dei progetti) o in quella della fine dei lavori (21,4%). I lavori dei cantieri risultano completati solo per 76 progetti (8,1%). Per **182 progetti** deve essere ancora completata la fase della **progettazione esecutiva**.


MISSIONE 5 - Inclusione sociale

	Progetti finanziati	Finanziamento totale (€)	Pagamenti effettuati	% Pagamenti/finanziam.	Progetti monitorati				
					Progetti	Tutti gli step nei tempi	Almeno uno step in ritardo	Progetti completati	% progetti completati / totale
Infrastr. sociali, famiglie, terzo settore di cui:	7.734	13.969.643.061	2.180.118.123	15,6%	7.677	3.836	3.841	1.340	17,5%
1.01 Sostegno persone vulnerabili di cui:	946	488.921.466	32.024.892	6,6%	942	550	392	11	1,2%
- Azioni sostegno genitorialità	400	84.567.170	9.989.488	11,8%	398	270	128	5	1,3%
- Percorsi autonomia anziani	130	297.572.475	15.920.501	5,4%	130	54	76	1	0,8%
- Servizi domiciliari	200	65.471.180	2.996.565	4,6%	199	89	110	2	1,0%
- sostegno assistenti sociali	216	41.310.641	3.118.338	7,5%	215	137	78	3	1,4%
1.02 Sostegno autonomia disabilità	612	390.578.467	24.469.428	6,3%	596	282	314	9	1,5%
1.03 Housing first	494	415.405.894	35.561.886	8,6%	484	163	321	0	0,0%
2.01 Rigenerazione urbana	2.269	5.031.342.873	1.133.128.333	22,5%	2.263	1.036	1.227	207	9,1%
2.02 Piani urbani integrati	610	3.148.813.455	370.616.903	11,8%	609	223	386	7	1,1%
2.03 Pinqua	966	3.590.013.244	410.232.321	11,4%	964	347	617	49	5,1%
3.01 Sport e inclusione	1.837	904.567.662	174.084.360	19,2%	1.819	1.235	584	1.057	58,1%
Politiche lavoro	8.938	2.641.049.433	1.344.695.296	50,9%	7.416	5.133	2.283	1.572	21,2%
Coesione territoriale	1.415	947.917.820	108.564.973	11,5%	1.354	513	841	257	19,0%
Missione 5	26.767	32.017.174.841	5.845.521.407	18,3%	25.066	13.868	11.198	4.520	18,0%

Elab. CGIL dati Regis 13.12.2024.


MISSIONE 5 - INCLUSIONE SOCIALE

Progetti conclusi o nelle fasi in corso o in ritardo

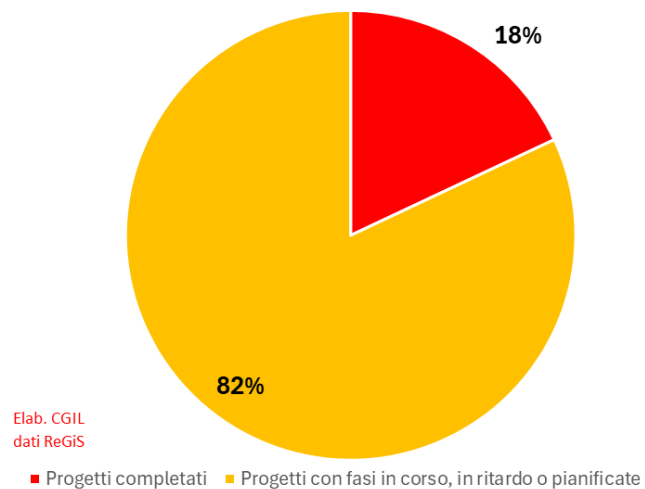


M5 - RIGENERAZIONE URBANA

Progetti conclusi o nelle fasi in corso o in ritardo

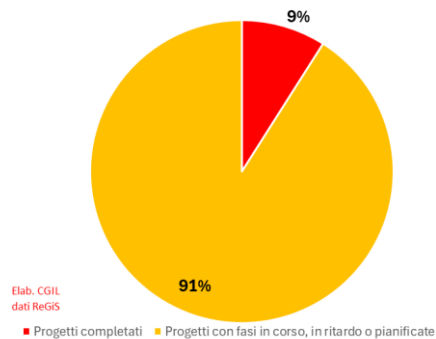


M5 - PIANI URBANI INTEGRATI

Progetti conclusi o nelle fasi in corso o in ritardo

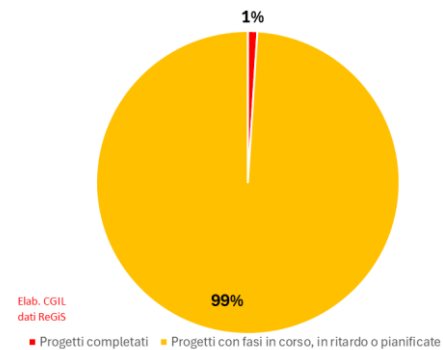


M5 - PIANI QUALITA' ABITARE

Progetti conclusi o nelle fasi in corso o in ritardo

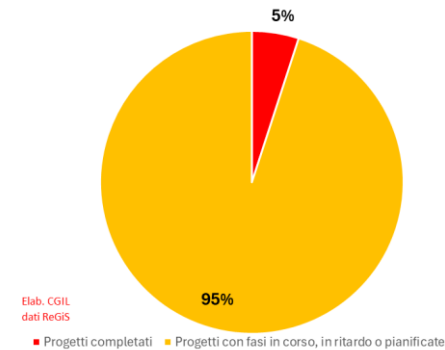


MISSIONE 5 - INCLUSIONE SOCIALE

Pagamenti effettuati e fondi ancora da impegnare

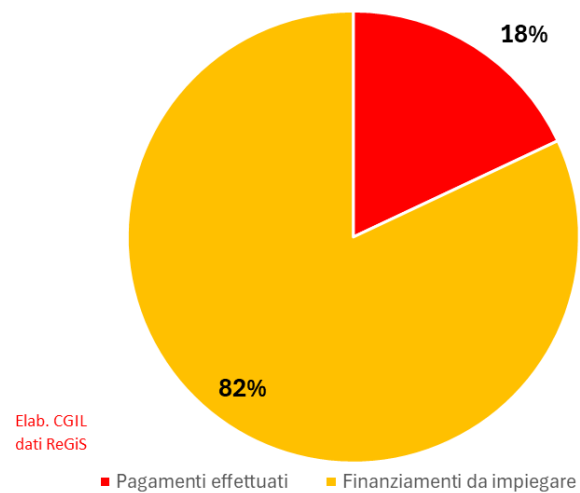


M5 - RIGENERAZIONE URBANA

Pagamenti effettuati e fondi ancora da impegnare

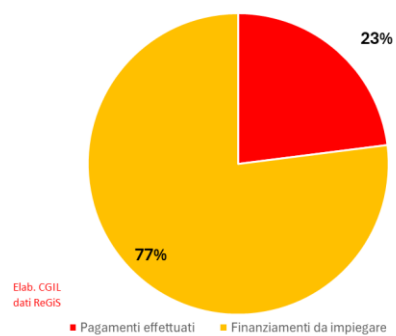


M5 - PIANI URBANI INTEGRATI

Pagamenti effettuati e fondi ancora da impegnare

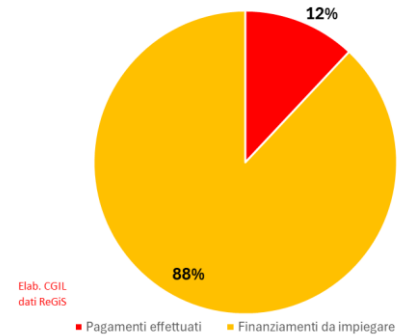

M5 - PIANI QUALITA' ABITARE

Pagamenti effettuati e fondi ancora da impegnare

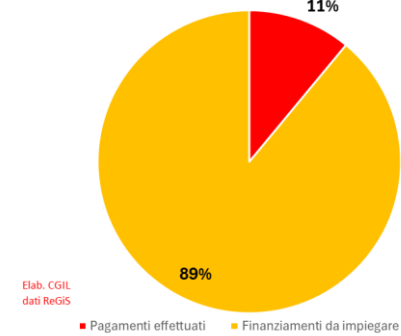



PNRR - Missione 6 – Salute

I ritardi nello stato di attuazione

Il PNRR - Missione 6 – Salute, nelle 2 componenti C1 “Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza territoriale” e C2 “Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario”, prevede 10 mila progetti per un finanziamento di **19,2 miliardi** di €. Alla data del 13.12.2024, risultano effettuati pagamenti per **3,4 miliardi** di € pari al **18,1% dei fondi** disponibili. Dei progetti monitorati, ne risultano completati il 35,0% del totale, mentre il 40,8% presenta almeno una fase in ritardo.

Per l’investimento M6-C1.01 **“Case della Comunità e presa in carico della persona”** sono previsti 1.416 progetti per **2,8 miliardi di €**. Sono stati effettuati pagamenti solo per **261 milioni di €** pari al **9,2% dei fondi** disponibili. Dei progetti monitorati, ne risultano completati **solo 25** (pari al **1,8%** del totale), mentre due terzi dei progetti presenta almeno una fase in ritardo.

Per quanto riguarda la fase dell’**esecuzione delle opere, oltre la metà dei progetti presenta ritardi**. In particolare, ci sono ritardi nell’avvio dei lavori di esecuzione di 648 opere (46,0% del totale) a cui si aggiungono i ritardi nella fine dei lavori di altre 140 (9,9%). Completati i lavori dei cantieri solo per 53 progetti (3,8%). Per **455 progetti** deve essere ancora completata la fase della **progettazione esecutiva**.

Per l’investimento M6-C1.02 **“Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle suo strutture (Ospedali di Comunità)”** sono previsti 427 progetti per **1,3 miliardi di €**. Sono stati effettuati pagamenti solo per **100 miliardi di €** pari al **7,9% dei fondi** disponibili.

Dei progetti monitorati, ne risultano completati **solo 207** (pari al **9,1%** del totale), mentre oltre la metà dei progetti presenta almeno una fase in ritardo.

Per quanto riguarda la fase dell’**esecuzione delle opere, oltre la metà dei progetti presenta ritardi**. In particolare, ci sono ritardi nell’avvio dei lavori di esecuzione di 197 progetti (46,4% del totale) a cui si aggiungono i ritardi nella fine dei lavori di altri 35 (8,2%). Completati i lavori dei cantieri solo per 20 progetti (4,5%). Per **146 progetti** deve essere ancora completata la fase della **progettazione esecutiva**.

Per l'investimento M6-C2.02 **“Verso un ospedale sicuro e sostenibile”** sono previsti 244 progetti per **1,7 miliardi di €**. Sono stati effettuati pagamenti solo per **264 milioni di €** pari al **15,9% dei fondi** disponibili. Dei progetti monitorati, ne risultano completati **solo 33** (pari al **14,1%** del totale), mentre oltre la metà dei progetti presenta almeno una fase in ritardo.

Per quanto riguarda la fase dell'**esecuzione delle opere**, quasi la **metà dei progetti presenta ritardi**, nella fase di avvio dei lavori (35,0% dei progetti) o nella fine dei lavori (11,3%). I lavori dei cantieri risultano completati solo per 17 progetti (8,4%). Per **50 progetti** deve essere ancora completata la fase della **progettazione esecutiva**.


MISSIONE 6 - Salute

		Progetti finanziati	Finanziamento totale (€)	Pagamenti effettuati	% Pagamenti/finanziam.	Progetti monitorati				
						Progetti	Tutti gli step nei tempi	Almeno uno step in ritardo	Progetti completati	% progetti completati / totale
M6C1 - Reti di prossimità, strutture per assistenza ter		2.754	9.805.475.574	1.242.960.895	12,7%	2.742	1.410	1.332	720	26,3%
1.01	Case Comunità	1.416	2.827.883.877	261.052.649	9,2%	1.413	528	885	25	1,8%
1.02	Ospedali Comunità	427	1.270.237.066	100.172.757	7,9%	427	163	264	10	2,3%
1.03	Casa primo luogo di cura e telemedicina	911	5.707.354.631	881.735.489	15,4%	902	719	183	685	75,9%
M6C2 - Innovazione, ricerca e digitalizzazione del SSN		7.330	9.412.164.690	2.241.327.802	23,8%	6.129	3.846	2.283	2.388	39,0%
2.02	Verso un ospedale sicuro e sostenibile	244	1.659.184.961	264.168.223	15,9%	234	110	124	33	14,1%
2.01	Ammodernamento parco tecnologico e digitale os	4.699	4.342.175.924	1.162.879.526	26,8%	4.601	2.810	1.791	2.351	51,1%
2.03	Rafforzamento infrastruttura tecnologica e strum	263	1.375.416.455	128.539.459	9,3%	257	93	164	3	1,2%
2.04	Rafforzamento ricerca biomedica SSN*	1.858	528.510.964	674.508.725	127,6%	771	682	89	1	0,1%
2.05	Sviluppo competenze tecniche e professionali pe	266	1.506.876.386	11.231.869	0,7%	266	151	115		0,0%
Missione 6		10.084	19.217.640.264	3.484.288.697	18,1%	8.871	5.256	3.615	3.108	35,0%


Elab. CGIL dati Regis 13.12.2024. Per quanto riguarda l'investimento "Rafforzamento ricerca biomedica SSN" sono state prese in considerazione solo i pagamenti effettuati con risorse PNRR.

MISSIONE 6 - SALUTE


Progetti conclusi o nelle fasi in corso o in ritardo

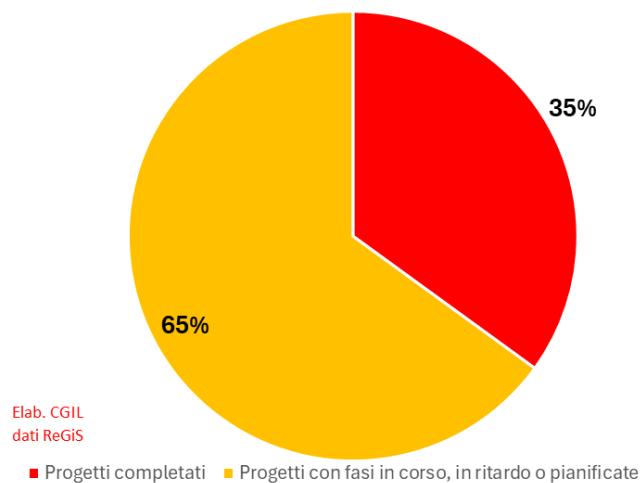


M6 - CASE DELLA COMUNITA'
Progetti conclusi o nelle fasi in corso o in ritardo

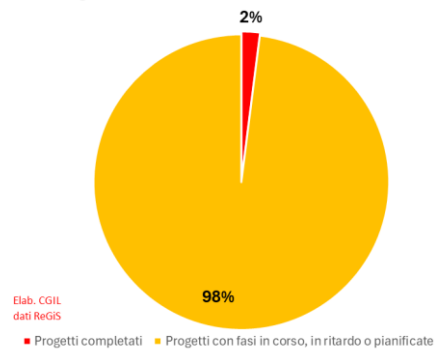

M6 - OSPEDALI DI COMUNITA'
Progetti conclusi o nelle fasi in corso o in ritardo

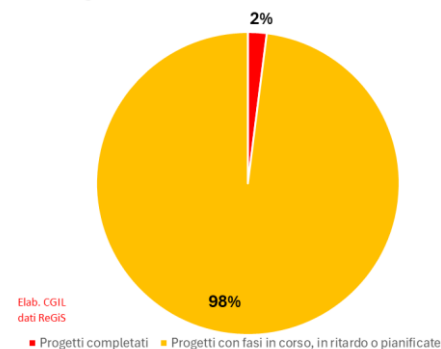


M6 - VERSO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE
Progetti conclusi o nelle fasi in corso o in ritardo

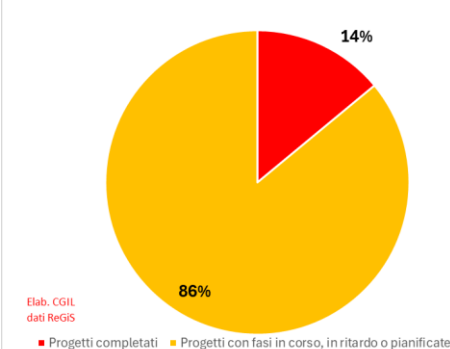


MISSIONE 6 - SALUTE


Pagamenti effettuati e fondi ancora da impegnare

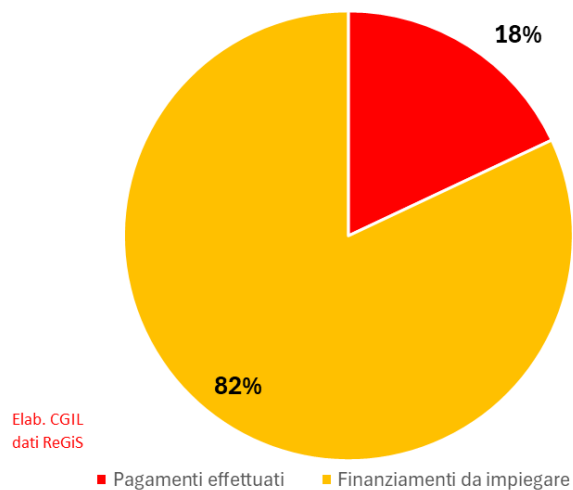


M6 - CASE DELLA COMUNITA'
Pagamenti effettuati e fondi ancora da impegnare

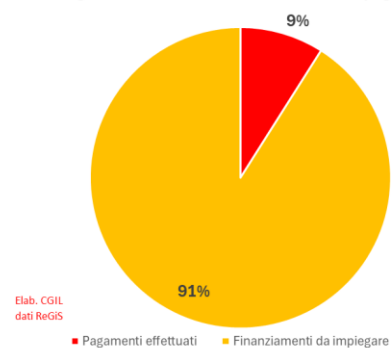

M6 - OSPEDALI DI COMUNITA'
Pagamenti effettuati e fondi ancora da impegnare

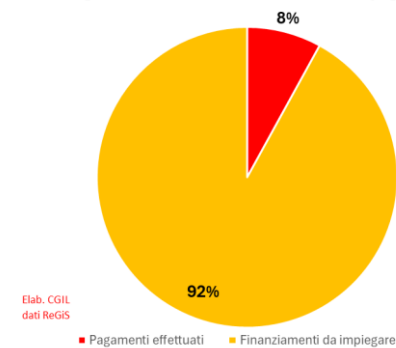

M6 - VERSO OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE
Pagamenti effettuati e fondi ancora da impegnare

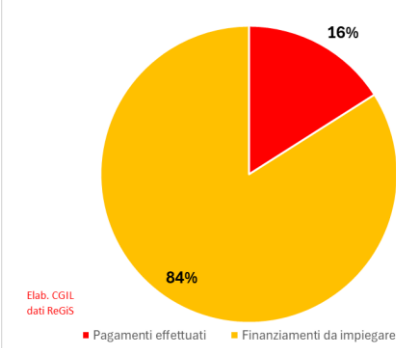



PNRR – Missioni 4, 5, 6

La fase dell'esecuzione lavori in alcuni investimenti

Fase esecuzione lavori							
	Progetti aggiudicati	Esecuzione lavori					
		Conclusi	In corso	Pianificati	In ritardo		% in ritardi/tot. progetti
					inizio lavori	fine lavori	
Asili nido e scuole infanzia*	2.800	175	1.541	8	386	690	38,4%
Rigenerazione urbana	2.257	333	870	27	276	751	45,5%
Piani urbani integrati	591	23	241	29	184	114	50,4%
Pinqua	941	76	340	16	308	201	54,1%
Case Comunità	1.410	53	561	8	648	140	55,9%
Ospedali Comunità	425	20	172	1	197	35	54,6%
Verso un ospedale sicuro e sostenibile	203	17	87	5	71	23	46,3%

Elab. CGIL - Dati ReGIS 13.12.2024. **Esecuzione lavori:** **Conclusi** - Conclusi alla data di elaborazione dei dati; **In Corso** - Avviati con una data prevista di fine successiva alla data di elaborazione dei dati; **In Ritardo Inizio** - Che non risultano avviati entro la data prevista (trascorsa); **In Ritardo Fine** - Avviati ma non conclusi entro la data prevista (trascorsa); **Pianificati** - Da avviare in una data successiva alla data di elaborazione dei dati

Province per % di progetti in ritardo nell'inizio lavori sul totale progetti

		Progetti aggiudicati	% ritardo inizio lavori
1	Alessandria	8	100%
2	Biella	3	100%
3	Frosinone Latina	32	100%
4	Campobasso	9	100%
5	Isernia	4	100%
6	Benevento	11	100%
7	Avellino	10	100%
8	Salerno	33	100%
9	Bat	9	100%
10	Brindisi	9	100%
11	Cosenza	13	100%
12	Reggio Calabria	12	100%
13	Gioia Tauro	5	100%
14	Crotone	6	100%
15	Castrovillari	9	100%
16	Cagliari	7	100%
17	Oristano	5	100%
18	Sardegna sud occ.	11	100%
19	Nuoro-Ogliastro	7	100%
20	Caserta	30	97%
21	Catania	21	95%
22	Sassari	10	90%
23	Ancona	8	88%
24	Bari	36	86%
25	Lodi	5	80%
26	Enna	5	80%
27	Olbia-Tempio	9	78%
28	Agrigento	21	76%
29	Teramo	8	75%
30	Caltagirone	8	75%
31	Novara - VCO	10	70%
32	Matera	6	67%
33	L'Aquila	11	64%
34	Area vasta CZ-KR-VV	11	64%
35	Lecce	24	63%
36	Palermo	36	61%
37	Asti	5	60%
38	Varese	20	60%

CASE DELLA COMUNITA'

		Progetti aggiudicati	% ritardo inizio lavori
39	Chieti	15	60%
40	Napoli	87	59%
41	Foggia	26	58%
42	Cuneo	10	50%
43	Monza	17	47%
44	Potenza	13	46%
	ITALIA	635	45%
45	Bolzano	10	40%
46	Trapani	13	38%
47	Roma S.P.C.	21	38%
48	Messina	21	38%
49	Roma C.O.L.	47	36%
50	Firenze	20	35%
51	Legnano	9	33%
52	Trieste	3	33%
53	Ferrara	6	33%
54	Pescara	6	33%
55	Caltanissetta	9	33%
56	Genova	16	31%
57	Taranto	17	29%
58	Torino	42	26%
59	Vercelli	4	25%
60	Venezia	16	25%
61	Ravenna	8	25%
62	Pesaro	4	25%
63	Macerata	8	25%
64	Roma Ci.No.Vi.	16	25%
65	Parma	9	22%
66	La Spezia	5	20%
67	Milano	40	20%
68	Trento	10	20%
69	Pistoia	5	20%
70	Terni	5	20%
71	Ascoli Piceno	5	20%
72	Vibo Valentia	5	20%
73	Valcamonica	11	18%
74	Savona	6	17%
75	Perugia	12	17%

		Progetti aggiudicati	% ritardo inizio lavori
76	Brescia	20	15%
77	Livorno	7	14%
78	Forlì-Cesena	8	13%
79	Vicenza	17	12%
80	Bergamo	18	11%
81	Mantova	9	11%
82	Pavia	11	9%
83	Pisa	12	8%
84	Roma EVA Rieti	15	7%
85	Valle d'Aosta	4	0%
86	Imperia	4	0%
87	Como	12	0%
88	Cremona	4	0%
89	Lecco	8	0%
90	Sondrio	5	0%
91	Belluno	4	0%
92	Padova	20	0%
93	Treviso	16	0%
94	Verona	16	0%
95	Rovigo	5	0%
96	Gorizia	4	0%
97	Pordenone	5	0%
98	Udine	11	0%
99	Bologna	18	0%
100	Imola	2	0%
101	Modena	13	0%
102	Piacenza	6	0%
103	Reggio Emilia	10	0%
104	Rimini	5	0%
105	Arezzo	7	0%
106	Prato	4	0%
107	Grosseto	6	0%
108	Lucca	5	0%
109	Massa Carrara	4	0%
110	Siena	6	0%
111	Fermo	4	0%
112	Ragusa	9	0%
113	Siracusa	12	0%

Elab. CGIL - Dati Regis

In **19 province tutti i progetti** per la realizzazione di **Case della Comunità** presentano **ritardi nell'avvio dei lavori**. Si tratta di 203 progetti, pari al 43% del totale.

Province per % di progetti in ritardo nell'inizio lavori sul totale progetti

		Progetti aggiudicati	% ritardo inizio lavori
1	Alessandria	3	100%
2	Asti	1	100%
3	Biella	1	100%
4	Monza	3	100%
5	Lodi	2	100%
6	Bolzano	3	100%
7	Frosinone Latina	10	100%
8	L'Aquila	3	100%
9	Campobasso	1	100%
10	Isernia	1	100%
11	Benevento	5	100%
12	Avellino	4	100%
13	Caserta	8	100%
14	Salerno	8	100%
15	Bat	6	100%
16	Brindisi	6	100%
17	Vibo Valentia	2	100%
18	Cosenza	4	100%
19	Reggio Calabria	2	100%
20	Gioia Tauro	2	100%
21	Crotone	1	100%
22	Castrovillari	5	100%
23	Agrigento	3	100%
24	Enna	2	100%
25	Cagliari	2	100%
26	Oristano	2	100%
27	Sardegna sud occidentale	1	100%
28	Nuoro-Ogliastro	2	100%
29	Palermo	10	90%
30	Genova	6	83%
31	Catania	6	83%
32	Bari	9	78%
33	Sassari	4	75%
34	Cuneo	3	67%
35	Novara - VCO	3	67%
36	Legnano	3	67%
37	Livorno	3	67%
38	Roma S.P.C.	8	63%

Elab. CGIL - Dati Regis

OSPEDALI DI COMUNITA'

		Progetti aggiudicati	% ritardo inizio lavori
39	Napoli	23	61%
40	Foggia	7	57%
41	Vercelli	2	50%
42	La Spezia	2	50%
43	Pavia	4	50%
44	Varese	4	50%
45	Ascoli Piceno	2	50%
46	Roma EVA Rieti	4	50%
47	Teramo	2	50%
48	Matera	2	50%
49	Area vasta CZ-KR-VV	4	50%
50	Caltagirone	4	50%
51	Olbia-Tempio	2	50%
	ITALIA	425	45%
52	Roma C.O.L.	7	43%
53	Milano	11	36%
54	Brescia	6	33%
55	Rimini	3	33%
56	Lucca	3	33%
57	Perugia	3	33%
58	Ancona	3	33%
59	Roma Ci.No.Vi.	6	33%
60	Chieti	3	33%
61	Lecce	6	33%
62	Potenza	3	33%
63	Taranto	4	25%
64	Mantova	5	20%
65	Firenze	5	20%
66	Bergamo	6	17%
67	Torino	14	14%
68	Vicenza	7	14%
69	Valle d'Aosta	1	0%
70	Imperia	1	0%
71	Savona	2	0%
72	Como	5	0%
73	Cremona	3	0%
74	Lecco	4	0%
75	Sondrio	2	0%

		Progetti aggiudicati	% ritardo inizio lavori
76	Valcamonica	2	0%
77	Trento	3	0%
78	Belluno	3	0%
79	Padova	4	0%
80	Treviso	5	0%
81	Venezia	4	0%
82	Verona	8	0%
83	Rovigo	3	0%
84	Trieste	0	0%
85	Gorizia	2	0%
86	Pordenone	2	0%
87	Udine	3	0%
88	Bologna	5	0%
89	Imola	1	0%
90	Ferrara	2	0%
91	Modena	4	0%
92	Parma	3	0%
93	Piacenza	2	0%
94	Ravenna	2	0%
95	Reggio Emilia	3	0%
96	Forlì-Cesena	2	0%
97	Arezzo	3	0%
98	Pisa	1	0%
99	Prato	2	0%
100	Grosseto	2	0%
101	Massa Carrara	1	0%
102	Pistoia	2	0%
103	Siena	1	0%
104	Terni	2	0%
105	Pesaro	2	0%
106	Fermo	0	0%
107	Macerata	2	0%
108	Pescara	3	0%
109	Caltanissetta	2	0%
110	Messina	6	0%
111	Ragusa	3	0%
112	Siracusa	4	0%
113	Trapani	3	0%

In **28 province tutti i progetti** per la realizzazione di **Ospedali di Comunità** presentano **ritardi nell'avvio dei lavori**. Si tratta di 93 progetti, pari al 22% del totale.

Province per % di progetti in ritardo nell'inizio lavori sul totale progetti

ASILI NIDO E SCUOLE INFANZIA


		Progetti aggiudicati	% ritardo inizio lavori
1	Lucca	10	50%
2	Bat	17	47%
3	Palermo	40	40%
4	Siracusa	23	39%
5	Varese	16	38%
6	Legnano	8	38%
7	Ragusa	22	36%
8	Napoli	111	33%
9	Agrigento	25	32%
10	Taranto	29	31%
11	Catania	42	31%
12	Reggio Calabria	37	30%
13	Alessandria	11	27%
14	Caltanissetta	4	25%
15	Foggia	34	24%
16	Gioia Tauro	17	24%
17	Caltagirone	9	22%
18	Messina	41	22%
19	Como	14	21%
20	Brindisi	24	21%
21	Trapani	24	21%
22	La Spezia	10	20%
23	Lodi	15	20%
24	Valcamonica	5	20%
25	Potenza	55	20%
26	Mantova	21	19%
27	Cuneo	36	17%
28	Venezia	18	17%
29	Roma S.P.C.	25	16%
30	Pescara	38	16%
31	Nuoro-Ogliastro	19	16%
32	Lecce	70	16%
33	Bari	51	16%
34	Roma EVA Rieti	26	15%
35	Salerno	105	15%
36	Bergamo	48	15%
37	Matera	21	14%
38	Torino	43	14%

Elab. CGIL - Dati Regis

		Progetti aggiudicati	% ritardo inizio lavori
39	Firenze	36	14%
ITALIA		2.800	14%
40	Castrovillari	46	13%
41	Rimini	8	13%
42	Area vasta CZ-KR-VV	48	13%
43	Verona	33	12%
44	Frosinone Latina	61	11%
45	Cosenza	61	11%
46	Forlì-Cesena	9	11%
47	Pistoia	9	11%
48	Crotone	18	11%
49	Caserta	73	11%
50	Padova	29	10%
51	Teramo	29	10%
52	L'Aquila	39	10%
53	Brescia	40	10%
54	Roma Ci.No.Vi.	40	10%
55	Enna	10	10%
56	Cagliari	10	10%
57	Oristano	10	10%
58	Avellino	62	10%
59	Pisa	21	10%
60	Vercelli	11	9%
61	Novara - VCO	22	9%
62	Monza	11	9%
63	Treviso	22	9%
64	Massa Carrara	11	9%
65	Asti	12	8%
66	Lecco	12	8%
67	Campobasso	36	8%
68	Pesaro	26	8%
69	Benevento	54	7%
70	Vicenza	28	7%
71	Ravenna	14	7%
72	Ferrara	15	7%
73	Savona	16	6%
74	Piacenza	16	6%
75	Reggio Emilia	16	6%

		Progetti aggiudicati	% ritardo inizio lavori
76	Sassari	16	6%
77	Genova	21	5%
78	Cremona	21	5%
79	Pavia	22	5%
80	Macerata	22	5%
81	Vibo Valentia	22	5%
82	Perugia	24	4%
83	Milano	25	4%
84	Isernia	26	4%
85	Chieti	54	4%
86	Sardegna sud occ.	29	3%
87	Udine	31	3%
88	Biella	5	0%
89	Aosta	5	0%
90	Imperia	12	0%
91	Sondrio	19	0%
92	Bolzano	33	0%
93	Trentino	25	0%
94	Belluno	7	0%
95	Rovigo	7	0%
96	Trieste	2	0%
97	Gorizia	1	0%
98	Pordenone	12	0%
99	Bologna	27	0%
100	Imola	1	0%
101	Modena	19	0%
102	Parma	13	0%
103	Arezzo	21	0%
104	Prato	4	0%
105	Grosseto	8	0%
106	Livorno	6	0%
107	Siena	9	0%
108	Terni	11	0%
109	Ancona	17	0%
110	Fermo	13	0%
111	Ascoli Piceno	10	0%
112	Roma C.O.L.	14	0%
113	Olbia-Tempio	8	0%


Case delle Comunità - Fase ESECUZIONE LAVORI % progetti con ritardo nell'inizio lavori

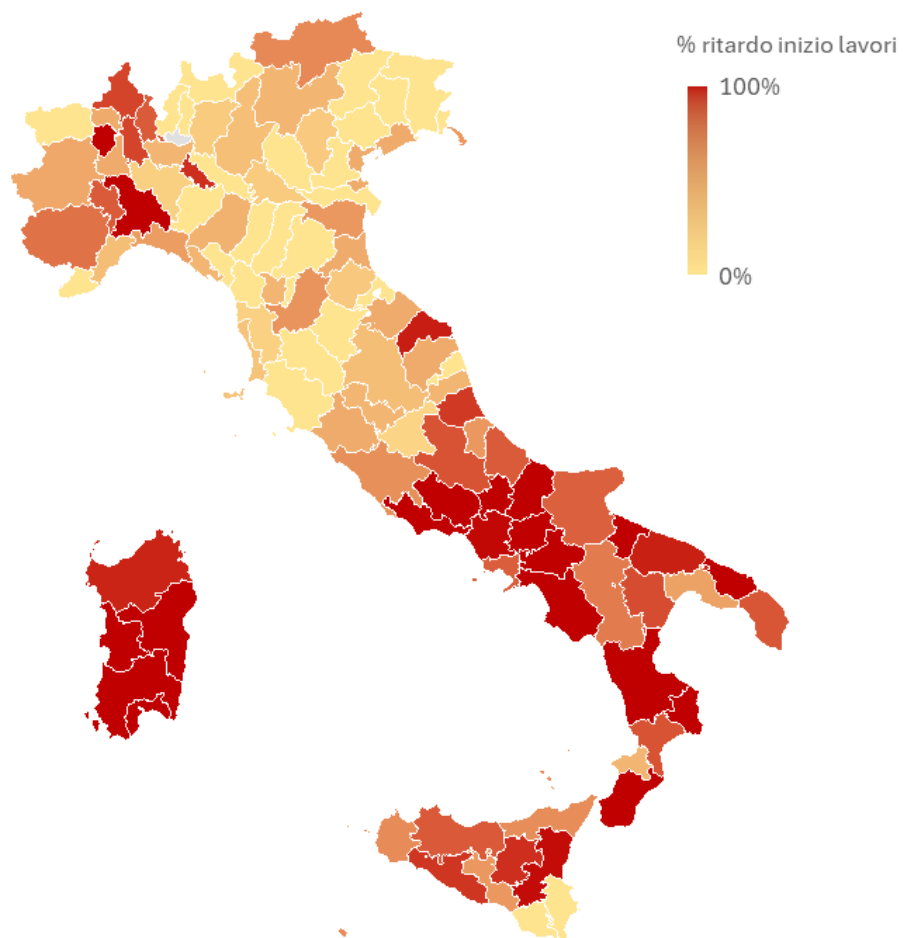

Elab. CGIL
dati ReGIS


Con tecnologia Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Ospedali di Comunità - Fase ESECUZIONE LAVORI % progetti con ritardi nell'inizio lavori

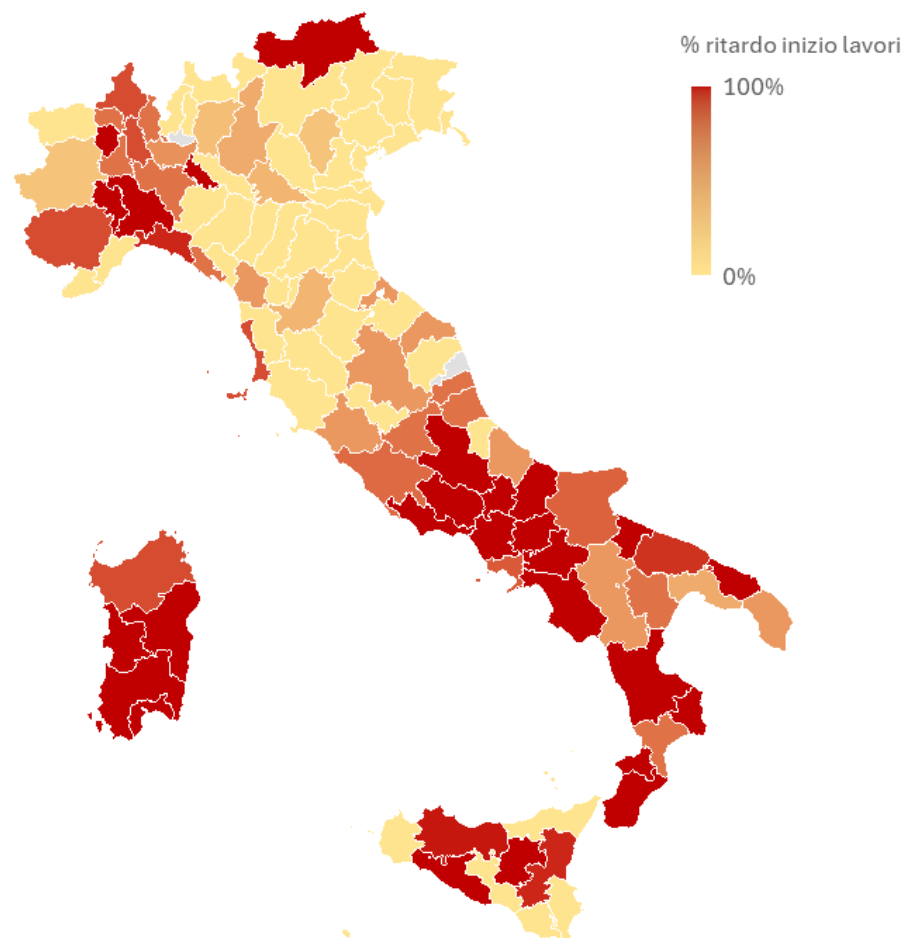

Elab. CGIL
dati ReGIS

Con tecnologia Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

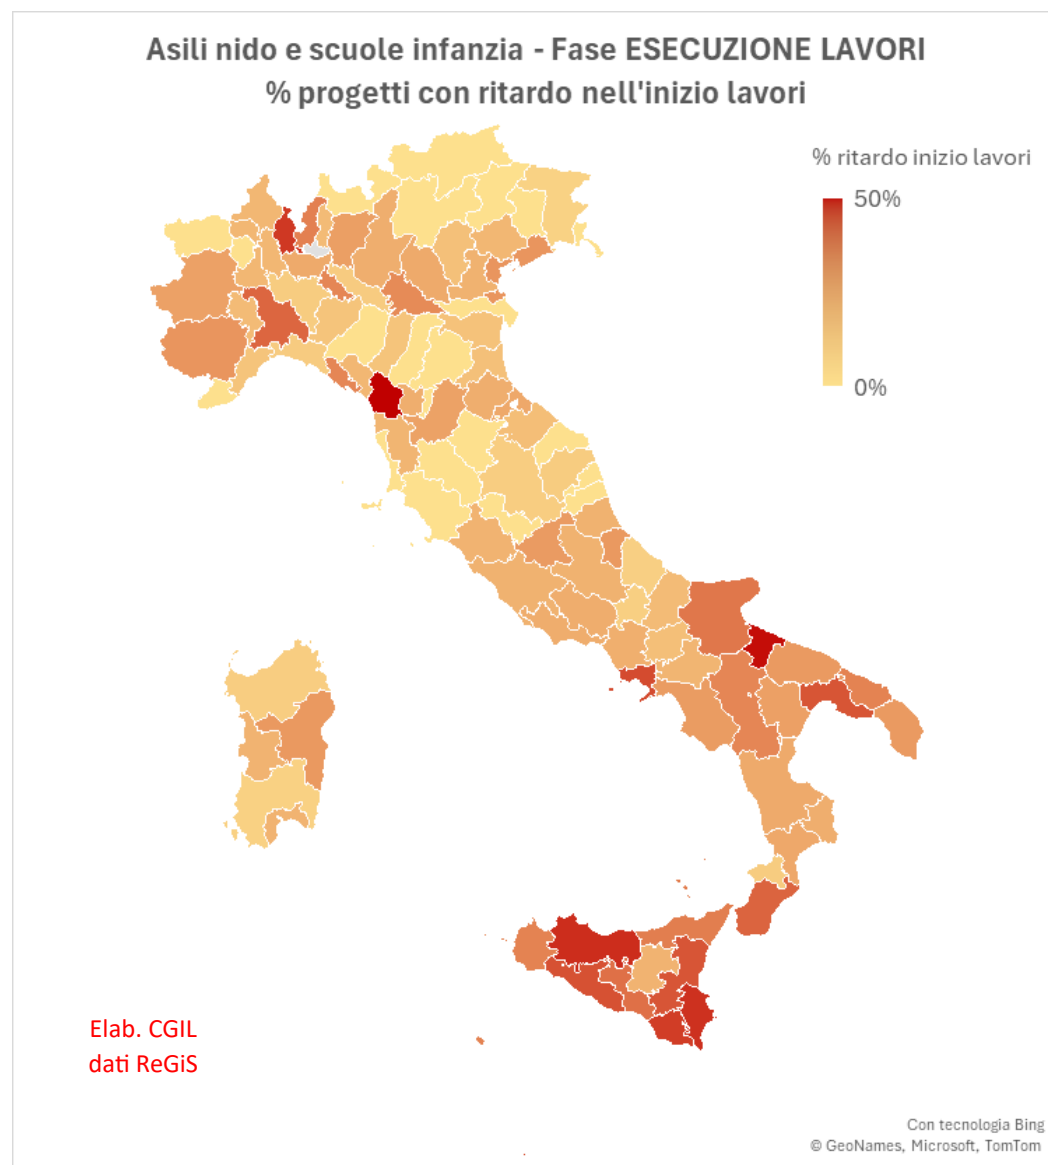

REFERENDUM

8-9 GIUGNO

Votiamo Sì per cambiare l'Italia

il voto è la nostra rivolta

Con il referendum non lasci che gli altri decidano per te

LAVORO | SICUREZZA | DIGNITÀ | CITTADINANZA | DEMOCRAZIA
