



Garantire la corretta programmazione  
e la rigorosa gestione  
delle risorse pubbliche

# PNC

## Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

*Report n. 9: adempimenti e attività al 31 dicembre 2023*

2021  
2022  
**2023**  
2024





***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***  
***DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO***

# **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR**

**Report n. 10: adempimenti e attività al 31 dicembre 2023**



# INDICE

CAPITOLO 1 - QUADRO INTRODUTTIVO .....	1
CAPITOLO 2 - I 24 PROGRAMMI "DEL PIANO": DATI DI MONITORAGGIO E STATO DEGLI OBIETTIVI .....	3
CAPITOLO 3 - RIPARTIZIONE TERRITORIALE DELLE RISORSE DEI PROGRAMMI DEL PIANO (DM MEF 15 LUGLIO 2021) AGGIORNATA AL 31 DICEMBRE 2023 .....	5
CAPITOLO 4 - IL FONDO OPERE INDIFFERIBILI PER IL PNC .....	7
CAPITOLO 5 - I 6 PROGRAMMI COFINANZIATI PNRR-PNC .....	9
ALLEGATO 1 .....	11
PROGRAMMI E INTERVENTI DEL PNC .....	11
A.4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati .....	11
B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 .....	11
B.1.1 - Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi .....	11
B.1.2 - Rilancio economico e sociale .....	12
C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus .....	12
C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi .....	13
C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito: .....	13
C.2.1.1 - Upgrading nuove navi .....	13
C.2.1.2 - Retrofit Navi .....	13
C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni: .....	13
C.2.2.1 - Acquisto navi .....	14
C.2.2.2 - Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave) .....	14
C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia: .....	14
C.2.3.1 - Microliquefattori (130 mln) .....	14
C.2.3.2 - Navi bunkerine (90 mln) .....	14
C.3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali .....	15
C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci .....	15
C.4.1 - Locomotori, carri e raccordi ferroviari .....	15
C.4.1.1 - Locomotori e carri .....	15
C.4.1.2 - Raccordi ferroviari .....	16
C.4.2 - Mezzi intermodali .....	16
C.4.2.1 - Locotrattori, transtainer, gru .....	16
C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) .....	17
C.5.1 - Ponti e viadotti .....	17
C.5.2 - Smart Road .....	17
C.5.3 - Traforo del Gran Sasso .....	18
C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale .....	18
C.7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici .....	19
C.8 - Aumento selettivo della capacità portuale .....	20
C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale .....	20
C.10 - Efficientamento energetico .....	20
C.11 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing) .....	21
C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne .....	21
C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica .....	22
D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali .....	22
E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima .....	23

E.1.1 – Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata .....	23
E.1.2 - Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale .....	24
E.1.3 - Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima .....	24
E.1.4 - Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima .....	25
E.1.5 - Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS .....	25
<b>E.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile .....</b>	<b>26</b>
<b>E.3 - Ecosistema innovativo della salute .....</b>	<b>26</b>
<b>F.1 - "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale .....</b>	<b>27</b>
<b>F.3 - Accordi per l'Innovazione .....</b>	<b>27</b>
<b>G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori .....</b>	<b>27</b>
G.1.1 - Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni "modello" per detenuti adulti .....	27
G.1.2 - Adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni .....	28
<b>H.1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo .....</b>	<b>29</b>
<b>I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale .....</b>	<b>29</b>
<b>ALLEGATO 2 .....</b>	<b>31</b>
<b>Programmi e interventi cofinanziati .....</b>	<b>31</b>
A.1 - Servizi digitali e cittadinanza digitale .....	31
A.2 - Servizi digitali e competenze digitali .....	31
A.3 - Tecnologie spaziali ed economia satellitare .....	32
A.3.1 - Satcom .....	32
A.3.2 - Osservazione della Terra .....	32
A.3.3 - Space Factory .....	32
A.3.4 - In-Orbit Economy .....	32
<b>F.2 – Transizione 4.0 .....</b>	<b>32</b>
<b>L.1 – Piani urbani integrati .....</b>	<b>33</b>
<b>M.1 - Ecobonus e sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici .....</b>	<b>34</b>

## CAPITOLO 1 - Quadro introduttivo

I 30 programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, sono ripartiti in 24 programmi “del Piano” (c.d. esclusivi), e 6 programmi PNRR-PNC (c.d. cofinanziati), per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.

La realizzazione del PNC costituisce un **obiettivo del PNRR** ed entro il secondo trimestre 2025 si dovrà dimostrare, tra l’altro, un significativo **assorbimento delle risorse** del Piano (milestone M1C1-62), oltre che **l’aumento della capacità di pianificare, gestire ed eseguire gli investimenti in conto capitale**.

Gli obiettivi e la disciplina attuativa dei programmi sono contenuti nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021 (Programmi del Piano) e nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 1° agosto 2022 (Programmi cofinanziati).

Il monitoraggio in itinere del Piano – di cui il qui presente report costituisce sintesi – è funzionale alla verifica continuativa e alla valutazione dei risultati attesi (obiettivi iniziali, intermedi e finali previsti dal comma 7 dell’articolo 1 del decreto-legge n.59 del 2021) nel rispetto delle scadenze definite dai relativi cronoprogrammi procedurali.

L’analisi e il monitoraggio dell’andamento dei progetti hanno consentito nei mesi scorsi di evidenziare l’insorgenza di fattori di rallentamento (crisi economica, incremento dei prezzi, scarsità di materie prime, procedure amministrative poco coerenti con le tempistiche) che hanno inciso negativamente sull’andamento del Piano stesso.

Sul punto si rammenta che l’articolo 7, comma 1, del D.L. 13 del 2023 aveva previsto un aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all’allegato 1 del dm MEF 15 luglio 2021, da attuare con decreto MEF di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di PNRR anche per consentire alle Amministrazioni titolari dei programmi del PNC, alla luce delle evidenziate criticità, di portare a compiuta realizzazione quanto programmato, mediante l’adeguamento delle scadenze esclusivamente intermedie (senza incidere sui target finali) degli obiettivi, mantenendo fermo il rispetto degli impegni assunti con la Commissione europea nell’ambito del PNRR collegati all’attuazione del PNC.

La revisione dei cronoprogrammi non ha tuttavia avuto corso in quanto, nonostante la conclusione delle attività istruttorie di competenza finalizzate alla definizione del decreto, non è ancora stato perfezionato il necessario concerto tra le Amministrazioni competenti sul provvedimento.

In assenza di cronoprogrammi aggiornati, gli obiettivi di riferimento per il monitoraggio sull’avanzamento dei Programmi “del Piano” rimangono quelli individuati nell’Allegato 1 al decreto MEF del 15 luglio 2021.

Vale la pena segnalare preliminarmente che, in via generale, rispetto alla situazione registrata nei trimestri precedenti, la performance risulta migliorata.

Ciò premesso, il presente report contiene lo stato di avanzamento degli obiettivi e degli adempimenti al quarto trimestre 2023; per i programmi che non presentano obiettivi per tale trimestre, il report fornisce lo stato di avanzamento del programma in relazione all'obiettivo immediatamente precedente.

Con riferimento ai programmi c.d. "cofinanziati" (DM MEF 1° agosto 2022), il capitolo 6 fornisce il quadro complessivo e l'allegato 2 lo stato di avanzamento redatto sulla base dei dati presenti nel sistema REGIS e delle rendicontazioni fornite dalle Amministrazioni.



## CAPITOLO 2 - I 24 programmi "del Piano": dati di monitoraggio e stato degli obiettivi


I 24 programmi "del Piano", di cui al DM MEF 15 luglio 2021, ammontano complessivamente a 19.368,85 milioni di euro.

Al 31 dicembre 2023 risultano censiti a sistema 4.984 interventi identificati da codice unico di progetto (CUP) con associato un finanziamento di circa 16,72 miliardi di euro; il dato evidenzia un incremento di circa il 12% rispetto al trimestre precedente, nel quale i CUP censiti risultavano 4.450.

L'amministrazione cui è riconducibile il maggior numero di interventi risulta il MIT, con oltre duemila CUP dislocati sull'intero territorio nazionale, seguita dal Commissario straordinario per il sisma 2016 e dal Ministero della Salute.

Figura 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021.

### *Progetti individuati da CUP per Amministrazione titolare*

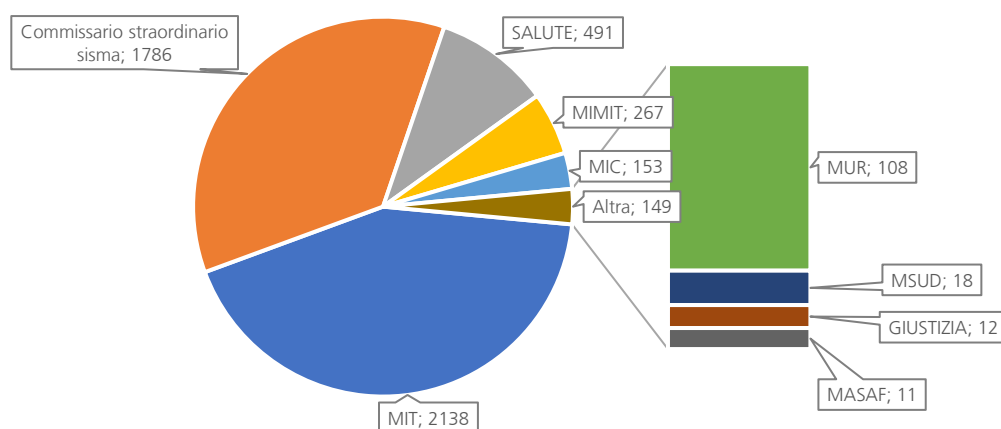


Come già rappresentato in precedenza, continuano tuttavia a registrarsi criticità nell'alimentazione del sistema di monitoraggio, dovute al non corretto adempimento da parte dei soggetti attuatori titolari dei CUP nonostante i solleciti inviati da alcune Amministrazioni titolari per i programmi di rispettiva competenza.

Al fine di migliorare la qualità dei dati disponibili prosegue il confronto con le singole Amministrazioni sulle risultanze del sistema informativo, anche attraverso un'analisi incrociata dei dati e la richiesta di supporti documentali.


Alla scadenza del 31 dicembre 2023 (**T4 2023**), il DM MEF 15 luglio 2021 prevede 21 obiettivi ripartiti tra le diverse Amministrazioni come rappresentato nella figura 2.

Figura 2. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021.

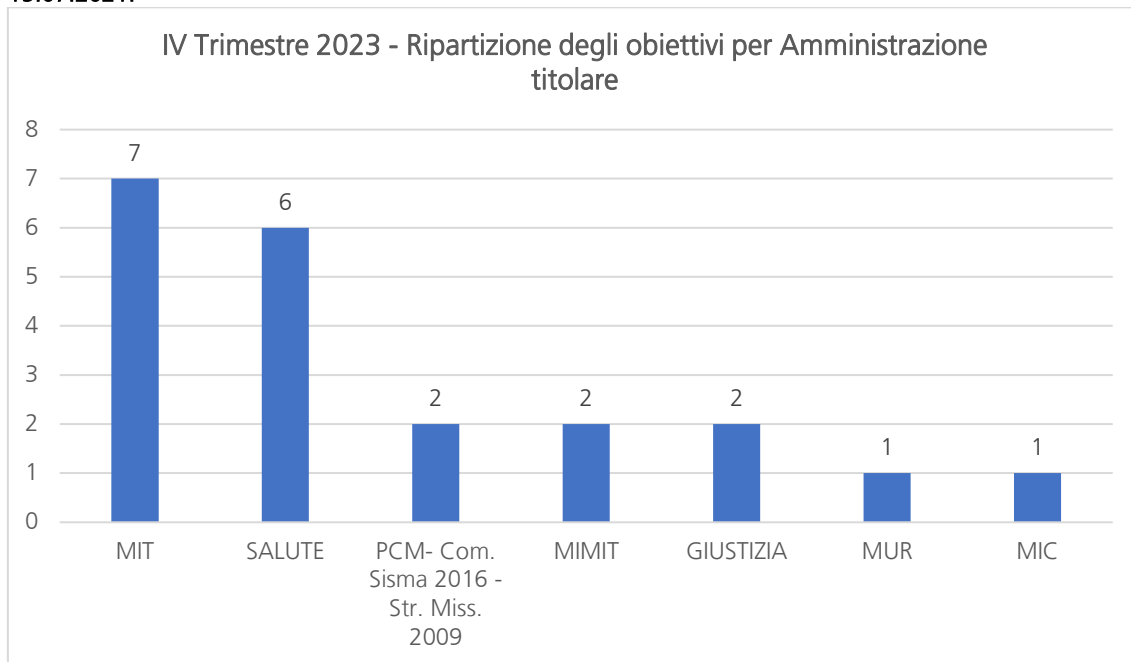

Come accennato, in via generale, rispetto alla situazione registrata nei trimestri precedenti, la performance rispetto agli obiettivi è migliorata, con una percentuale di conseguimento che passa dal 36% al 43%; il 33% degli obiettivi del IV trimestre 2023 risulta invece parzialmente conseguito e il 24% non conseguito.

Figura 3. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

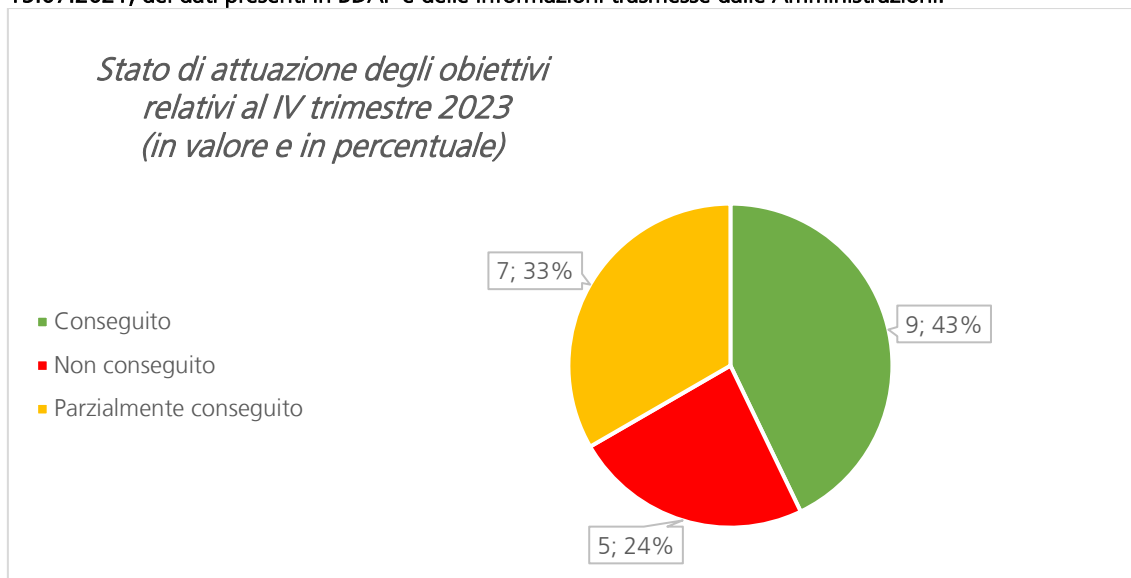

## CAPITOLO 3 - Ripartizione territoriale delle risorse dei programmi del Piano (DM MEF 15 luglio 2021) aggiornata al 31 dicembre 2023

Si riporta di seguito un aggiornamento della distribuzione regionale delle risorse relative ai programmi del PNC (DM MEF del 15.07. 2021, circa 19,37 miliardi di euro) sulla base dei dati presenti nel sistema di monitoraggio.

Figura 4. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni




Risultano assegnate a specifici progetti identificati da CUP risorse per circa 16,72 miliardi di euro (inclusi gli interventi localizzati su più Regioni), al netto di circa 2,65 miliardi di euro il cui iter di ripartizione non è ancora concluso o che per loro destinazione non sono ex ante territorialmente ripartibili.

Tabella 1. Ripartizione regionale delle risorse al 31 dicembre 2023

Regioni	Importo PNC in mln di €
ABRUZZO	1.454,57
BASILICATA	135,77
CALABRIA	625,87
CAMPANIA	1.797,41
EMILIA-ROMAGNA	610,72
FRIULI-VENEZIA GIULIA	577,81
LAZIO	1.504,47
LIGURIA	851,93
LOMBARDIA	908,84
MARCHE	717,46
MOLISE	94,36
PIEMONTE	441,51
PUGLIA	907,61
SARDEGNA	564,85
SICILIA	1.127,18
TOSCANA	804,54
TRENTINO-ALTO ADIGE/SÜDTIROL	81,87
UMBRIA	225,48
VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE	22,09
VENETO	682,92
<b>Subtotale delle risorse ripartite tra le regioni</b>	<b>14.137,26</b>
INTERVENTI LOCALIZZATI SU PIU REGIONI	2.581,52
Altri interventi allo stato non localizzabili	2.650,07
<b>Totale DM MEF 15 luglio 2021</b>	<b>19.368,85</b>

Figura 5. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

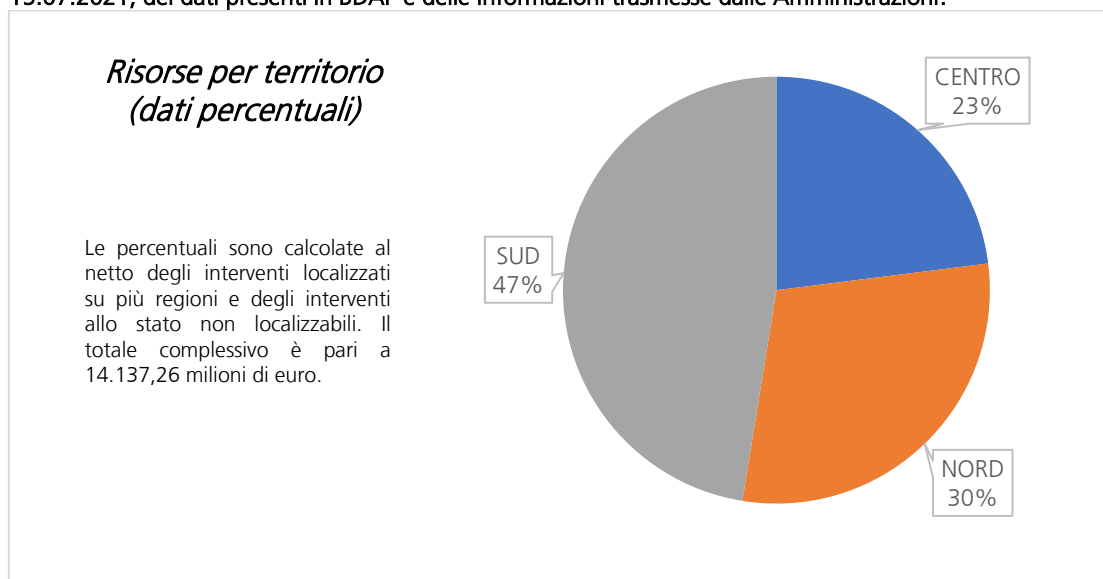

## CAPITOLO 4 - Il Fondo opere indifferibili per il PNC

Come segnalato nei precedenti report, per fronteggiare gli incrementi dei costi dei materiali, l'articolo 26, comma 7, del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili.

Le risorse sono state assegnate, nel corso del 2022 e del 2023, con specifici provvedimenti del Ragioniere Generale dello Stato che si riportano di seguito:

- Decreto n. 52 del 2.3.2023 - Assegnazione definitiva interventi PNC FOI 2022;
- Decreto del 28.3.2023 (ID 25491) - Procedura di Recupero 2022;
- Decreto n. 124 del 13.3.2023 - Procedura Semplificata I sem. 2023;
- Decreto n. 183 del 13.3.2023 - Assegnazione definitiva Procedura Semplificata I sem. 2023;
- Decreto n. 154 del 19.5.2023 - Procedura Ordinaria I sem. 2023;
- Decreto n. 185 del 8.8.2023 - Assegnazione definitiva Procedura Ordinaria I sem. 2023;
- Decreto n. 175 del 11.7.2023 - Procedura Semplificata II sem. 2023;
- Decreto n. 187 del 11.08.2023 come modificato dal Decreto R.G.S. 195 del 6.10.2023 - Procedura Ordinaria II sem. 2023 e Assegnazione definitiva per procedura di riallineamento<sup>1</sup>;
- Decreto n. 207 del 03.11.2023 – Modifiche ai decreti 2022 e I semestre 2023;
- Decreto n. 211 del 17.11.2023 - Procedura Ex Art. 7 c. 4 D.L. 131/2023;
- Decreto n. 220 del 5.12.2023 - Procedura Ex Art. 7 c. 3 D.L. 131/2023.

Tabella 2. Dati in milioni di euro. Elaborazione RGS-IGAE dei dati di cui ai decreti RGS adottati.

Legenda: ORD= Procedura ordinaria; REC= Procedura di recupero; SEMPL= Procedura semplificata; PROC RIALLINEAM= Procedura di riallineamento

Programma PNC	FOI 2022			FOI I sem. 2023		FOI II sem. 2023		PROC. RIALLINEAM.	PROC. EX ART. 7	TOTALE COMPLESSIVO
	ORD.	REC.	SEMP.	ORD.	SEMP.	ORD.	SEMP.			
PNC-B.1	93,53	11,40	48,32	151,30	-	236,46	0,38	-	-	541,38
PNC-C.3	7,93	-	-	-	-	-	-	-	-	7,93
PNC-C.7	59,35	-	-	25,30	-	-	-	13,71	-	98,35
PNC-C.8	-	-	-	-	-	97,67	-	9,63	-	107,29
PNC-C.9	4,14	-	-	11,79	-	-	-	-	-	15,92
PNC-C.11	2,42	-	-	1,55	-	1,10	-	-	-	5,07
PNC-C.12	-	-	4,75	-	-	1,88	1,71	-	1,02	9,36
PNC-C.13	108,94	16,68	42,19	1,10	1,89	0,57	1,12	2,97	0,26	175,73
PNC-D.1	-	-	86,74	-	-	-	0,40	-	0,17	87,31
PNC-E.1	0,44	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44
PNC-E.2	84,52	-	-	-	-	25,41	-	41,48	24,34	175,74
PNC-G.1	11,84	-	-	7,62	-	2,03	-	-	-	21,49
<b>Totale</b>	<b>373,11</b>	<b>28,08</b>	<b>182,01</b>	<b>98,65</b>	<b>1,89</b>	<b>365,11</b>	<b>3,60</b>	<b>67,78</b>	<b>25,79</b>	<b>1.246,02</b>

In relazione ai programmi c.d. "cofinanziati", si aggiunge che a valere sul FOI per il programma "Piani urbani integrati" sono state assegnate complessivamente risorse per circa 211,55 milioni di euro.

<sup>1</sup> Le risorse del I semestre 2023 e quelle della procedura di riallineamento sono state definitivamente assegnate.


Le risorse del II semestre 2023 sono invece da confermare in esito alla verifica dell'avvenuto avvio delle procedure di riferimento.



## CAPITOLO 5 - I 6 programmi cofinanziati PNRR-PNC

Il finanziamento PNC per i 6 programmi c.d. "cofinanziati" ammonta a complessivi 11.253,61 milioni di euro.


Figura 6. Dati in milioni di euro. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 01.08.2022.

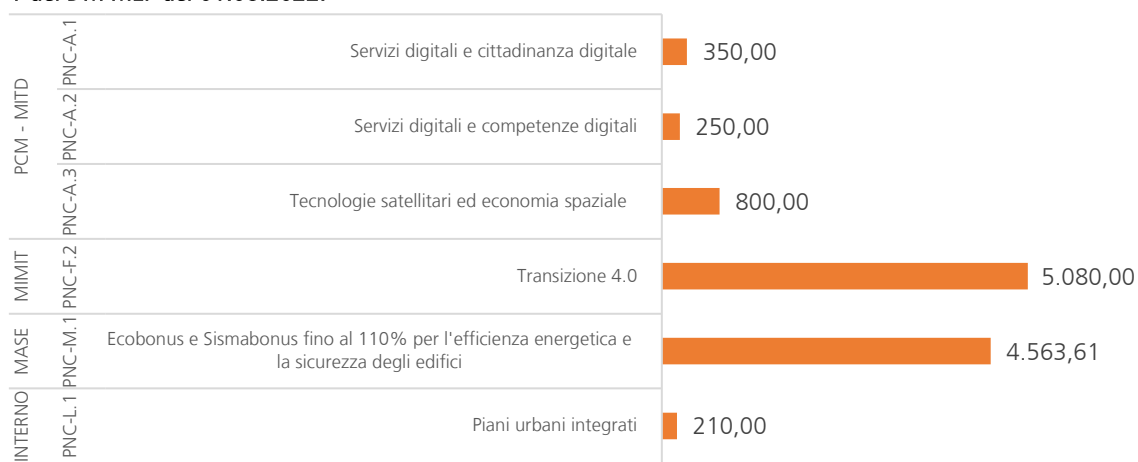

Il comma 7 dell'art. 1 del d.l. 59 del 2021 ha previsto per il relativo monitoraggio l'utilizzo del sistema ReGis, di cui all'art. 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020.

Il DM MEF 1° agosto 2022, che fissa gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi cofinanziati, prevede conseguentemente all'art. 4 comma 3, l'utilizzo di ReGis e l'applicazione della disciplina di cui al DPCM del 15 settembre 2021, che definisce modalità, tempistiche e strumenti per la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale per i progetti del PNRR.

Figura 7. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 01.08.2022.

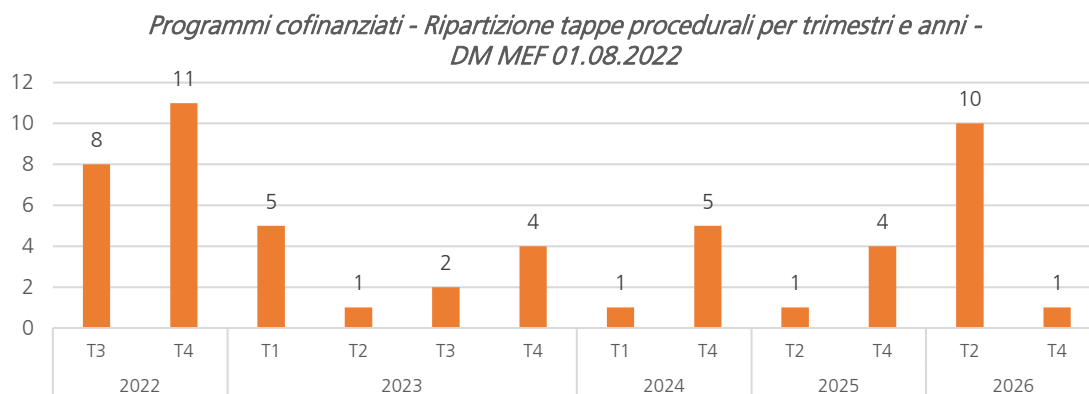

Sulla base delle informazioni disponibili, al 31 dicembre 2023 risultano 618 CUP (7 associati al programma PNC-A.3 per 597,2 milioni di euro e 611 associati al programma PNC-L.1 per 154,94 milioni di euro) per un totale complessivo di 752,14 milioni di euro, con una copertura di monitoraggio delle risorse finanziarie pari al 7%.

L'amministrazione cui è riconducibile il maggior numero di interventi risulta il Ministero dell'interno, con 611 CUP dislocati sull'intero territorio nazionale.

Sono, inoltre, in fase di caricamento ulteriori 14 CUP per il Programma "PNC-A.1. – Servizi digitali e cittadinanza digitale" (a titolarità della PCM – Dipartimento per la trasformazione digitale), per un ammontare complessivo pari ad euro 78,65 milioni di euro a valere sul PNC.

Alla scadenza del 31 dicembre 2023 (**T4 2023**), il DM MEF 1° agosto 2022 prevede 4 obiettivi. Si rinvia all'allegato n. 2 per il dettaglio.



## Allegato 1

### Programmi e interventi del PNC

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
<b>A.4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati urbani</b>	PCM: Min. affari europei, coesione e PNRR	350,00	Il trimestre 2023 Avvio dei lavori in tutti gli HUB.	Parzialmente conseguito. Sostanzialmente immutato il dato ricavabile da BDAP rispetto al trimestre precedente. Sottoscritte 18 convenzioni (con CUP) per complessivi 244,24 milioni di euro. Per circa il 60% dei 18 interventi è stato comunicato l'avvio dei lavori, mentre non risultano CIG per 7 interventi (per 90,18 milioni di euro). Non risultano invece stipulate convenzioni per un importo pari a 105,76 milioni di euro.	II/2026 Fine dei lavori
<b>B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016</b>					
B.1.1 - Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi	PCM: Commissario	1.080,00	<b>IV trimestre 2023</b> 25% dei SAL	<b>Parzialmente conseguito</b> Il Commissario ha comunicato che tutti gli interventi sono stati avviati e che sono stati	IV/2024 Ulteriore 50% dei SAL

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
	sisma 2016 Dip. "Casa Italia" Struttura di missione di sisma 2009.			trasferiti ai soggetti responsabili degli interventi complessivi 291,40 mln di euro (27% circa delle risorse) e sono stati liquidati SAL per 196,87 milioni di euro, pari al 18% delle risorse.  Si riscontrano tuttavia disallineamenti con la banca dati, nella quale 738 CUP (per un importo PNC pari a 545,89 milioni) su 848 totali risultano aver raggiunto o superato la fase di esecuzione lavori. Inoltre, in banca dati risultano erogazioni a SAL per 12,21 mln euro, associati a 72 CUP.	
B.1.2 - Rilancio economico e sociale		700,00	<b>IV trimestre 2023</b> Relazione da parte dei soggetti attuatori che attesti l'utilizzo di almeno il 25% del valore finanziario dei progetti/iniziativa	<b>Non conseguito</b> Il Commissario ha comunicato di aver trasferito ai Soggetti Gestori delle iniziative B1, B2 e B3 circa 153,65 mln di euro (22% del totale), di cui 19,02 milioni di euro poi erogati ai beneficiari delle agevolazioni (3% del totale).  Non risultano informazioni circa l'utilizzo delle risorse.  Infine, circa 55 mln di euro (8% del totale delle risorse), non risultano associati a specifici CUP (aggiornamento al decreto Commissariale n. 11 del 2024).	IV/2024 relazione da parte dei soggetti attuatori che attesti la realizzazione del 100% dei progetti/iniziativa individuati
C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	MIT	600,00	III trimestre 2022 Sottoscrizione dei	Conseguito. Nel sistema di monitoraggio BDAP risultano 68	IV/2024 50% di autobus

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			contratti.	progetti associati ad altrettanti CUP, per un valore complessivo di 600 milioni di euro.  L'Amministrazione ha confermato che, a seguito di una ricognizione extra-sistema, risultano stipulati al 31/12/2022 contratti per un totale di spesa contrattualizzata pari a euro 467,40 milioni di euro, al netto dei dati relativi alla Regione Calabria.	acquistati
<b>C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi</b>					
C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito:					
<i>C.2.1.1 - Upgrading nuove navi</i>	MIT	500,00	Il trimestre 2023 Sottoscrizione dei contratti	Parzialmente conseguito.  Rispetto agli 85 interventi originariamente individuati e a seguito delle rinunce dei beneficiari pervenute, risultano 44 CUP attivi cui è associato un finanziamento PNC pari a 52,47 milioni di euro. Non risultano assegnati 447,53 milioni di euro.  Per i 44 CUP citati sono stati sottoscritti i relativi contratti e l'importo PNC effettivamente concesso è pari a complessivi 49,90 milioni di euro (su 500 milioni di euro disponibili).	I/2025 Consegna del 50% delle unità
<i>C.2.1.2 - Retrofit Navi</i>					IV/2024 Consegna unità
C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni:					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
<i>C.2.2.1 - Acquisto navi</i>	MIT	60,00	III trimestre 2023 Avvio lavori di realizzazione prima Unità Navale Veloce	Non conseguito. L'amministrazione ha comunicato che, in virtù della propulsione GNL/Elettrica dei mezzi veloci, non risulta possibile procedere all'intervento a causa della mancata realizzazione del deposito costiero di rifornimento GNL del programma C.10.	III/2024 Conclusione lavori di realizzazione della prima unità veloce
<i>C.2.2.2 - Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave)</i>	MIT	20,00	Il trimestre 2022 Completamento Ibridizzazione Nave Iginia prima nave traghettamento treni	Conseguito. L'Amministrazione ha rappresentato che non risulta possibile il cofinanziamento della terza nave a propulsione a GNL, per la quale erano stati previsti 9 milioni di euro.	IV/2024 Ibridizzazione nave traghetto Messina in esercizio
<b>C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia:</b>					
<i>C.2.3.1 - Microliquefattori (130 mln)</i>	MIT	220,00	I trimestre 2023 Avvio dei lavori	Non conseguito. Rispetto ai 9 CUP iniziali, un CUP relativo all'intervento microliquefattori risulta cancellato; le risorse assegnate agli 8 CUP attivi sono pari a 74,85 milioni di euro di cui: - 45,72 milioni di euro per 6 CUP relativi all'intervento "microliquefattori"; - 29,13 milioni di euro per 2 CUP relativi all'intervento "navi bunkerine".	I/2026 Messa in esercizio microliquefattori
<i>C.2.3.2 - Navi bunkerine (90 mln)</i>					I/2025 Consegna navi

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				L'Amministrazione ha confermato che sono stati emessi 6 provvedimenti di concessione, di cui 5 relativi all'intervento microliquefattori, 1 relativo all'intervento navi bunkerine, impegnando complessivamente 63,36 milioni a fronte di 220 milioni di euro disponibili per la misura.	
<b>C.3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali</b>	MIT	1.550,00	Il trimestre 2023 Stipula contratti per il 100% dei lavori. Avvio del 100% dei lavori.	Parzialmente conseguito. Risultano 29 interventi associati ad altrettanti CUP per un valore complessivo pari al totale delle risorse previste, di cui 22 interventi per 1.101,74 milioni di euro relativi a lavori pubblici, la restante parte ad acquisto beni. Sulla base dell'ultima comunicazione dell'Amministrazione l'importo totale aggiudicato è pari a 1.542,45 milioni di euro e risultano avviati 5 interventi su 29.	II/2025 Completamento del 50% degli interventi
<b>C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci</b>					
<b>C.4.1 - Locomotori, carri e raccordi ferroviari</b>					
<i>C.4.1.1 - Locomotori e carri</i>	MIT	115,00	IV trimestre 2021 Notifica CE per autorizzazione (locomotori e carri)	Conseguito. Ai sensi dell'art. 1, comma 8, del d.l. 59/2021 i termini per il raggiungimento degli obiettivi sono sospesi dalla data di notificazione dell'intervento	I/2022 (posticipato al I/2024) Avvio della procedura di concessione dei

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				<p>alla CE fino alla data di notifica della decisione.</p> <p>L'Amministrazione ha comunicato che la decisione della Commissione Europea C(2023) 2973 dell'08/05/2023 è stata pubblicata a settembre 2023.</p>	contributi
<i>C.4.1.2 - Raccordi ferroviari</i>	MIT	30,00	<p>III trimestre 2023</p> <p>Trasferimento risorse a RFI per elettrificare i raccordi intermodali</p>	<p>Non conseguito</p> <p>Nel sistema di monitoraggio BDAP risultano 19 interventi associati ad altrettanti CUP, per un valore complessivo di 30 milioni di euro.</p> <p>Nonostante per 5 interventi risulti almeno una procedura affidata, l'Amministrazione ha comunicato che il soggetto attuatore non ha richiesto pagamenti.</p>	<p>IV/2024</p> <p>Conclusione primo step di lavori di elettrificazione raccordi alla rete RFI come individuato nel relativo contratto di programma.</p>
<b>C.4.2 - Mezzi intermodali</b>					
<i>C.4.2.1 - Locotrattori, transtainer, gru</i>	MIT	55,00	<p><b>IV trimestre 2023</b></p> <p>Consegna 50% transtainer e gru dal costruttore al beneficiario.</p>	<p><b>Parzialmente conseguito.</b></p> <p>Sono stati trasmessi 20 contratti associati a 21 interventi (su un totale di 36) per un finanziamento PNC di 35,85 milioni di euro.</p> <p>L'amministrazione ha altresì precisato che oltre ai transtainer, alle gru e ai locotrattori l'intervento prevede la consegna di reach-staker. Solo per questi ultimi sono state effettuate le consegne ai beneficiari, mentre per gli altri mezzi (ancora in</p>	<p>II/2024</p> <p>Consegna ulteriore 40% transtainer e gru dal costruttore al beneficiario</p>

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				costruzione) sono stati liquidati gli acconti previsti nei contratti.  Si rileva un disallineamento con i dati presenti in BDAP. In particolare, dalla banca dati emerge che su 36 CUP, 14 hanno gare avviate (di cui 5 con contratti stipulati).	
<b>C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)</b>					
C.5.1 - Ponti e viadotti	MIT	730,00 di cui: - 135,00 per monitoraggio dinamico; - 595,00 per interventi di adeguamento di ponti e viadotti	<b>IV trimestre 2023</b> 100 ponti e viadotti monitorati  Avvio della procedura di affidamento (interventi strutturali)	<b>Conseguito</b> Risultano avviate le procedure per l'affidamento per gli interventi strutturali sui ponti e viadotti.  Non conseguito L'obiettivo dei 100 ponti e viadotti monitorati, non risulta ancora conseguito. Risulta bandita ed aggiudicata la gara (accordo quadro) per l'installazione dei dispositivi di Smart Road e di monitoraggio delle infrastrutture. Tuttavia, si stanno concludendo le operazioni di validazione della progettazione esecutiva.  L'Amministrazione sta verificando le cause del disallineamento con il sistema di monitoraggio.	I/2024 Aggiudicazione del contratto (interventi strutturali)  135 ponti e viadotti monitorati
C.5.2 - Smart Road	MIT	120,00	III trimestre 2022	Si rinvia alle informazioni sopra riportate, tenuto conto che per l'intervento smart road è stato	IV/2024

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			Avvio dei lavori di installazione dispositivi per smart road	creato un unico CUP relativo anche al sistema di monitoraggio dinamico.	Attivazione dispositivi Smart road sulle prime tratte
C.5.3 - Traforo del Gran Sasso	MIT	150,00	Il trimestre 2023 Avvio dei lavori	Non conseguito. In BDAP non risultano pubblicate gare. L'amministrazione ha comunicato che il progetto deve ancora ottenere i pareri in Conferenza dei Servizi e che i ritardi sono da ascrivere al tentativo – senza esito – di unificare gli interventi in questione con gli interventi affidati al Commissario per la messa in sicurezza del bacino idrico del Gran Sasso.  Allo stato è stato solo individuato uno stralcio funzionale per i primi lavori di sistemazione tecnologica.	IV/2025 Collaudo / messa in esercizio
C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale	MIT	450,00	<b>IV trimestre 2023</b> Installazione dei sistemi di monitoraggio tecnologico e pianificazione delle priorità	<b>Non conseguito.</b> I dati del sistema di monitoraggio evidenziano una procedura di affidamento avviata per 58 interventi su 60, cui corrisponde un finanziamento PNC di 173,76 milioni di euro; per 44 CUP (159,49 milioni) risulta almeno una aggiudicazione.  Da un'analisi sul tipo di CIG (fornitura, lavori,	II/2024 Avvio della piattaforma tecnologica integrata messa a disposizione degli operatori e progressiva implementazione dinamica della stessa,



Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				<p>servizi) emerge il seguente quadro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- su 19 CUP per lavori (31,45 milioni di euro), per 12 CUP (15,75 milioni di euro PNC associati) risulta una procedura non per lavori;</li> <li>- su 41 CUP per servizi (per un finanziamento PNC pari a 418,55 milioni di euro), 2 CUP (276,23 milioni di euro PNC associati) non risultano aver avviato alcuna procedura. Tuttavia, per uno di questi (finanziamento PNC pari a 275,47 milioni di euro) il soggetto attuatore ha comunicato che sono state bandite e aggiudicate tutte le procedure di gara, con relativi lavori e servizi attualmente in svolgimento.</li> </ul> <p>Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di monitoraggio.</p>	sulla base dei dati raccolti e delle evidenziate priorità di intervento
<b>C.7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici</b>	MIT	1.470,00	<b>IV trimestre 2023</b> Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere / esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema	<b>Parzialmente conseguito</b> Per 6 interventi su 7 previsti l'obiettivo risulta raggiunto. L'amministrazione ha confermato che per un CUP, cui è associato un finanziamento PNC di <b>20 milioni di euro</b> , non sono state pubblicate gare. Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di	I/2024 Avvio del 80% dei lavori

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				monitoraggio.	
<b>C.8 - Aumento selettivo della capacità portuale</b>	MIT	390,00	<b>IV trimestre 2023</b> Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere / esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema	<b>Conseguito</b> L'amministrazione ha comunicato che tutti i 7 interventi hanno raggiunto l'obiettivo. Tuttavia, si riscontrano disallineamenti con il sistema di monitoraggio dove non risulta la pubblicazione del bando di gara lavori relativo a un intervento.	I/2024 Avvio del 100% dei lavori
<b>C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale</b>	MIT	250,00	<b>IV trimestre 2023</b> Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere / esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema	<b>Parzialmente conseguito.</b> Per 2 interventi, cui è associato un finanziamento PNC complessivo di 190 milioni di euro, su 7 non risulta raggiunto l'obiettivo. Inoltre, per 1 intervento, cui è associato un finanziamento PNC di 10 milioni di euro, non risultano gare pubblicate. Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di monitoraggio.	I/2024 Avvio del 100% dei lavori
<b>C.10 - Efficientamento energetico</b>	MIT	50,00	II trimestre 2023 Avvio lavori	Parzialmente conseguito. Non si registrano variazioni rispetto al trimestre precedente. Per uno dei due progetti sono stati avviati i lavori mentre per l'altro, a causa del ritiro	II/2025 Realizzazione di un deposito costiero di GNL

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				dell'unica candidatura pervenuta (procedura ex art. 183, c. 15, d. lgs. n. 50/2016), l'Amministrazione ha comunicato che l'Autorità portuale competente ha deciso di chiudere il procedimento, rinunciando a realizzare l'intervento, cui è associato un finanziamento PNC pari a <b>30 milioni di euro</b> .	Realizzazione di banchine elettrificate nei quattro porti dell'AdSP dello Stretto
<b>C.11 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)</b>	MIT	700,00	III trimestre 2023 Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori.	Conseguito. L'Amministrazione ha comunicato che 2 interventi su 46 non presentano gare d'appalto per lavori, per un totale di <b>33,5 milioni di euro</b> . In BDAP, invece, risultano pubblicate gare per lavori per 39 CUP su 46. Di questi: - 6 CUP (finanziamento PNC pari a 113,7 mln di euro) hanno almeno una gara servizi associata; - 1 CUP (finanziamento PNC pari a 1,5 mln di euro) non presenta alcun CIG. Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di monitoraggio.	I/2024 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema.
<b>C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne</b>	MIT	300,00	Il trimestre 2023 Avvio dei lavori.	Non conseguito. Nel sistema di monitoraggio per 491 interventi non si hanno informazioni sull'ultima fase	I/2026 Conclusione dei lavori/collauda

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				<p>procedurale effettiva, mentre per 256 interventi tali informazioni sono presenti ed emerge che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 20 interventi risultano chiusi,</li> <li>- 62 interventi sono in fase di esecuzione lavori,</li> <li>- 49 interventi sono in fase di collaudo,</li> <li>- 103 interventi sono in fase di progettazione (vari livelli) e 6 in fase di Funzionalità.</li> </ul> <p>Pertanto, per 137 interventi risulta raggiunta o superata la fase esecuzione lavori.</p> <p>Inoltre, risultano CIG per 310 interventi per un finanziamento PNC di circa 128,38 milioni di euro.</p>	interventi su 2.000 km di strade
<b>C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica</b>	MIT	2.000,00	Il trimestre 2023 Consegna/Avvio dei lavori.	<p>Conseguito.</p> <p>Sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, l'obiettivo è raggiunto per 911 interventi su 989; non sono stati avviati 74 interventi per un finanziamento PNC di 110,24 milioni di euro.</p> <p>Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di monitoraggio.</p>	IV/2024 Realizzazione del 50% dei lavori
<b>D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici</b>	MIC	1.455,24	<b>IV trimestre 2023</b> Aggiudicazione di tutte le gare	<p>Conseguito.</p> <p>Sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione, sono state aggiudicate</p>	I/2024 Avvio lavori per tutti gli interventi.

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
<b>e aree naturali</b>				gare per circa il 95% dell'importo complessivo. Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di monitoraggio.	
<b>E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima</b>					
E.1.1 – Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata	SALUTE	415,38	<b>IV trimestre 2023</b> Pubblicazione bando per 10% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali.	<b>Conseguito</b> Le risorse sono state integralmente assegnate ai soggetti attuatori come di seguito specificato: - ISPRA: 619.522,00 euro - ISS: 34.650.915,00 euro - Ministero Salute: 1.866.435,00 euro - Regioni e PA: 378.192.706,00 euro  per un totale complessivo di euro 415.329.578,00. L'amministrazione ha in proposito comunicato che:  - l'ISPRA e il Ministero hanno rispettivamente rendicontato l'utilizzo del 100% e del 70% delle risorse assegnate ed erogate; - per regioni e PA risultano erogate le prime due <i>tranche</i> (2022 e 2023), su 5 previste, per un ammontare di circa 163 milioni di euro (il 43% dell'assegnato). I soggetti attuatori hanno rendicontato l'utilizzo del	I/2024 Aggiudicazione per 10% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali.

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				78% di quanto loro trasferito e l'importo rendicontato è pari al 35% del totale; - l'ISS ha utilizzato l'1% delle risorse assegnate.	
E.1.2 - Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale	SALUTE	49,50	<b>IV trimestre 2023</b> Pubblicazione bando e aggiudicazione	<b>Conseguito.</b> L'Amministrazione ha comunicato che sono stati registrati dalla Corte dei conti gli accordi sottoscritti tra il Ministero della salute, la Regione Puglia e AReSS Puglia e con la Regione del Veneto che disciplinano le attività previste nei due modelli di intervento.	I/2024 Avvio interventi con prima quota finanziamenti per i soggetti attuatori pari al 25% dei fondi totali disponibili per l'intero programma.
E.1.3 - Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima	SALUTE	6,12	<b>IV trimestre 2023</b> Fase esecutiva - Acquisizione e rinnovamento infrastrutturale, di strumentazioni gestionali, piattaforme informatiche e sistemi qualità presso il centro di formazione Salute,	<b>Conseguito</b> L'ISS ha aderito al PSN. È stato stipulato un contratto per l'importo complessivo dell'investimento finalizzato alla realizzazione della Piattaforma informativa sanitaria ISS.	II/2024 Provvedimento adozione Piano di formazione - progettazione corsi di formazione FAD

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			Ambiente e Clima presso l'ISS		
E.1.4 - Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima	SALUTE	21,00	IV trimestre 2022 Avvio interventi	Conseguito.	IV/2026 Almeno 14 programmi attivati di promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima.
E.1.5 - Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS	SALUTE	8,00	<b>IV trimestre 2023</b> Aggiudicazione delle procedure pubbliche di procurement riferite alla Piattaforma digitale nazionale	<b>Conseguito.</b> L'ISS ha stipulato con l'Università La Sapienza di Roma un contratto per la realizzazione della piattaforma IDEAH (Integrated Database for Environment and Health) nell'ambito del Polo Strategico Nazionale (PSN) per 5 milioni di euro. Il d.lgs. 18 del 2023 con l'art. 19 ha disposto la realizzazione della piattaforma digitale AnTeA per 2,5 milioni di euro a valere sulle risorse PNC. Sulla BDAP risultano affidamenti per 8 milioni di euro.	I/2024 Avvio interventi

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
E.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile	SALUTE	1.450,00	<b>IV trimestre 2023</b> Avvio dei lavori da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn	<b>Parzialmente conseguito</b> Sono stati sottoscritti 179 contratti su 215 previsti ma non sono stati forniti dati sui lavori avviati. Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di monitoraggio.	IV/2026 Ultimazione dei lavori - Completamento degli interventi di adeguamento nel rispetto delle normative antisismiche
E.3 - Ecosistema innovativo della salute	SALUTE	437,40	<b>IV trimestre 2023</b> Monitoraggio stato di attuazione previsto negli atti formali (convenzioni e/o accordi), rendicontazione, verifica dello stato di avanzamento del progetto - pagamento 2° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 20% dei fondi totali disponibili per l'intero programma salvo residui anno	<b>Conseguito.</b> Al 31 dicembre 2023 risultano trasferiti ai soggetti attuatori 175,27 milioni di euro, pari al 40% dei fondi totali disponibili per l'intero programma. Di questi, 135,28 milioni di euro risultano trasferiti al Biotecnopolo di Siena, ma risultano allo stato non utilizzati.	IV/2024 monitoraggio stato di attuazione previsto negli atti formali (convenzioni e/o accordi), rendicontazione, verifica dello stato di avanzamento del progetto - pagamento 3° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 15% dei fondi totali disponibili per l'intero programma salvo residui anni precedenti



Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			precedente		
F.1 - "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	MIMIT	800,00	<b>IV trimestre 2023</b> Realizzazione di interventi su almeno 1.500 UP; Collaudo 150 interventi di coworking ed attività educative	<b>Parzialmente conseguito.</b> L'amministrazione ha comunicato che risultano realizzati: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 945 Uffici postali su 1500 in relazione all'investimento "Sportello Unico";</li> <li>- 31 interventi immobiliari sui 150 siti interessati in relazione all'investimento Spazi per l'Italia.</li> </ul> Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di monitoraggio.	IV/2024 Collaudo interventi di realizzazione dei 250 spazi per il coworking e le attività educative Realizzazione di interventi su almeno 2.800 UP.
F.3 - Accordi per l'Innovazione	MIMIT	1.000,00	<b>IV trimestre 2023</b> Erogazione di almeno il 5% delle risorse complessive stanziare	<b>Parzialmente conseguito</b> Sono stati emanati 238 decreti di concessione per un valore complessivo di circa 956,44 milioni di euro e l'amministrazione ha comunicato di aver erogato risorse per circa 16,38 milioni di euro complessivi, pari all'1,6% del totale; tale ultimo dato non risulta ancora riscontrabile su BDAP.	IV/2024 Erogazione di almeno il 35 % delle risorse complessive stanziare.
<b>G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori</b>					
G.1.1 - Miglioramento degli	GIUSTIZIA	84,00	<b>IV trimestre 2023</b>	<b>Parzialmente conseguito.</b>	I/2024

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni "modello" per detenuti adulti			75% stipula contratto d'appalto	Sulla base dell'ultima comunicazione dell'amministrazione e da verifiche documentali risulta: - per 4 interventi su 8 la stipula del contratto (50%); - per tutti gli interventi l'aggiudicazione definitiva. Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di monitoraggio.	Avvio dei lavori per il 50% degli interventi previsti
G.1.2 - Adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni	GIUSTIZIA	48,90	<b>IV trimestre 2023</b> 100% stipula contratto d'appalto	<b>Non conseguito.</b> Dai dati forniti dall'amministrazione 2 interventi su 4 hanno raggiunto la fase di aggiudicazione definitiva (50%), di cui per 1 intervento risulta stipulato un contratto di lavori (25%). I CUP per cui non risulta pubblicato il bando hanno rispettivamente un finanziamento PNC di 25 milioni di euro e 9,8 milioni di euro. Per i 2 interventi è stato tuttavia affidato un appalto per progettazione, anche esecutiva, per circa 1 milione di euro nonché due incarichi per circa 500 mila euro. Si riscontrano in ogni caso disallineamenti rispetto alle risultanze del sistema di	I/2024 Avvio dei lavori per il 75% degli interventi previsti

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Ultimo obiettivo e relativo trimestre	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				monitoraggio.	
H.1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	MASAF	1.203,30	Il trimestre 2023 Approvazione delle graduatorie finali per la concessione degli aiuti finanziari altri settori; Numero di nuovi contratti per la filiera e di distretto firmati [obiettivo unico per tutti i settori]: 46	Parzialmente conseguito. A fronte dell'obiettivo di 46 contratti, allo stato, l'amministrazione ha comunicato di aver sottoscritto: - 15 contratti di distretto; - 20 contratti di filiera a valere sullo scorrimento del IV bando. I contratti non sono stati trasmessi.	Nessun ulteriore adempimento.
I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	MUR	500,00	<b>IV trimestre 2023</b> Decreto di ammissione al finanziamento dei progetti selezionati e avvio dei progetti per la seconda finestra del primo bando.	<b>Conseguito</b> Il Programma è in linea con le scadenze, tenuto conto che sono stati già adottati i decreti di ammissione al finanziamento per le quattro iniziative selezionate.	III/2024 Predisposizione del secondo bando (in tre finestre) e relativa pubblicazione; Apertura della prima finestra del secondo bando.



## Allegato 2

### Programmi e interventi cofinanziati

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Importo (mln euro)	Trimestre di riferimento	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
A.1 - Servizi digitali e cittadinanza digitale	350,00	<b>IV trimestre 2023</b> Relazione conclusiva della digitalizzazione dei pagamenti della PA. Registrazione di eventuali contratti di supporto specialistico per le attività di dematerializzazione archivi cartacei. Relazione conclusiva del rafforzamento ANPR per la gestione degli atti di stato civile e la digitalizzazione della tessera elettorale.	<b>Non conseguiti.</b> E' stata stipulata in data 22/12/2022 la Convenzione con PagoPA. La Convenzione si è conclusa in data 31/12/2023 e si è in attesa della relazione finale da parte del soggetto realizzatore. Non risultano ulteriori elementi.	IV/2024 Relazione conclusiva del progetto per il potenziamento della PDND sia per le imprese che per gli enti fruitori Relazione conclusiva del progetto per la dematerializzazione Tessera Sanitaria TS/TEAM
A.2 - Servizi digitali e competenze digitali	250,00	<b>IV trimestre 2023</b> Primo obiettivo quantitativo	<b>Conseguito.</b> L'obiettivo, consistente nella pubblicazione di	

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Importo (mln euro)	Trimestre di riferimento	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
		fissato con delibera del CSI raggiunto	un bando per ciascuno dei 4 ambiti di intervento del fondo (upskilling e reskilling digitale dei NEET, di donne e ragazze, di disoccupati e inattivi sopra i 34 anni, di lavoratori a forte rischio di sostituibilità), risulta conseguito.	
<b>A.3 - Tecnologie spaziali ed economia satellitare</b>				
A.3.1 - Satcom	110,00	I trimestre 2023 M1C2-22	L'obiettivo risulta conseguito alla luce della rendicontazione del corrispondente obiettivo PNRR sulla base dei dati presenti sul sistema di monitoraggio Regis.	II/2026 M1C2-24
A.3.2 - Osservazione della Terra	430,00	I trimestre 2023 M1C2-22		II/2026 M1C2-24
A.3.3 - Space Factory	100,00	I trimestre 2023 M1C2-22		II/2026 M1C2-00-ITA-32 M1C2-23
A.3.4 - In-Orbit Economy	160,00	I trimestre 2023 M1C2-22		II/2026 M1C2-23
<b>F.2 – Transizione 4.0</b>	5.080,00	I trimestre 2023 estrazione dati da Agenzia delle Entrate dalle dichiarazioni dei redditi 2021 ed invio al MIMIT.	Dai dati presenti sul sistema di monitoraggio Regis l'obiettivo risulta conseguito.	I/2024 Estrazione dati da Agenzia delle Entrate dalle dichiarazioni dei redditi 2022 ed invio al

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Importo (mln euro)	Trimestre di riferimento	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				MIMIT
L.1 – Piani urbani integrati	210,00	III trimestre 2023 Aggiudicazione di lavori pubblici da parte dei soggetti attuatori	<p>Parzialmente conseguito.</p> <p>A seguito dell'assegnazione delle risorse ai soggetti attuatori, con decreto direttoriale MINT del 26 giugno 2023 le risorse PNRR e PNC sono state ripartite a livello di CUP, e in totale sono stati individuati 608 CUP. Inoltre, con decreto MINT del 3 luglio 2023 sono stati individuati n. 3 CUP integralmente finanziati dal PNC.</p> <p>Per 260 CUP si è fatto ricorso alla Centrale di Committenza di Invitalia S.p.A., che ha già aggiudicato le procedure di gara con appositi accordi quadro multilaterali per lavori e appalti integrati.</p> <p>Alla data del 31 dicembre 2023 n. 115 CUP hanno staccato gli ODA (Lavori e/o Appalto Integrato). Inoltre, per i CUP che hanno fatto ricorso alla richiamata Centrale per altri lotti prestazionali, si rilevano n. 128 Ordinativi di Acquisto (Progettazione), n. 190 Ordinativi di Acquisto (Verifica di Progettazione).</p> <p>Per altri 230 progetti-CUP risultano invece aggiudicazioni o stipule.</p> <p>I restanti 121 CUP non presentano le informazioni necessarie sullo stato di</p>	IV/2024 30% di somme erogate rispetto al totale delle risorse assegnate (2.703.790.000 €)

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Importo (mln euro)	Trimestre di riferimento	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			attuazione oppure hanno comunicato la sola fase di pubblicazione del bando di gara.	
<b>M.1 - Ecobonus e sismabonus fino al 110% per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici</b>	4.563,61	Il trimestre 2023 M2C3-2	L'obiettivo risulta conseguito alla luce della rendicontazione del corrispondente obiettivo PNRR sulla base dei dati presenti sul sistema di monitoraggio Regis.	IV/2025 M2C3-3





