



Garantire la corretta programmazione  
e la rigorosa gestione  
delle risorse pubbliche

# PNC

## Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

*Report n. 8: adempimenti e attività al 30 giugno 2023*

2021  
2022  
**2023**  
2024





***MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE***  
***DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO***

# **Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR**

**Report n. 8: adempimenti e attività al 30 giugno 2023**



# INDICE

CAPITOLO 1 - Quadro introduttivo .....	1
CAPITOLO 2 - I dati di monitoraggio .....	3
CAPITOLO 3 - Dettaglio sullo stato degli obiettivi del II trimestre 2023 .....	5
CAPITOLO 4 - Ripartizione territoriale delle risorse aggiornata al 30 giugno 2023 .....	7
CAPITOLO 5 - Il Fondo opere indifferibili per il PNC .....	9
Allegato 1 .....	10
Programmi e interventi del PNC .....	10
<b>Programma/investimento/ intervento</b> .....	10
A.4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati .....	10
B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 .....	10
C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus .....	11
C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi .....	11
C.3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali .....	13
C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci .....	14
C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) .....	15
C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale .....	16
C.7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici .....	16
C.8 - Aumento selettivo della capacità portuale .....	17
C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale .....	17
C.10 - Efficientamento energetico .....	17
C.11 - Elettificazione delle banchine (Cold ironing) .....	18
C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne .....	18
C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica .....	19
D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali .....	19
E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima .....	20
E.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile .....	22
E.3 - Ecosistema innovativo della salute .....	22
F.1 - "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale .....	23

F.3 - Accordi per l'Innovazione.....	23
G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori.....	24
H.1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo.....	24
I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale .....	25

## CAPITOLO 1 - Quadro introduttivo

I 30 programmi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, sono destinatari di risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, e sono ripartiti in 24 programmi "del Piano" (c.d. esclusivi), per un importo di 19.368,85 milioni di euro e 6 programmi "cofinanziati" PNRR-PNC, per un importo di 11.253,61 milioni di euro.

Come noto, in attuazione dell'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge 59 del 2021, gli obiettivi e la disciplina attuativa dei programmi del PNC sono contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021 (Programmi del Piano) e nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° agosto 2022 (Programmi cofinanziati).

Il presente report riporta lo stato di avanzamento degli obiettivi e degli adempimenti relativi al secondo trimestre 2023 per i programmi "del Piano"; per i programmi che non presentano obiettivi per tale trimestre, il report fornisce un aggiornamento sull'avanzamento rispetto all'obiettivo immediatamente precedente.

Va segnalato, preliminarmente che l'articolo 7, comma 1, del d.l. 13 del 2023 ha previsto un aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali di cui all'allegato 1 del DM MEF 15 luglio 2021, da attuare con decreto MEF di concerto con l'Autorità politica delegata in materia di PNRR "ferma restando la necessità che siano assicurati il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC.[...]"

A seguito del confronto con le Amministrazioni titolari, è stato quindi predisposto uno schema di decreto con i cronoprogrammi aggiornati, tuttora in corso di esame da parte dell'amministrazione concertante.

Conseguentemente, in assenza di un cronoprogramma aggiornato, gli obiettivi di riferimento rimangono quelli individuati nell'Allegato 1 al decreto MEF del 15 luglio 2021. I dati evidenziano, rispetto alla situazione registrata nei trimestri precedenti, un maggiore ritardo nel rispetto delle scadenze.

Con riferimento invece ai programmi c.d. "cofinanziati", si segnala che il relativo monitoraggio è in corso di attivazione attraverso nuove funzionalità del sistema di monitoraggio del PNRR (REGIS), e in virtù delle peculiarità amministrative e gestionali che caratterizzano tali interventi, sono state effettuate interlocuzioni con le Amministrazioni titolari volte a implementare il corredo informativo dei singoli progetti, con l'obiettivo di fornire a partire dal report relativo al III trimestre 2023 anche le informazioni relative all'andamento di tali programmi.





## CAPITOLO 2 - I dati di monitoraggio

I 24 programmi “del Piano”, di cui al DM MEF 15 luglio 2021, ammontano complessivamente a 19.368,85 milioni di euro.

A marzo 2023 il sistema di monitoraggio censiva 3.713 interventi identificati da codice unico di progetto (CUP) con associato un finanziamento di circa 15,47 miliardi di euro. Al 30 giugno 2023, risultano invece censiti a sistema 4.008 interventi (con un incremento rispetto al trimestre precedente di circa l'8%) ai quali risulta associato un finanziamento complessivo a carico del PNC di circa 16,25 miliardi (aumento pari al 5% rispetto al trimestre precedente). L'amministrazione cui è riconducibile il maggior numero di interventi risulta il MIT, con oltre duemila CUP dislocati sull'intero territorio nazionale.

La disponibilità di dati accurati e aggiornati automaticamente si fonda sull'interoperabilità del sistema con altre banche dati o sistemi (ad esempio ANAC per le gare e SIOPE+ per i pagamenti) che raccolgono le informazioni durante la normale attività amministrativa dei soggetti attuatori nel rispetto del principio di unicità dell'invio – peraltro rafforzato nel nuovo codice dei contratti - e senza un incremento dei costi amministrativi. In tal modo, la disponibilità di dati certi e automatici semplifica l'analisi e la valutazione delle performance degli investimenti favorendo altresì la tracciabilità ed evitando duplicazioni.

Il monitoraggio che produce automaticamente i dati incrociando vari sistemi costituirebbe in effetti un elemento essenziale dell'obiettivo di garantire il buon andamento e la trasparenza del PNC ed è di utilità sia per l'Amministrazione centrale titolare dei programmi che per i soggetti attuatori.

In tal senso proprio per favorire una corretta implementazione dei sistemi le Amministrazioni centrali e i soggetti attuatori hanno ricevuto un supporto mirato, che ha abbracciato un'ampia gamma di attività finalizzate a fornire strumenti ed assistenza tecnica e a sviluppare le relative capacità operative.

Ciò premesso, deve tuttavia segnalarsi che è stato rilevato un basso livello di alimentazione dei dati presenti nel sistema di monitoraggio, dovuto al non corretto adempimento da parte dei soggetti attuatori titolari dei CUP dell'obbligo di alimentazione dei sistemi, nonostante i solleciti inviati da alcune Amministrazioni titolari per i programmi di rispettiva competenza, e ai fini della presente verifica sul raggiungimento degli obiettivi previsti, si è reso necessario attivare un confronto serrato con le singole Amministrazioni sulle risultanze del sistema informativo, anche attraverso un'analisi incrociata dei dati e la richiesta di supporti documentali.


L'aggiornamento del presente report, conseguentemente, è stato predisposto sulla base dei dati comunicati dalle Amministrazioni, seppur deve segnalarsi che per tre programmi (C.5- Strade sicure A24-A25, C.6 Strade sicure rete viaria principale e C.12 Strategia nazionale aree interne) l'Amministrazione titolare non ha fornito riscontro alle richieste di elementi informativi, per cui i dati rappresentati sono stati elaborati esclusivamente sulla base di quanto ricavabile dai sistemi di monitoraggio RGS (BDAP-MOP). Analogamente anche per l'investimento 1.1 del programma E.1- salute, ambiente,

biodiversità e clima i dati riportati sono quelli ricavati dal sistema di monitoraggio, in quanto i dati trasmessi sull'avanzamento dell'investimento non hanno consentito un puntuale riscontro rispetto agli obiettivi previsti dal DM MEF 15 luglio 2021.

## CAPITOLO 3 - Dettaglio sullo stato degli obiettivi del II trimestre 2023


Alla scadenza del 30 giugno 2023 (T2 2023), il DM MEF 15 luglio 2021 prevede 23 obiettivi ripartiti tra le diverse Amministrazioni come rappresentato nella figura 1.

Figura 1. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021.

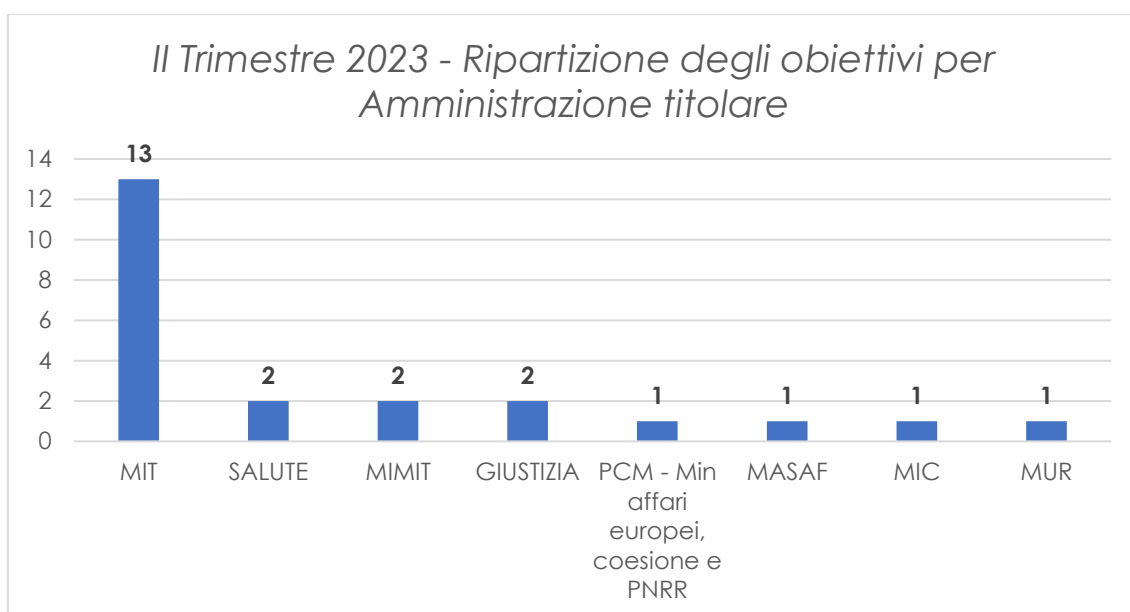

In via generale si evidenzia, rispetto alla situazione registrata nei trimestri precedenti, un maggiore ritardo nel rispetto delle scadenze. Il 39% degli obiettivi del II trimestre 2023, infatti, risulta non conseguito. Di seguito la rappresentazione grafica.

Figura 2. Fonte: elaborazione RGS-IGAE dei dati delle schede progetto di cui all'allegato 1 del DM MEF del 15.07.2021, dei dati presenti in BDAP e delle informazioni trasmesse dalle Amministrazioni.

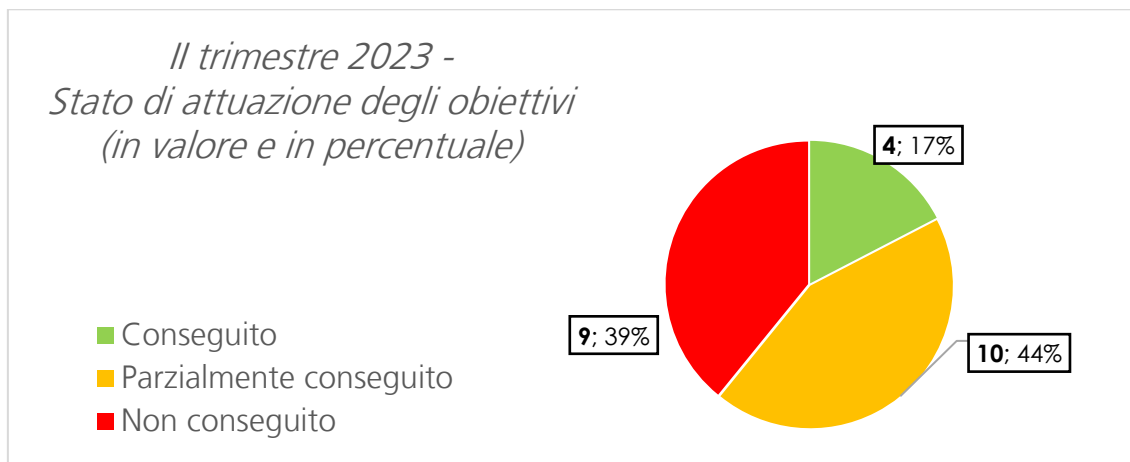



## CAPITOLO 4 - Ripartizione territoriale delle risorse aggiornata al 30 giugno 2023

Si riporta di seguito un aggiornamento della distribuzione regionale delle risorse relative ai programmi indicati nel DM MEF del 15 luglio 2021 (circa 19,37 miliardi di euro) sulla base dei dati presenti nel sistema di monitoraggio. Risultano assegnate a specifici progetti identificati da CUP risorse per circa 16,25 miliardi di euro (inclusi gli interventi localizzati su più Regioni), al netto di circa 3,12 miliardi di euro il cui iter di ripartizione non è ancora concluso o che per loro destinazione non sono ex ante territorialmente ripartibili.

Rappresentazione grafica della ripartizione a livello regionale delle risorse dei Programmi di cui al DM MEF del 15 luglio 2021 in mln €



Con tecnologia Bing  
© GeoNames, Microsoft, TomTom

<b>Regioni</b>	<b>Importo (in mln di euro)</b>
Abruzzo	1.316
Basilicata	136
Calabria	586
Campania	1.791
Emilia-Romagna	608
Friuli-Venezia Giulia	578
Lazio	1.486
Liguria	852
Lombardia	880
Marche	513
Molise	94
Piemonte	442
Puglia	908
Sardegna	539
Sicilia	1.147
Toscana	803
Trentino-Alto Adige	82
Umbria	185
Valle d'Aosta	22
Veneto	682
<b>Totale risorse ripartite tra le Regioni</b>	<b>13.649</b>
<b>% risorse ripartite localizzate al SUD</b>	<b>47,7%</b>
Interventi localizzati su più Regioni	2.603
Altri interventi da ripartire/non ripartibili	3.117
<b>Totale DM MEF 15 luglio 2021</b>	<b>19.369</b>

## CAPITOLO 5 - Il Fondo opere indifferibili per il PNC

Come segnalato nei precedenti report, per fronteggiare gli incrementi dei costi dei materiali da costruzione l'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 50 del 2022 ha istituito il Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, successivamente rifinanziato anche dalla legge di bilancio per il 2023.

Le risorse sono state assegnate, nel corso del 2022 e del 2023, con specifici provvedimenti del Ragioniere Generale dello Stato, che si riportano di seguito:

- ✓ Decreto R.G.S. 52 del 2 marzo 2023 - Assegnazione definitiva per interventi PNC FOI 2022;
- ✓ Decreto R.G.S. del 28 marzo 2023 - Procedura di Recupero 2022;
- ✓ Decreto R.G.S. 124 del 13 marzo 2023 - Procedura Semplificata I semestre 2023;
- ✓ Decreto R.G.S. 154 del 19 maggio 2023 - Procedura Ordinaria I semestre 2023;
- ✓ Decreto R.G.S. 175 del 11 luglio 2023 - Procedura Semplificata II semestre 2023.

Si precisa che le risorse del FOI 2023 sono da confermare in esito alla verifica dell'avvenuto avvio delle procedure di riferimento. Di seguito un riepilogo delle risorse assegnate:

Programma PNC	FOI 2022			FOI 2023		TOTALE COMPLESSIVO
	ORDINARIA	RECUPERO	SEMPLIFICATA	ORDINARIA	SEMPLIFICATA	
	<b>363.811.556,93 €</b>	<b>28.080.368,00 €</b>	<b>181.342.124,25 €</b>	<b>229.151.554,63 €</b>	<b>17.609.305,17 €</b>	<b>819.994.908,98 €</b>
PNC-B.1	93.526.903,44 €	11.398.264,30 €	48.320.281,19 €	151.295.803,77 €	959.082,35 €	305.500.335,05 €
PNC-C.3	7.933.230,17 €					7.933.230,17 €
PNC-C.7	59.347.195,35 €			55.798.813,43 €		115.146.008,78 €
PNC-C.9	4.137.000,00 €			11.786.581,63 €		15.923.581,63 €
PNC-C.11	2.416.266,18 €			1.552.315,96 €		3.968.582,14 €
PNC-C.12			4.751.525,01 €		8.534.055,01 €	13.285.580,02 €
PNC-C.13	108.941.115,45 €	16.682.103,70 €	41.525.318,06 €	1.098.683,22 €	7.176.167,81 €	175.423.388,24 €
PNC-D.1			86.744.999,99 €		940.000,00 €	87.684.999,99 €
PNC-E.1	442.580,80 €					442.580,80 €
PNC-E.2	75.227.265,54 €					75.227.265,54 €
PNC-G.1	11.840.000,00 €			7.619.356,62 €		19.459.356,62 €

## Allegato 1

### Programmi e interventi del PNC

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
<b>A.4 - Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti marginalizzati urbani</b>	PCM: Min. affari europei, coesione e PNRR	350,00	<b>Il trimestre 2023</b> Avvio dei lavori in tutti gli HUB.	<b>Parzialmente conseguito</b> Sono state sottoscritte 18 convenzioni per complessivi 244,24 milioni di euro. Per circa il 60% dei 18 interventi identificati da CUP è stato comunicato l'avvio dei lavori.	II/2026 Fine dei lavori
<b>B.1 - Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016</b>					
<b>B.1.1 - Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi</b>	PCM: Commissario sisma 2016 Dip. "Casa Italia" Struttura di missione sisma	1.080,00	<b>IV trimestre 2022</b> Aggiudicazione e avvio dei lavori. <b>Il trimestre 2023</b> Nessun adempimento previsto.	Il precedente obiettivo risulta ancora parzialmente conseguito. Su 823 interventi con CUP sono avviati (in alcuni casi anche conclusi) lavori per 644 progetti, pari al 78% del totale.	IV/2023 25% dei SAL



Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
B.1.2 - Rilancio economico e sociale	2009.	700,00	<p><b>IV trimestre 2022</b></p> <p>Approvazione da parte dei soggetti attuatori delle istanze presentate e concessione dei finanziamenti.</p> <p><b>Il trimestre 2023</b></p> <p>Nessun adempimento previsto.</p>	<p>Il precedente obiettivo risulta parzialmente conseguito.</p> <p>Assegnati 105 mln a specifici progetti individuati da CUP.</p> <p>Per ulteriori 350 mln sono stati adottati gli elenchi di contributi concedibili/ progetti finanziabili, con n. 11 ordinanze del 2023, relative alle misure B1, B2 e B3.</p> <p>L'amministrazione ha riferito che sono in corso di adozione ulteriori provvedimenti per l'assegnazione della totalità delle risorse.</p>	<p>IV/2023</p> <p>Relazione da parte dei soggetti attuatori che attesti l'utilizzo di almeno il 25% del valore finanziario dei progetti/iniziative</p>
C.1 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	MIT	600,00	<p><b>III trimestre 2022</b></p> <p>Sottoscrizione dei contratti.</p> <p><b>Il trimestre 2023</b></p> <p>Nessun adempimento previsto.</p>	<p>Il precedente obiettivo risulta parzialmente conseguito.</p> <p>Su 66 interventi associati ad altrettanti CUP risultano contratti firmati o affidamenti diretti per 49 interventi, per un importo di circa 450 mln di euro.</p>	<p>IV/2024</p> <p>50% di autobus acquistati</p>
<b>C.2 - Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi</b>					

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.2.1 - Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito:					
<i>C.2.1.1 - Upgrading nuove navi</i>	MIT	500,00	<b>Il trimestre 2023</b> Sottoscrizione dei contratti	<b>Non conseguito.</b> Sono stati individuati 85 progetti, identificati da CUP, per un importo totale di 161,2 milioni di euro, Di questi:  - 59 progetti hanno contratti stipulati per un valore di 78,86 mln di euro; - 1 progetto, per circa 0,11 mln di euro, è in corso di verifica.  I rimanenti 25 progetti non hanno contratti stipulati, e l'Amministrazione ha riferito che i beneficiari hanno comunicato la rinuncia al contributo.	I/2025 Consegna del 50% delle unità
<i>C.2.1.2 - Retrofit Navi</i>					IV/2024 Consegna unità
C.2.2 - Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni:					
<i>C.2.2.1 - Acquisto navi</i>	MIT	60,00	<b>Il trimestre 2023</b> Consegna progettazione per le 3 nuove unità navali veloci	<b>Non conseguito.</b> La gara è andata deserta per cui non è ancora individuato il contraente.	III/2023 Avvio lavori realizzazione prima Unità Navale Veloce

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
<i>C.2.2.2 - Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave)</i>	MIT	20,00	<b>Il trimestre 2023</b> Nessun adempimento.	Il precedente obiettivo risulta conseguito.	IV/2024 Ibridizzazione nave traghetto Messina in esercizio
C.2.3 - Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia:					
<i>C.2.3.1 - Microliquefattori (130 mln)</i>	MIT	220,00	<b>I trimestre 2023</b> Avvio dei lavori.	Il precedente obiettivo non risulta conseguito. Nel sistema di monitoraggio sono presenti 9 progetti identificati da CUP, per un importo di finanziamento complessivo di 113,847 milioni.	I/2026 Messa in esercizio microliquefattori
<i>C.2.3.2 - Navi bunkerine (90 mln)</i>			<b>Il trimestre 2023</b> Nessun adempimento previsto.		I/2025 Consegna navi
<b>C.3 - Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali</b>	MIT	1.550,00	<b>Il trimestre 2023</b> Stipula contratti per il 100% dei lavori. Avvio del 100% dei lavori.	<b>Parzialmente conseguito.</b> Sulla base delle informazioni fornite dall'Amministrazione, per 25 interventi su 28 identificati da CUP (che rappresentano circa il 90% del totale del finanziamento PNC) sussiste un'obbligazione giuridicamente vincolante.  Sulla base delle informazioni acquisite dal MIT la percentuale di interventi avviati è circa il 43%.	II/2025 Completamento del 50% degli interventi

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
<b>C.4 - Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci</b>					
<b>C.4.1 - Locomotori, carri e raccordi ferroviari</b>					
<i>C.4.1.1 - Locomotori e carri</i>	MIT	115,00	<b>IV trimestre 2022</b> Avvio procedure di acquisto mezzi da parte dei beneficiari  <b>Il trimestre 2023</b> Nessun adempimento previsto.	Precedente obiettivo sospeso ex art. 1 c.8 d.l. 59/2021, in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea. Allo stato non risultano CUP.	IV/2023 Consegna 50% carri dal costruttore al beneficiario
<i>C.4.1.2 - Raccordi ferroviari</i>	MIT	30,00	<b>Il trimestre 2022</b> Trasferimento risorse a RFI per elettrificare i raccordi intermodali.  <b>Il trimestre 2023</b> Nessun adempimento previsto.	Il precedente obiettivo non risulta conseguito.  La procedura è stata di fatto sospesa in attesa dell'autorizzazione della Commissione europea, pervenuta a maggio 2023.	III/2023 Conclusione primo step lavori elettrificazione raccordi alla rete RFI
<b>C.4.2 - Mezzi intermodali</b>					
<i>C.4.2.1 - Locotrattori, transtainer, gru</i>	MIT	55,00	<b>IV trimestre 2022</b> Avvio procedure di acquisto locotrattori, transtainer e gru	Il precedente obiettivo risulta parzialmente conseguito.  L'amministrazione titolare ha	III/2023 Consegna locotrattori dal costruttore al

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			da parte dei beneficiari. <b>Il trimestre 2023</b> Nessun adempimento previsto.	comunicato che non sono stati ancora effettuati pagamenti poiché non si è ancora conclusa la raccolta della documentazione. È prevista la corresponsione del primo acconto entro la fine del mese di settembre.	beneficiario
<b>C.5 - Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25)</b>					
C.5.1 - Ponti e viadotti	MIT	770,00 di cui: - 130,00 per monitoraggio dinamico; - 640,00 per interventi di adeguamento di ponti e viadotti	<b>Il trimestre 2023</b> 60 ponti e viadotti monitorati.	<b>Non conseguito.</b> Per l'investimento relativo al monitoraggio dinamico – oggetto dell'obiettivo al 30 giugno –, è stato creato 1 solo CUP (J39J20001310001, in condivisione con intervento 5.2 Smart road).  In base all'ultima estrazione dati in BDAP non risultano più presenti 2 CIG rilevati in precedenza (CIG 90196545F1 per 230 milioni e 9712686A09 per 12 milioni).	IV/2023 Avvio della procedura di affidamento (interventi strutturali)
C.5.2 - Smart Road	MIT	130,00	<b>Il trimestre 2023</b> Nessun adempimento.	Per l'intervento di Smart road è stato creato 1 solo CUP in condivisione con Monitoraggio dinamico Ponti e	IV/2024 Attivazione dispositivi Smart road sulle prime

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				Viadotti. Si rinvia alle informazioni riportate sopra.	tratte
C.5.3 - Traforo del Gran Sasso	MIT	100,00	<b>Il trimestre 2023</b> Avvio dei lavori	<b>Non conseguito.</b> Il programma consta di 1 CUP. Non risultano pubblicati bandi di gara per cui l'obiettivo non risulta conseguito.	IV/2025 Collaudo / messa in esercizio
C.6 - Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale	MIT	450,00	<b>Il trimestre 2023</b> Avvio dei lavori	<b>Non conseguito.</b> Su 60 interventi individuati da CUP, in merito allo stato di avanzamento effettivo rilevato in BDAP, 6 interventi risultano in fase di esecuzione fornitura. Per gli altri, le informazioni sono assenti oppure non consentono di ritenere raggiunto l'obiettivo in quanto riportano una fase precedente all'avvio (es. progettazione o aggiudicazione).	IV/2023 Installazione dei sistemi di monitoraggio tecnologico e pianificazione delle priorità
C.7 - Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	MIT	1.470,00	<b>Il trimestre 2023</b> Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle	<b>Conseguito.</b> Il programma è composto da 26 progetti, per 25 dei quali è stato pubblicato almeno un bando di gara.	IV/2023 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere /

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			opere/esecuzione dei lavori		esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema
<b>C.8 - Aumento selettivo della capacità portuale</b>	MIT	390,00	<b>Il trimestre 2023</b> Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori	<b>Parzialmente conseguito</b> Il programma è composto da 7 progetti, per 6 dei quali è stato pubblicato almeno un bando di gara.	IV/2023 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere / esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema
<b>C.9 - Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale</b>	MIT	250,00	<b>Il trimestre 2023</b> Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori	<b>Parzialmente conseguito</b> Il programma è composto da 7 progetti, per 5 dei quali è stato pubblicato almeno un bando di gara.	IV/2023 Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 100% delle opere / esecuzione dei lavori da parte di tutte le Autorità di sistema
<b>C.10 - Efficiamento energetico</b>	MIT	50,00	<b>Il trimestre 2023</b> Avvio lavori	<b>Parzialmente conseguito.</b> Sulla base delle informazioni disponibili, per uno dei due progetti sono stati avviati i lavori, mentre per l'altro non risulta pubblicato il bando	II/2025 Realizzazione di un deposito costiero di GNL

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				di gara.	Realizzazione di banchine elettrificate nei quattro porti dell'AdSP dello Stretto
<b>C.11 - Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)</b>	MIT	700,00	<p><b>IV trimestre 2022</b></p> <p>Aggiudicazione del contratto per la realizzazione del 30% delle opere/esecuzione dei lavori da parte delle Autorità di sistema portuale e Avvio del 30% dei lavori.</p> <p><b>Il trimestre 2023</b></p> <p>Nessun adempimento.</p>	<p>Il precedente obiettivo risulta ancora parzialmente conseguito.</p> <p>Risultano affidati o aggiudicati bandi di gara per lavori per 8 progetti su 46.</p>	<p>III/2023</p> <p>Pubblicazione da parte delle Autorità di sistema portuale dei bandi di gara per la realizzazione del 100% delle opere/esecuzione dei lavori</p>
<b>C.12 - Strategia Nazionale Aree Interne</b>	MIT	300,00	<p><b>Il trimestre 2023</b></p> <p>Avvio dei lavori.</p>	<p><b>Non conseguito.</b></p> <p>Sulla base dei dati presenti in BDAP, il totale del finanziamento risulta integralmente ripartito su specifici progetti (747 CUP di cui 8 in stato "Chiuso" e non più attivi).</p> <p>Quanto allo stato di avanzamento procedurale effettivo comunicato a sistema, su 747 CUP solo il 12%</p>	<p>I/2026</p> <p>Conclusione dei lavori/collaudo interventi su 2.000 km di strade</p>



Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				risulta aver raggiunto la fase di avvio lavori o esecuzione fornitura. Per gli altri, le informazioni sono assenti oppure non consentono di ritenere raggiunto l'obiettivo in quanto riportano una fase precedente all'avvio.	
C.13 - Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica	MIT	2.000,00	<b>Il trimestre 2023</b> Consegna/Avvio dei lavori.	<b>Parzialmente conseguito.</b> L'amministrazione titolare ha comunicato che su 988 interventi con CUP ammessi a finanziamento sono stati avviati lavori per 880 interventi.	IV/2024 Realizzazione del 50% dei lavori
D.1 - Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	MIC	1.455,24	<b>Il trimestre 2023</b> Pubblicazione di tutti i Bandi di gara per appalto lavori e servizi.	<b>Conseguito.</b> Il MIC ha adottato il provvedimento di assegnazione definitiva delle risorse (decreto n. 139 del 23 marzo 2023).  Sono stati pubblicati i bandi di gara per gli interventi; il dato considera quanto comunicato dall'Amministrazione circa la necessità di tenere conto anche dell'adesione da parte di soggetti attuatori quali RFI, FFI e Comune di Milano ad AQ, allo stato non riscontrabili nel sistema di	IV/2023 Aggiudicazione di tutte le gare.

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
				monitoraggio.	
<b>E.1 - Salute, ambiente, biodiversità e clima</b>					
E.1.1 – Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata	SALUTE	415,38	<b>Il trimestre 2023</b> Aggiudicazione per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali	<b>Parzialmente conseguito.</b> In relazione all'unico CUP presente, in BDAP risultano procedure di affidamento diretto per circa 28 milioni di euro e gare pubblicate per circa 71,5 milioni di euro. In totale le risorse oggetto di procedure avviate rappresentano circa il 24% delle risorse dell'investimento mentre gli affidamenti rappresentano circa il 7%.	III/2023 Avvio interventi per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPS-SNPA) e 25% del rafforzamento complessivo delle strutture nazionali
E.1.2 - Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale	SALUTE	49,50	<b>Il trimestre 2023</b> Nessun adempimento.	Il precedente obiettivo risulta conseguito	IV/2023 Pubblicazione bando e aggiudicazione.

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
E.1.3 - Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima	SALUTE	6,12	<b>Il trimestre 2023</b> Nessun adempimento.	Il precedente obiettivo risulta conseguito	IV/2023 Fase esecutiva - Acquisizione e rinnovamento infrastrutturale, di strumentazioni gestionali, piattaforme informatiche e sistemi qualità presso il centro di formazione Salute, Ambiente e Clima presso l'ISS
E.1.4 - Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima	SALUTE	21,00	<b>IV trimestre 2022</b> Avvio interventi. <b>Il trimestre 2023</b> Nessun adempimento.	Il precedente obiettivo risulta conseguito. L'Amministrazione ha comunicato che tutti i progetti sono stati avviati e che la prima rendicontazione è prevista per il mese di settembre 2023.	IV/2026 Almeno 14 programmi attivati di promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima.
E.1.5 - Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-	SALUTE	8,00	<b>Il trimestre 2023</b> Provvedimento di adozione	<b>Non conseguito.</b> Non risulta pervenuto il provvedimento	III/2023 Procedure pubbliche di

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
SNPS			Piano di Digitalizzazione della rete SNPS e SNPA.	di adozione del Piano.	procurement riferite alla Piattaforma digitale nazionale: pubblicazione bando, aggiudicazione (entro 3 mesi successivi) e avvio interventi (entro 3 mesi successivi).
<b>E.2 - Verso un ospedale sicuro e sostenibile</b>	SALUTE	1.450,00	<p><b>I trimestre 2023</b></p> <p>Pubblicazione di gare d'appalto o accordo quadro per interventi antisismici da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn</p> <p><b>Il trimestre 2023</b></p> <p>Nessun adempimento.</p>	Il precedente obiettivo risulta conseguito. Su 224 interventi con CUP, in base ai dati trasmessi dall'Amministrazione per circa il 90% risulta pubblicata la gara d'appalto o l'adesione ad un accordo quadro per la realizzazione degli interventi. Sono in corso le verifiche sul disallineamento.	III/2023 Sottoscrizione dei contratti da parte delle Regioni, anche attraverso gli Enti del Ssn
<b>E.3 - Ecosistema innovativo della salute</b>	SALUTE	437,40	<p><b>IV trimestre 2022</b></p> <p>Aggiudicazione e stipula atti formali con i soggetti attuatori ed impegno/erogazione 1° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 20% dei fondi totali disponibili.</p>	Il precedente obiettivo risulta conseguito. Le convenzioni sono state firmate dalle parti entro il 31 dicembre 2022. Nel corso del 2023 sono stati erogati i finanziamenti ai soggetti attuatori per circa il 26% dei fondi totali disponibili.	IV/2023 Monitoraggio stato di attuazione previsto negli atti formali (convenzioni e/o accordi), rendicontazione, verifica dello stato di

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			<b>Il trimestre 2023</b> Nessun adempimento.		avanzamento del progetto - pagamento 2° quota di finanziamento ai soggetti attuatori pari al 20% dei fondi totali disponibili per l'intero programma salvo residui anno precedente
F.1 - "Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	MIMIT	800,00	<b>Il trimestre 2023</b> Completamento ed attivazione piattaforma multicanale	<b>Conseguito</b> La piattaforma è attivata. In relazione all'avanzamento delle linee di intervento "Spazi per l'Italia" e "Sportello unico" (procedure avviate e aggiudicate) sono in corso le verifiche per l'allineamento dei dati trasmessi dall'Amministrazione con le risultanze del sistema di monitoraggio.	IV/2024 Collaudo interventi di realizzazione dei 250 spazi per il coworking e le attività educative Realizzazione di interventi su almeno 2.800 UP.
F.3 - Accordi per l'Innovazione	MIMIT	1.000,00	<b>Il trimestre 2023</b> Emanazione decreti di concessione delle agevolazioni per ammontare	<b>Parzialmente conseguito.</b> Sulla base di quanto comunicato dall'Amministrazione titolare e dei dati disponibili nel sistema di	IV/2023 Erogazione di almeno il 5% delle risorse complessive stanziato.

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			pari al 100% delle risorse stanziare per la misura.	monitoraggio, risultano adottati decreti di concessione per circa il 50% delle risorse, corrispondenti a 248 CUP.	
<b>G.1 - Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori</b>					
G.1.1 - Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni "modello" per detenuti adulti	GIUSTIZIA	84,00	<b>Il trimestre 2023</b> - 100% pubblicazione bandi di gara per l'affidamento dei lavori; - 50% aggiudicazione definitiva l'affidamento lavori;	<b>Parzialmente conseguito</b> L'amministrazione titolare ha comunicato che per gli 8 progetti sono stati pubblicati 7 bandi di gara, di cui solo 2 aggiudicati.	III/2023 - 50% stipula contratto d'appalto; - 50% aggiudicazione definitiva affidamento dei lavori;
G.1.2 - Adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni	GIUSTIZIA	48,90	<b>Il trimestre 2023</b> - 100% pubblicazione bandi di gara per l'affidamento dei lavori; - 75% aggiudicazione definitiva l'affidamento lavori;	<b>Non conseguito</b> L'amministrazione titolare ha comunicato che per i 4 progetti sono stati pubblicati solo 2 bandi di gara, di cui 1 aggiudicato.	III/2023 - 75% stipula contratto d'appalto; - 25% aggiudicazione definitiva affidamento dei lavori;
<b>H.1 - Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e</b>	MASAF	1.203,30	<b>Il trimestre 2023</b> Approvazione delle	<b>Parzialmente conseguito</b> La graduatoria per i contratti di filiera	Nessun ulteriore adempimento.

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo			graduatorie finali per la concessione degli aiuti finanziari altri settori; Numero di nuovi contratti per la filiera e di distretto firmati [obiettivo unico per tutti i settori]: 46	<p>pesca e acquacoltura è stata adottata in data 27 giugno 2023, con decreto n. 333701. Inoltre, è stata comunicata l'adozione, in data 30 giugno 2023, con Decreto n. 342515, anche della graduatoria per il V bando – agroalimentare.</p> <p>In merito al settore forestale, a seguito della proroga del termine di presentazione delle domande concessa in relazione ai recenti eventi alluvionali, si intende pubblicare la graduatoria all'inizio del mese di settembre 2023.</p> <p>Infine, risultano sottoscritti dieci contratti di distretto ed è stato comunicato che ulteriori contratti sono in corso di sottoscrizione.</p>	
I.1 - Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	MUR	500,00	<p><b>Il trimestre 2023</b></p> <p>Apertura della seconda finestra del primo bando e ricezione delle proposte progettuali per la seconda</p>	<p><b>Conseguito</b></p> <p>Con decreto Direttoriale del 6 giugno 2022, n. 931, il MUR ha adottato un unico " Avviso per la concessione di finanziamenti destinati ad iniziative di 11 ricerca per tecnologie e percorsi</p>	<p>IV/2023</p> <p>Decreto di ammissione al finanziamento dei progetti selezionati e avvio dei progetti per la seconda finestra del</p>

Codice univoco e Programma/investimento/intervento	Amministrazione	Importo (mln euro)	Adempimenti previsti	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
			finestra del primo bando.	<p><i>innovativi in ambito sanitario e assistenziale"</i> per l'intera dotazione finanziaria disponibile.</p> <p>A dicembre 2022 sono stati adottati i decreti di ammissione al finanziamento per le quattro iniziative selezionate. Per il dettaglio si rinvia a quanto riportato nel report n. 6</p>	primo bando.





