



PNC

Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Report n. 1: adempimenti e attività al 30 settembre 2021

2020

2021

2022

2023



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

PNC Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR

Report n. 1: adempimenti e attività al 30 settembre 2021

INDICE

Inquadramento normativo e quadro di sintesi.....	1
FASE 1 – Organizzazione delle attività.....	3
FASE 2 – Adozione del decreto MEF 15 luglio 2021	5
FASE 3 - Attuazione e verifica del rispetto del cronoprogramma.....	7
3.1. Modalità operative.....	7
3.2. Monitoraggio	7
3.3. Prima scadenza: III trimestre 2021	8
Allegato 1 – adempimenti e attività al 30 settembre 2021	9

Inquadramento normativo e quadro di sintesi

Il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 ha disposto all'art. 1, comma 1, l'approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finanziato con risorse nazionali per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, con l'obiettivo di integrare e potenziare i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. La **complementarietà** del Piano con il PNRR si manifesta:

- a livello progettuale, con una integrazione delle risorse per gli interventi già previsti nel PNRR (i **c.d. programmi e interventi cofinanziati**);
- a livello di missione o di componente della missione, con la previsione di ulteriori investimenti (i **c.d. programmi e interventi del Piano**) che contribuiscono al raggiungimento delle finalità del PNRR.

Il **PNC**, al quale è applicata la normativa di semplificazione e accelerazione già prevista per il PNRR (art. 14 decreto-legge n. 77 del 2021 e art.1, comma 6, decreto-legge n. 59 del 2021), si basa su alcuni principi finalizzati a una maggiore efficienza nell'allocazione delle risorse, mediante:

- l'accelerazione della c.d. «messa a terra» degli interventi comprimendo e, ove possibile, anticipando i tempi di definizione dei passaggi amministrativi e burocratici;
- il finanziamento diretto di progetti definiti e con obiettivi di realizzazione precisi, incentivando il finanziamento dei progetti e non la mera ripartizione delle risorse.

Il **meccanismo** immaginato per raggiungere gli scopi sopra indicati impone alle Amministrazioni non solo di individuare **obiettivi iniziali, intermedi e finali** dei progetti di cui sono titolari, ma soprattutto le **tempistiche** entro cui tali obiettivi devono essere raggiunti, prevedendo la **revoca** del finanziamento in caso di mancato rispetto delle stesse e **meccanismi premiali** (assegnazione di risorse revocate) per le Amministrazioni che riportino i migliori dati di impiego delle risorse.

Peraltro, la capacità di attuare il Piano e di raggiungere gli obiettivi nei tempi previsti, costruendo anche un modello replicabile in altre situazioni, è tra le tappe della Riforma della Pubblica Amministrazione nel PNRR¹ e rende ancora più sfidante l'attività da porre in essere per il raggiungimento degli obiettivi.


¹ Si veda al riguardo:

- **milestone M1C1-55**, da raggiungere entro il T4 2021, relativa alla "Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione" che prevede l'estensione al bilancio nazionale della metodologia utilizzata per il PNRR mediante l'istituzione di un sistema semplificato di traguardi e obiettivi simile a quello dell'RRF per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti nell'ambito del PNC. Tale traguardo è stato raggiunto con l'adozione del DM MEF.
- **milestone M1C1-62** "Riforma 1.9: Riforma della pubblica amministrazione": "Migliorare l'assorbimento degli investimenti" da raggiungere entro il T2 2025: "Pubblicare una relazione di attuazione per misurare l'impatto delle azioni volte a fornire assistenza tecnica e sviluppo di capacità, migliorare la capacità di pianificare, gestire ed eseguire le spese in conto capitale finanziate attraverso il bilancio nazionale e conseguire un significativo assorbimento delle risorse del Fondo complementare assegnate fino al 2024."

FASE 1 – Organizzazione delle attività

Le attività relative al PNC sono svolte dall'Ispettorato per gli affari economici con la seguente organizzazione:

- un **Gruppo di coordinamento**, per il coordinamento e l'uniformità dell'operato degli uffici nonché per il supporto anche nelle attività istruttorie. Il Gruppo si occupa inoltre del monitoraggio complessivo del PNC, della raccolta e sistematizzazione delle informazioni fornite dagli uffici e della predisposizione di report periodici sullo stato di avanzamento dei programmi e interventi del Piano;
- i c.d. **referenti IGAE**, con il compito di esaminare i provvedimenti attuativi, seguire le scadenze dei diversi interventi e il relativo avanzamento in base alla rispettiva competenza.

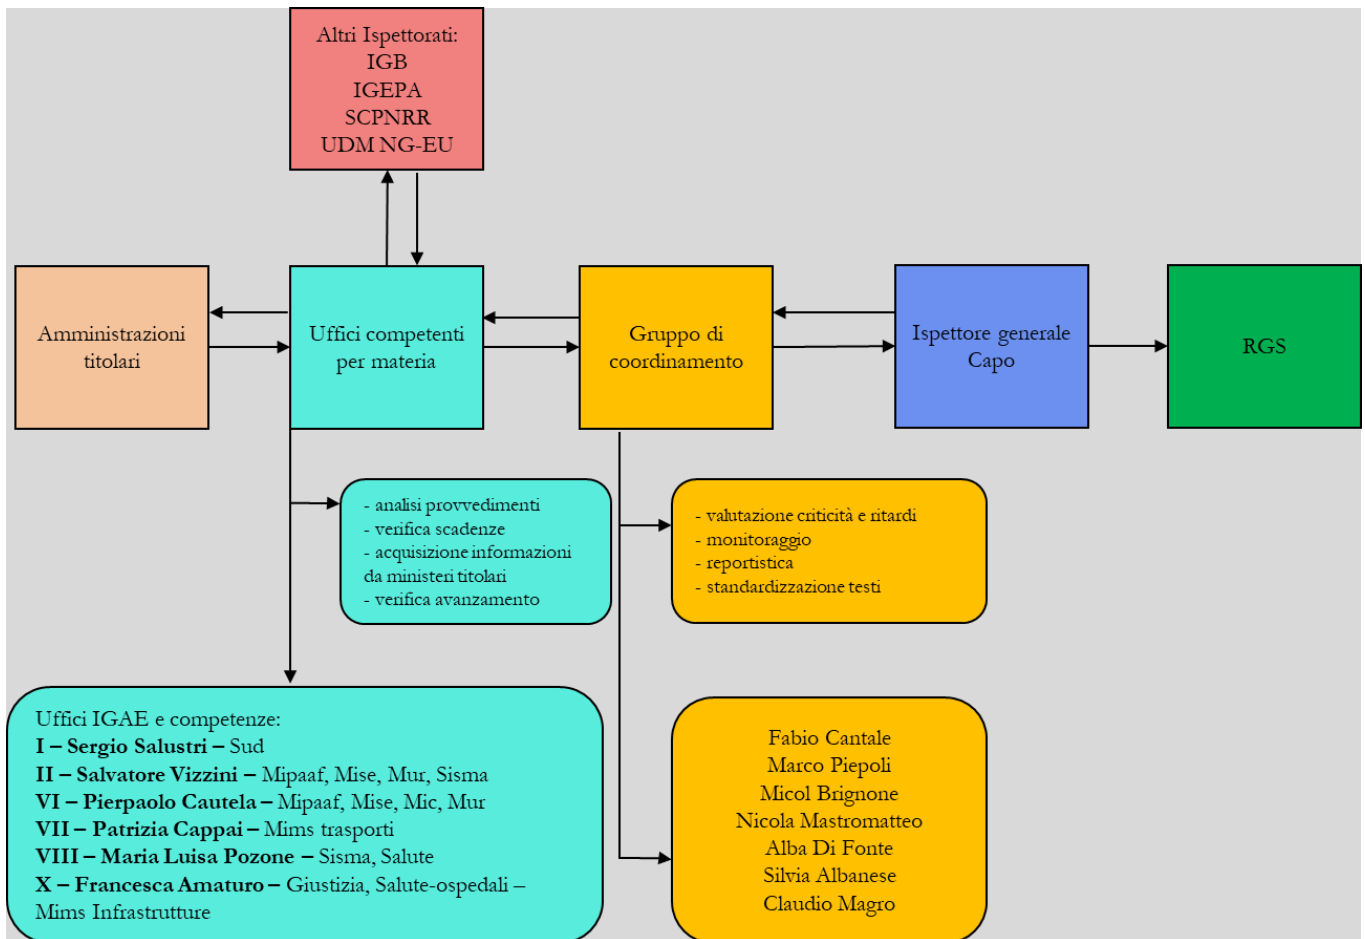


FASE 2 – Adozione del decreto MEF 15 luglio 2021

L'art. 1, comma 7, del decreto-legge n. 59 del 2021 ha previsto l'individuazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali² per ogni intervento del piano indicando due **vincoli**:

- il rispetto del **cronoprogramma finanziario** previsto dallo stesso decreto-legge;
- la coerenza con gli **impegni assunti nel PNRR** (v. nota 1) **sull'incremento della capacità di spesa** collegata all'attuazione degli interventi del PNC.

Per la predisposizione dello schema di DM MEF sono state poste in essere attività sintetizzate di seguito.

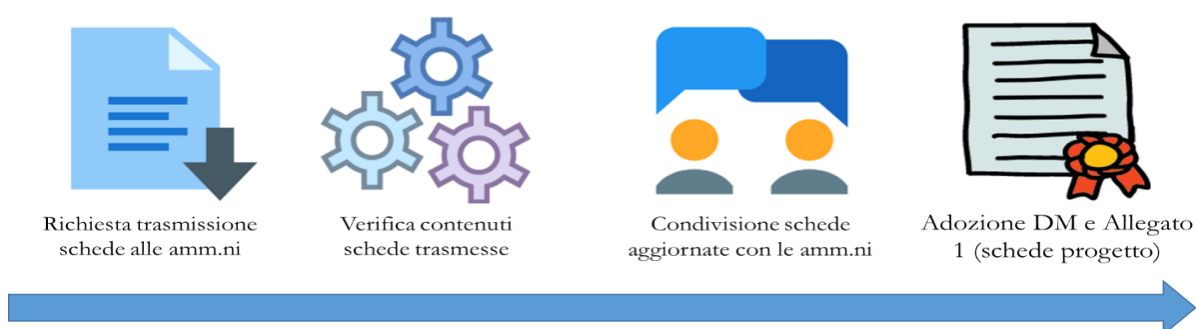

Tali attività in concreto hanno riguardato:

- **le modalità di attuazione e monitoraggio.** Sono state definite una modalità c.d. "alta" in capo ai Ministeri e una "bassa" in capo ai beneficiari e successiva alla prima (v. infra par. *Monitoraggio*); in tale procedimento, il monitoraggio è il fulcro delle attività e incentiva meccanismi automatici di rilevazione e condivisione di dati e informazioni, al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico dei soggetti attuatori e dei titolari degli interventi;
- **le schede relative ai programmi e interventi del Piano:** gli uffici competenti dell'IGAE hanno acquisito le schede e condiviso con le Amministrazioni i contenuti, allineando i cronoprogrammi procedurali ai cronoprogrammi finanziari già definiti e verificando l'indicazione delle tappe procedurali fondamentali.

L'individuazione degli obiettivi dei **programmi e degli interventi cofinanziati** (ex art. 3 comma 2 del decreto MEF del 15 luglio 2021: A.1. Servizi digitali e cittadinanza digitale, A.2. Servizi digitali e competenze digitali, A.3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale, F.2. Transizione 4.0, L.1. Piani urbani integrati, M.1. Ecobonus e Sismabonus 110%) - in virtù della origine degli stessi e della necessità di allineare i processi di monitoraggio - è stata rinviata ad un successivo provvedimento "in coerenza con quanto riportato nel PNRR, e in esito all'adozione dei provvedimenti attuativi di cui all'articolo 1, commi 1042, e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178" necessari al monitoraggio del PNRR.

L'iter per l'adozione del decreto ministeriale si è concluso immediatamente dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 59/2021.

² Per "obiettivi iniziali, intermedi e finali" si intendono le tappe di:

- individuazione puntuale degli interventi (con i relativi CUP) e dei relativi beneficiari come esito finale del percorso di attivazione degli adempimenti normativi/amministrativi in capo ai Ministeri; gli step necessari da compiere per arrivare dall'autorizzazione di spesa alla realizzazione di quanto programmato con i fondi stanziati, con tempistiche serrate e presidiate;
- avvio degli interventi da parte dei beneficiari;
- realizzazione degli interventi e loro "messa in esercizio".

FASE 3 - Attuazione e verifica del rispetto del cronoprogramma.

3.1. Modalità operative

La serrata tempistica degli adempimenti previsti dal PNC ha imposto una riflessione sulle modalità operative e sui processi da mettere in atto da parte dell'IGAE, con il coinvolgimento degli altri Ispettorati e Servizi competenti in RGS (IGB, IGEPA SCPNRR, UDM NG-EU), di tipo:

- **diretto**, come nel caso in cui vi sia la necessità di analizzare decreti ministeriali attraverso attività coordinate che si concludono con la verifica e il riscontro all'amministrazione e con l'attività di bollinatura per la firma del Ministro. In linea generale, per i decreti si sta procedendo con una standardizzazione delle clausole al fine di garantire uniformità della disciplina in particolare per i profili attinenti al monitoraggio;
- **indiretto**, nel caso di adempimenti che non prevedano un ruolo attivo della RGS nell'adozione degli atti necessari al raggiungimento dell'obiettivo (es. accordi tra soggetti terzi, pubblicazione dei bandi di gara, aggiudicazione e via discorrendo). In tal caso, l'attività dell'Ispettorato è diretta verso il monitoraggio e una costante interlocuzione con le Amministrazioni titolari degli interventi al fine di garantire il rispetto del cronoprogramma procedurale e delle relative tempistiche.

A tali attività si aggiungono:

- l'analisi e la valutazione delle **comunicazioni trimestrali** ex art. 8 decreto MEF del 15 luglio 2021 con le quali le Amministrazioni titolari degli investimenti comunicano al MEF-RGS le informazioni sullo stato di attuazione dei programmi e degli interventi e sugli obiettivi conseguiti, nonché gli eventuali scostamenti rispetto al cronoprogramma, con le relative motivazioni e le conseguenti iniziative. L'invio della prima comunicazione è previsto entro il 31 ottobre 2021.
- la partecipazione, sulla base delle risultanze dei sistemi di monitoraggio, alla predisposizione della **relazione** annuale sulla **ripartizione territoriale dei programmi e degli interventi del PNC**, da presentare alle Camere³ a partire dal 2022 e fino alla completa realizzazione del Piano.

3.2. Monitoraggio

Il decreto MEF del 15 luglio 2021, oltre ad aver individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali per ciascun investimento del Piano, ne ha stabilito le relative modalità di monitoraggio. L'**obiettivo** finale è quello di riuscire a **"seguire" il Piano nel suo complesso**, individuando dapprima le fasi amministrative propedeutiche all'avvio degli interventi e alla individuazione dei beneficiari e successivamente seguendo l'attivazione e realizzazione.

Si tratta quindi di un **monitoraggio strutturato su due livelli**, ovvero

1. Il monitoraggio delle procedure amministrative (parte alta)

Si tratta di una forma di monitoraggio "a monte", che si basa sulla verifica delle attività previste dal decreto MEF del 15 luglio 2021, in particolare nelle schede progetto.

È effettuato dai referenti di programma, individuati in ogni Ministero e tende a verificare il rispetto del cronoprogramma delle attività previste dal decreto citato.

³ Art. 1, comma 7-quinquies, D.L. 59/2021.

2. Monitoraggio dei progetti (parte bassa)

È curato dai soggetti attuatori, ovvero l'ente pubblico o il soggetto privato responsabile dell'attuazione che coincide con il titolare del codice unico di progetto (CUP) e generalmente con la stazione appaltante che gestisce gli affidamenti e stipula i contratti (identificati con i codici CIG di ANAC).

In questo caso il monitoraggio è effettuato tramite il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011 (BDAP/MOP), a eccezione degli interventi cofinanziati dal PNRR monitorati tramite REGIS (sistema di monitoraggio del PNRR).

Il sistema, al fine di assicurare il principio di unicità dell'invio⁴ e la riduzione degli oneri amministrativi a carico degli enti attuatori, ottiene automaticamente – anche senza nessuna alimentazione da parte degli Enti - i dati di attuazione attraverso l'interoperabilità con altri sistemi tramite i citati codici CUP e CIG, ossia i dati:

- ANAC, per seguire l'attivazione delle procedure di affidamento per ogni intervento e le fasi dei contratti;
- delle fatture elettroniche ricevute dagli enti attuatori degli interventi;
- dei pagamenti, sia tramite SIOPE e SIOPE+ che tramite le contabilità speciali e SICOGE.

In generale, tutti i dati BDAP/MOP sono resi disponibili alle Amministrazioni centrali.

3.3. Prima scadenza: III trimestre 2021

A seguito della trasmissione del decreto MEF del 15 luglio 2021, tutte le Amministrazioni coinvolte sono state invitate a comunicare i nominativi dei c.d. **Referenti di Programma**, quali responsabili dell'attivazione dei programmi o degli interventi.

Delineati i processi, individuati i referenti interni e quelli delle Amministrazioni sono state attivate le procedure di adozione dei provvedimenti amministrativi di attuazione, di verifica degli adempimenti relativi ai bandi di gara, nonché **avviate interlocuzioni** anche informali per la **raccolta delle informazioni** relative allo stato di avanzamento delle procedure.

I risultati di tali attività, relativi esclusivamente ai programmi e interventi del Piano, sono contenuti nel report allegato.

⁴ Di cui all'articolo 3, comma 1, lettera ggggg-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Allegato 1 – adempimenti e attività al 30 settembre 2021

Rif.	Investimento/ Sub-investimento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimento previsto al III trimestre 2021	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
A.4	Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani marginalizzati	PCM Min. Sud	350,00	<p>Publicazione della manifestazione di interesse (avviso)</p> <p>Decreto di nomina dei componenti della commissione di valutazione.</p>	<p>Conseguito.</p> <p>-D.D. n. 204/2021 dell'Agenzia per la coesione</p> <p>- D.D. n. 210/2021 dell'Agenzia per la Coesione</p>	<p>IV/2021</p> <p>Invito alla presentazione dei progetti sulla base dell'esito della manifestazione di interesse</p>
B.1.1	<p>Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016</p> <p>A. Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi</p>	<p>Commissario sisma 2016</p> <p>Dip. "Casa Italia"</p> <p>Struttura di missione sisma 2009.</p>	1.080,00	<p>Individuazione delle specifiche finalità di investimento per macromisure A e B; riparto delle risorse per ciascuna finalità individuata; indicazione del responsabile dell'attuazione per ciascuna sub-misura tra i due soggetti attuatori; individuazione degli obiettivi di realizzazione per ciascuna sub-misura.</p>	<p>Conseguito.</p> <p>Approvato, con delibera della Cabina di coordinamento integrata ai sensi dell'art. 14 bis del D.L. 77/2021, il Programma unitario di interventi.</p>	<p>IV/2021</p> <p>individuazione degli interventi da parte della Cabina di coordinamento; individuazione delle stazioni appaltanti da parte del soggetto attuatore; affidamento da parte della stazione appaltante della progettazione delle misure</p>

Rif.	Investimento/ Sub-investimento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimento previsto al III trimestre 2021	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
B.1.2	Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016 B. Rilancio economico e sociale	Commissario sisma 2016 Dip. " Casa Italia" Struttura di missione sisma 2009.	700,00			IV/2021 Individuazione delle iniziative da parte della Cabina di coordinamento
C.1	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi - Bus	MIMS	600,00	Assegnazione delle risorse	Conseguito. DM MIMS n. 315 del 02.08.2021	I/2022 Erogazione anticipazione ai soggetti beneficiari
C.2.1.1 C.2.1.2	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi Rinnovo della flotta navale mediterranea con unità navali a combustibile pulito: - Upgrading nuove navi - Retrofit Navi	MIMS	500,00	definizione tipologia e parametri tecnici degli interventi, entità, modalità e condizioni di erogazione del contributo riconoscibile per ciascuna tipologia di intervento. Notifica UE (per retrofit navi)	Conseguito. DM firmato dal MIMS il 30.09.2021. Bollinato da RGS e inviato alla firma del Ministro MEF.	I/2022 Decreto ministeriale per individuazione criteri di ammissibilità al finanziamento
C.2.2.1	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi: Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni: - Acquisto navi	MIMS	60,00	Nessun adempimento		IV/2021 Pubblicazione del bando di gara per acquisto delle 3 nuove unità navali veloci

Rif.	Investimento/ Sub-investimento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimento previsto al III trimestre 2021	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.2.2.2	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi Rinnovo della flotta navale e nello Stretto di Messina per ridurre le emissioni Ibridizzazione navi (Nave Iginia, Nave Messina, Acquisto nuova nave)	MIMS	20,00	Avvio predisposizione ibridizzazione prima nave Iginia traghettamento treni. Pubblicazione del bando di gara per fornitura di nave dual fuel ibrida elettrica	Conseguito. Comunicato dal MIMS l'avvio. Pubblicato il bando in data 03.08.2021.	II/2022 Completamento Ibridizzazione Nave Iginia prima nave traghettamento treni
C.2.3.1 C.2.3.2	Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Navi Aumentare la disponibilità di combustibili marini alternativi in Italia: - Microliquefattori (130 mln) - Navi bunkerine (90 mln)	MIMS	220,00	Definizione tipologia e parametri tecnici degli interventi, entità, modalità e condizioni di erogazione del contributo riconoscibile per ciascuna tipologia di intervento. Notifica UE e revisione (per navi bunkerine)	Conseguito. DM firmato dal MIMS il 30.09.2021. Bollinato da RGS e inviato alla firma del Ministro MEF.	I/2022 Decreto ministeriale per individuazione criteri di ammissibilità al finanziamento
C.3	Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali	MIMS	1.550,00	Individuazione degli interventi ammessi a finanziamento e formalizzazione dell'assegnazione delle risorse necessarie per la realizzazione degli interventi del Piano.	Conseguito. DM MIMS del 23.09.2021.	I/2022 D.D. di trasferimento delle risorse a titolo di anticipazione alle regioni. Pubblicazione dei bandi di gara per il 38% dei lavori

Rif.	Investimento/ Sub-investimento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimento previsto al III trimestre 2021	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.4.1.1	Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci 1.Locomotori, carri e Raccordi ferroviari 1. Locomotori e carri	MIMS	115,00	Definizione di modalità e condizioni di erogazione del contributo riconoscibile per ciascuna tipologia di mezzo, a seguito di gara	Conseguito. DM firmato dal MIMS il 30.09.2021. Bollinato da RGS e inviato alla firma del Ministro MEF.	IV/2021 Notifica CE per autorizzazione
C.4.1.2	Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci Locomotori, carri e raccordi ferroviari Raccordi ferroviari	MIMS	30,00	Nessun adempimento	Il MIMS ha comunque predisposto un decreto per il trasferimento delle risorse a RFI: in corso di verifica nuovo testo a seguito osservazioni RGS.	IV/2021 Avvio progettazione delle elettrificazioni dei raccordi RFI
C.4.2	Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il trasporto ferroviario delle merci Mezzi intermodali Locotrattori, transtainer, gru	MIMS	55,00	Definizione di modalità e condizioni di erogazione del contributo riconoscibile per ciascuna tipologia di mezzo, a seguito di gara	Conseguito. DM firmato dal MIMS il 29.09.2021. Bollinato da RGS e inviato alla firma del Ministro MEF.	IV/2021 Notifica CE per autorizzazione

Rif.	Investimento/ Sub-investimento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimento previsto al III trimestre 2021	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.5.1	Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) Ponti e viadotti	MIMS	1.000,00	Definizione del programma generale degli interventi del Commissario Straordinario	Conseguito. Adottato il Programma generale degli interventi. Pubblicato bando di gara smart road per 50 milioni di euro.	IV/2021 Redazione del progetto di monitoraggio dinamico
C.5.2	Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) Smart Road	MIMS		Pubblicazione del bando	DM MIMS di assegnazione delle risorse del 29.09.21, n. 369. Ordinanze del Commissario Straordinario n. 1, n. 2, n.3.	II/2022 Aggiudicazione del contratto
C.5.3	Strade sicure – Messa in sicurezza e implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel (A24-A25) Traforo del Gran Sasso	MIMS		Nessun adempimento		IV/2021 Avvio progettazione interventi
C.6	Strade sicure – Implementazione di un sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti, viadotti e tunnel della rete viaria principale	MIMS	450,00	Nessun adempimento		IV/2021 Decreto ministeriale di ripartizione delle somme tra enti gestori

Rif.	Investimento/ Sub-investimento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimento previsto al III trimestre 2021	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.7	Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	MIMS	1.470,00	individuazione dei beneficiari	<p>Conseguito.</p> <p>DM MIMS n. 330 del 13.08.2021.</p>	IV/2021 D.D.: accordi procedurali con ciascuna ADSP
C.8	Aumento selettivo della capacità portuale	MIMS	390,00	individuazione dei beneficiari		IV/2021 D.D.: accordi procedurali con ciascuna ADSP
C.9	Ultimo/Penultimo Miglio Ferroviario/Stradale	MIMS	250,00	individuazione dei beneficiari		IV/2021 D.D.: accordi procedurali con ciascuna ADSP
C.10	Efficientamento energetico	MIMS	50,00	individuazione dei beneficiari		IV/2021 D.D.: accordi procedurali con ADSP
C.11	Elettificazione delle banchine (Cold ironing)	MIMS	700,00	individuazione dei beneficiari		IV/2021 D.D.: accordi procedurali con ciascuna ADSP
C.12	Strategia Nazionale Aree Interne	MIMS	300,00	Provvedimento di riparto delle risorse sulla base di criteri ivi individuati	<p>Conseguito.</p> <p>DM firmato da MIMS e da Min. Sud e pervenuto il 30.09.2021. Bollinato da RGS e inviato alla firma del Ministro MEF.</p>	IV/2021 Condivisione e scelta degli interventi da parte dei Comitati Aree interne e soggetti gestori delle strade individuate

Rif.	Investimento/ Sub-investimento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimento previsto al III trimestre 2021	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
C.13	Sicuro, verde e sociale: riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica	MIMS	2.000,00	Provvedimento con individuazione criteri e riparto delle somme su base regionale, modalità e termini di ammissione a finanziamento degli interventi e modalità di erogazione dei finanziamenti.	Conseguito. DPCM del 15.09.2021	IV/2021 Pubblicazione dei Bandi da parte delle Regioni per individuazione proposte e conseguente predisposizione della programmazione degli interventi da parte delle Regioni
D.1	Piano di investimenti strategici sui siti del patrimonio culturale, edifici e aree naturali	MIC	1.455,24	individuazione degli interventi e riparto delle risorse; approvazione dello schema di disciplinare d'obbligo con i Soggetti Attuatori (SA); individuazione della Centrale Unica di Committenza	Conseguito. DPCM di individuazione degli interventi e riparto delle risorse firmato da Ministro della Cultura e Ministro dell'economia e delle finanze e inviato alla PCM in data 30.09.2021. Adottato DM di approvazione dello schema di disciplinare. Da adottare: provvedimento di individuazione della Centrale Unica di Committenza (dopo la firma del DPCM).	IV/2021 Approvazione del Piano di supporto tecnico; convenzioni e contratti per l'affidamento dei servizi di AT. Sottoscrizione dei Disciplinari d'obbligo con i soggetti attuatori e conseguente concessione delle anticipazioni (sulla base di QE preliminare).

Rif.	Investimento/ Sub-investimento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimento previsto al III trimestre 2021	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
E.1.1	Salute, ambiente, biodiversità e clima Rafforzamento complessivo delle strutture e dei servizi di SNPS-SNPA a livello nazionale, regionale e locale, migliorando le infrastrutture, le capacità umane e tecnologiche e la ricerca applicata	SALUTE	415,38	Nessun adempimento		I/2022 Pubblicazione bando per 5% del rafforzamento complessivo delle strutture regionali (SNPA).
E.1.2	Salute, ambiente, biodiversità e clima Sviluppo e implementazione di specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in 2 siti contaminati selezionati di interesse nazionale	SALUTE	49,50	Nessun adempimento		IV/2022 Provvedimenti per l'identificazione dei siti contaminati e definizione del piano di interventi integrati.
E.1.3	Salute, ambiente, biodiversità e clima Formazione di livello universitario e programma nazionale di formazione continua in salute-ambiente-clima	SALUTE	6,12	Nessun adempimento		II/2022 Adozione provvedimento per definizione Piano di azione MdS-ISS; provvedimento di istituzione del SNPS

Rif.	Investimento/ Sub-investimento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimento previsto al III trimestre 2021	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
E.1.4	Salute, ambiente, biodiversità e clima Promozione e finanziamento di ricerca applicata con approcci multidisciplinari in specifiche aree di intervento salute-ambiente-clima	SALUTE	21,00	Nessun adempimento		II/2022 Pubblicazione bando
E.1.5	Salute, ambiente, biodiversità e clima Piattaforma di rete digitale nazionale SNPA-SNPS	SALUTE	8,00	Nessun adempimento		II/2022 Piano di azione MdS-ISS
E.2	Verso un nuovo ospedale sicuro e sostenibile	SALUTE	1.450,00	Nessun adempimento		II/2022 Decreto ministeriale di approvazione del piano d'azione con individuazione degli interventi e assegnazione delle risorse alle Regioni
E.3	Ecosistema innovativo della salute	SALUTE	437,40	Nessun adempimento		I/2022 Perfezionamento del decreto di approvazione della procedura ad evidenza pubblica

Rif.	Investimento/ Sub-investimento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimento previsto al III trimestre 2021	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
F.1	"Polis" - Case dei servizi di cittadinanza digitale	MISE	800,00	Notifica UE e Sottoscrizione Convenzione MISE, MIN PA e Poste	Conseguito. Pre-notifica effettuata in data 26.07.2021 Convenzione sottoscritta il 30.09.2021	IV/2021 Autorizzazione UE
F.3	Accordi per l'Innovazione	MISE	1.000,00	Pubblicazione del bando per la selezione del soggetto gestore e aggiudicazione.	Conseguito. Pubblicato il bando per la selezione del soggetto gestore in GUUE del 22.09.2021.	IV/2021 DM MISE semplificazione amministrativa; Convenzione tra Ministero e Soggetto gestore per l'affidamento del servizio di assistenza e supporto adempimenti connessi alla concessione, all'erogazione, ai controlli e al monitoraggio delle agevolazioni concesse.
G.1.1	Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori Miglioramento degli spazi e della qualità della vita carceraria nelle carceri per adulti (DAP), attraverso la costruzione di 8 nuovi padiglioni "modello" per detenuti adulti	GIUSTIZIA	84,00	Nessun adempimento		I/2022 50% dei bandi di gara pubblicati per l'affidamento del servizio di ingegneria/architettura

Rif.	Investimento/ Sub-investimento	Amm.	Importo (mln euro)	Adempimento previsto al III trimestre 2021	Stato obiettivo	Prossimo adempimento e relativa scadenza (trimestre/anno)
G.1.2	Costruzione e Miglioramento padiglioni e spazi strutture penitenziarie per adulti e minori Adeguamento strutturale, aumento dell'efficienza energetica ed interventi antisismici di quattro complessi demaniali sede di Istituti penali per i minorenni	GIUSTIZIA	48,90	Nessun adempimento		I/2022 75% dei bandi di gara pubblicati per l'affidamento del servizio di ingegneria/architettura
H.1	Contratti di filiera e distrettuali per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo	MIPAAF	1.203,30	Attribuzione beneficio della graduatoria dei progetti già presentati	Conseguito. DM MIPAAF – PQAI n. 478546 del 28.09.2021	IV/2021 Decreto ministeriale per la Definizione e pubblicazione nuovo bando settore agroalimentare; Definizione regime di aiuti per altri settori (pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo)
I.1	Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi in ambito sanitario e assistenziale	MUR	500,00	Nessun adempimento		II/2022 Pubblicazione da parte del MUR del primo bando (in due finestre) per il finanziamento di progetti di ricerca; Apertura della prima finestra del primo bando

